

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 14/04/2020	Inspecteur: David Waterschoot	Mentor:	Installateur: Meersschout Mario bvba
ID-label: Dahliastraat 126	B.T.W. nr.: BE 472 418 110	Klantreferentie:	IK. nr.:
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557	Serie Nr.: 19210802		
Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Dahliastraat	Naam	
Huisnummer	126	Straatnaam	
Busnummer		Huisnummer	
Postcode	9000	Busnummer	
Gemeente	Gent	Postcode	
Land	België	Gemeente	
		Land	
Naam contactpersoon		Installateur	
Telefoon	David Waterschoot	Naam	Meersschout Mario bvba
Gsm nr. (SMS)	32472897579	BTW nr.	BE 472 418 110
		Telefoonnummer	+32 475 32 10 43
		E-mail	electromario@telenet.be
Type : woning	EAN : 541448860019721648	Teller Nr.: : 1SAG1100085338	

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een PV installatie $\leq 10\text{kVA}$ volgens AREI artikels 270, 86 en synergrid C10/11.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
 Aantal borden: 1 Aantal kringen: 1 Isolatie: 4,85 M Ω
 Aardelektrode: Aardingslus RE: 7,2 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Zie schema	-	-	-	-	-
1	C	40		2	10
1	C	16		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw ☒	
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting				
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT		

GROENE METER

Phase	Serie Nr	Meterstand	CE markering	MID markering
-------	----------	------------	--------------	---------------

OMVORMER


Aantal	Pac max (W)	Iac (A)	Merk - Type	Serie Nr	Curve	IN (A)	UDC Max > UDC panelen/string	IDC Max > I str1 + I str2 + ...
1	5000	22.7	SOLAX X1-5.0-S-D(L)	XBE502F7089055	C	16	OK	OK

FOTOVOLTAISCHE ZONNEPANELEN

Aantal	Merk	Type	Piekvermogen per stuk (Wp)	Totaal Piekvermogen (Wp)
18	LONGI SALOR	MONO	305	5490

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Q2 Geen inbreuken vastgesteld.
 Q25 De panelen zijn niet/slecht zichtbaar & alsook niet bereikbaar.
 Q6 Deze controle omvat enkel de PV-installatie.



BESLUIT


- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 14/4/2045
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 5

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur David Waterschoot


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie. KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 14/4/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

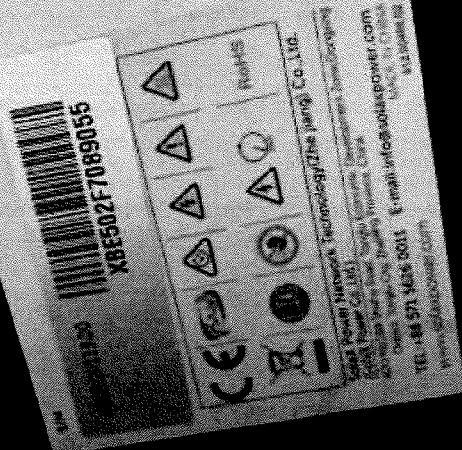




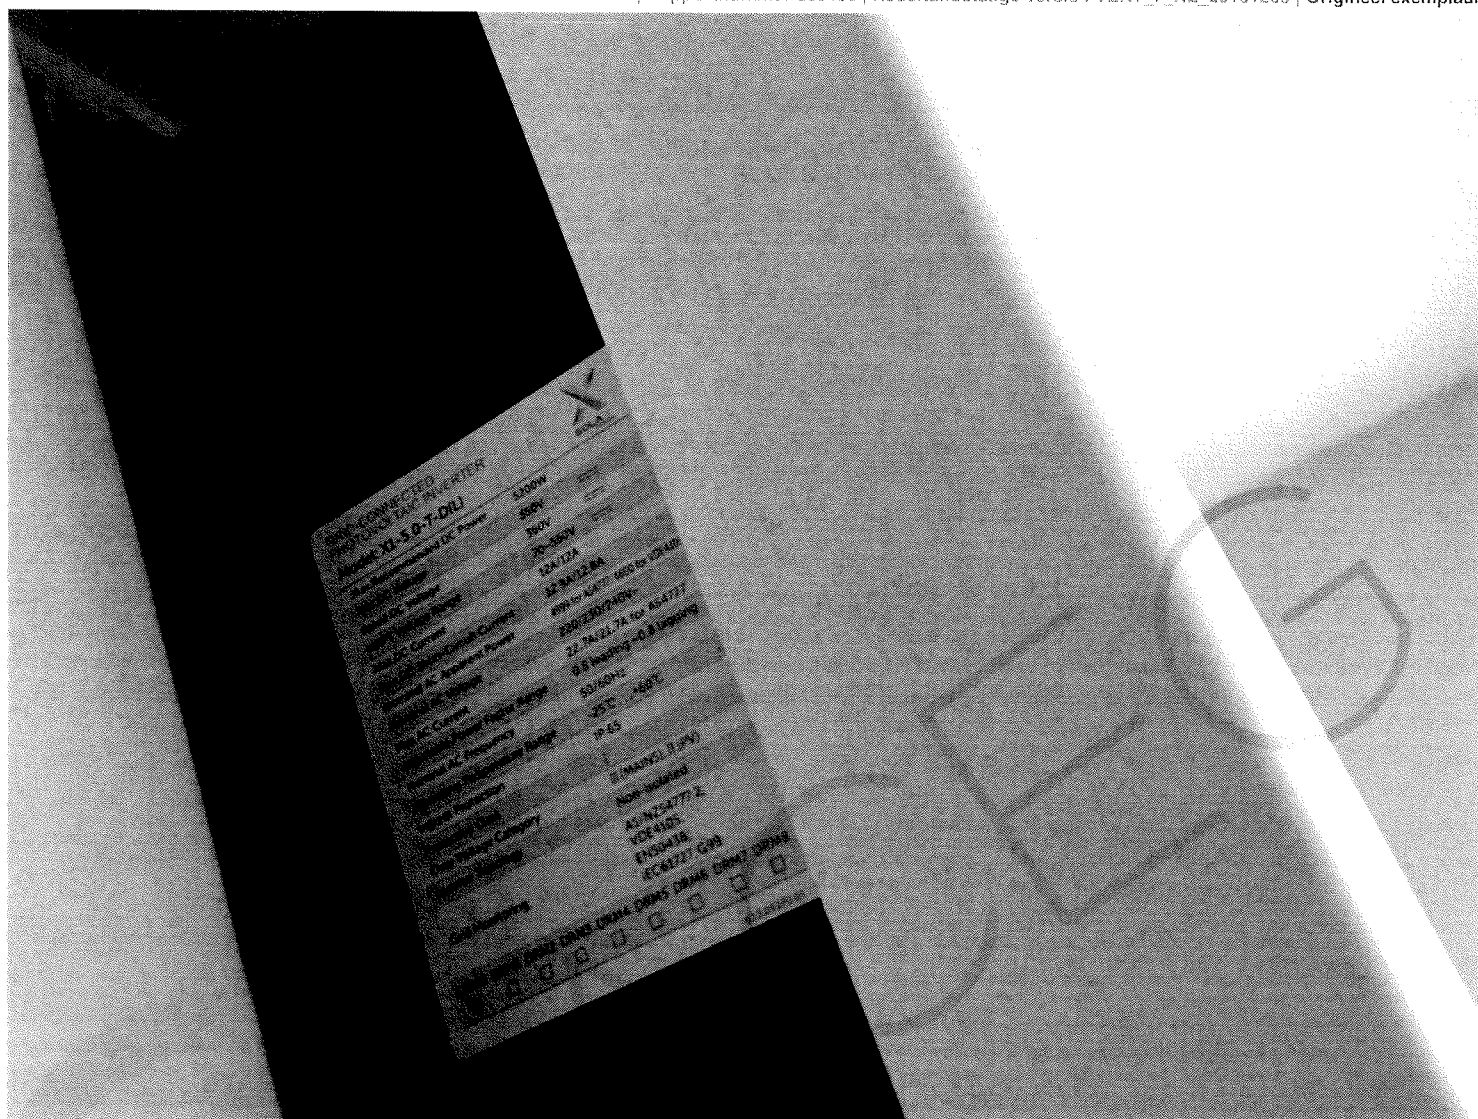

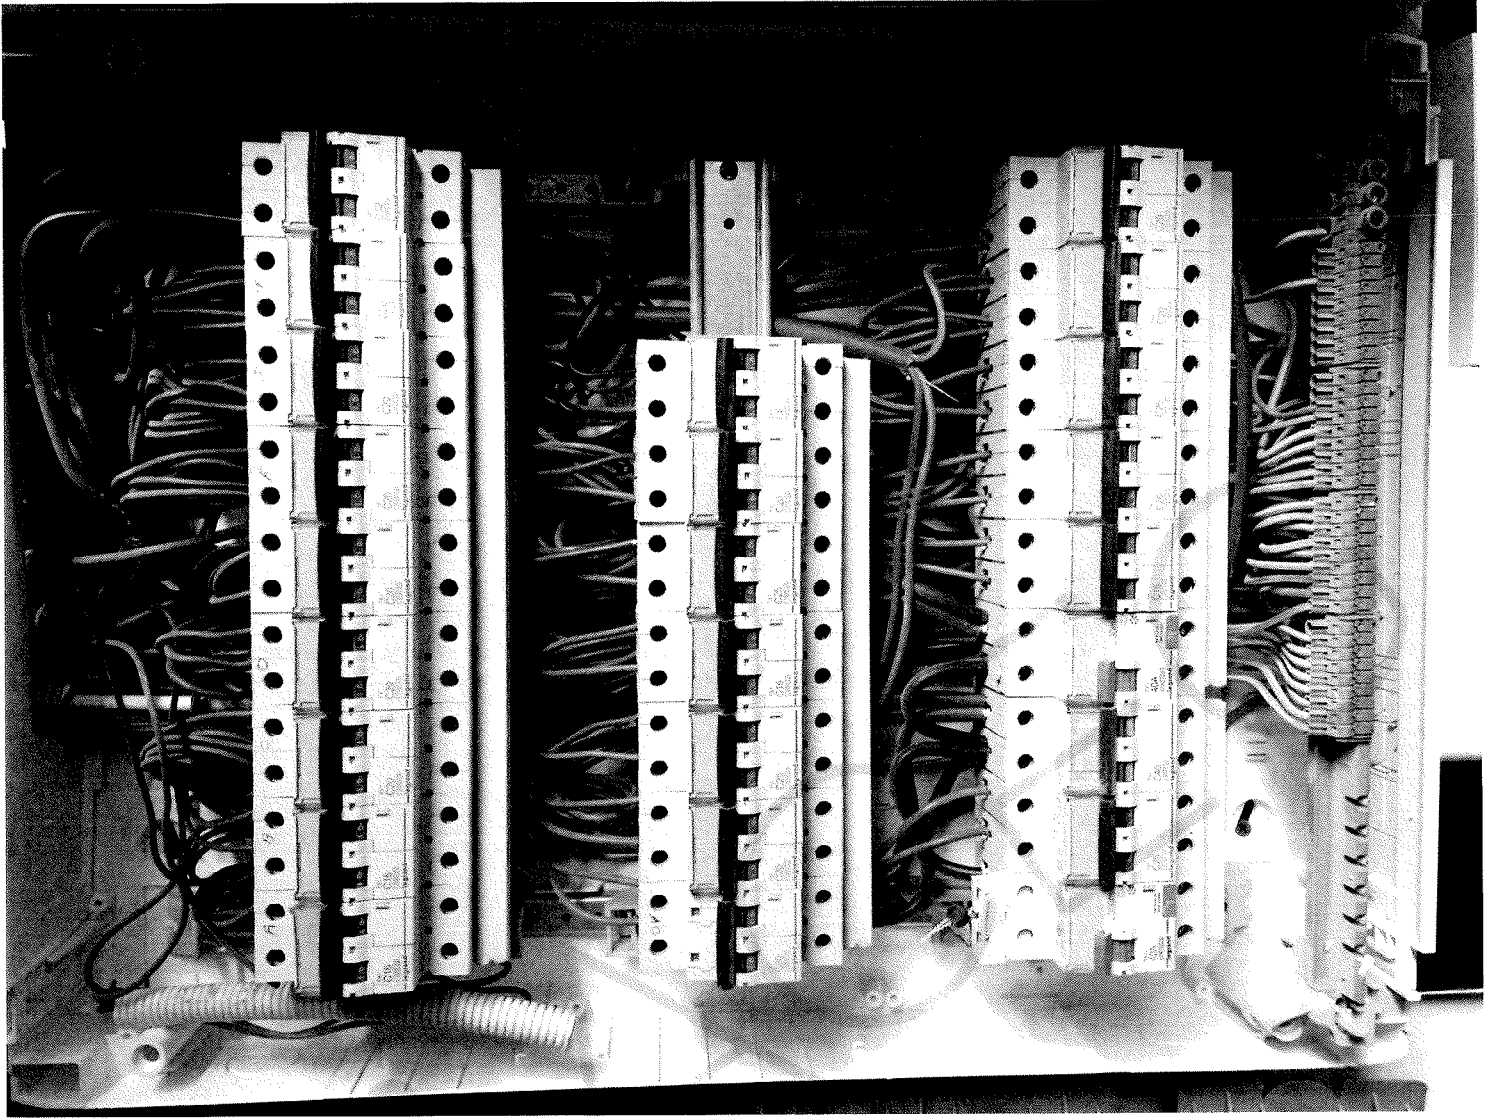



MARIO MEERSCHOUT
 AANNEEMER ELEKTRICITEITSWERKEN
 ELEKTRISCHE VERWARMING
 CENTRALE STOFZUIGING
 STEENTJESTRAAT 64 - 9270 LAARNE - TEL 09 368 22 52 GSM 0475 32 10 43
 BTW BE 472 418 110 - HR 40.787 - REG. 062.600



Plaats installatie:

Biba Lape Projectgroep
 Dallenstraat 126
 9200 Gort-Wandelgem

Installateur:

Electric Mario
 Steentjestraat 64
 9270 Laarne

DAEG
 David Waeleghem
 14/01/20
