

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Brussel / Bruxelles, Humaniteitslaan 233 bus 4, 1620 DROGENBOS
T: 02 230 81 82, E: btv.brussel@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0303-180717-03

Datum van het onderzoek : 17/07/18

Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:


ADRES INSTALLATIE : RAYMAEKERS
SPORTLAAN 20
1700 DILBEEK

EIGENAAR : RAYMAEKERS
Adres : SPORTLAAN 20
1700 DILBEEK

OPDRACHTGEVER : VAN DE STEEN DANNY
Adres : KATTENSTRAAT 73
1700 DILBEEK

INSTALLATEUR : VAN DE STEEN DANNY
Adres : KATTENSTRAAT 73
1700 DILBEEK

Visualisatie van de installatie

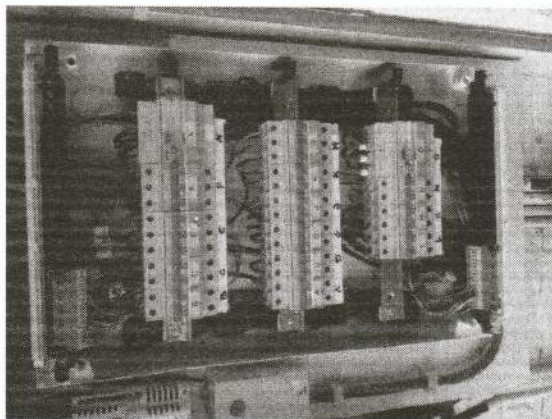

BTW of IK :

EAN :

Teller nr.

3597742

Index :

002068,0

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie : Verkoop wooneenheid /
Begin werken fundering : Voor 01/10/81
Aansluiting spanning : 3x230V
Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm²
Type van de aardelektrode : Pennen
Aantal borden : 4
Uitwendige invloedsfactoren :

Type der Lokalen : wooneenheid
Elektrische installatie : Voor & Na 01/10/81
AREI art. : 86
Bescherming van de aansluiting : max 40 A
Alg. schakelaar: type : 4p 40A/300mA
Aantal eindstroombanen : 17
Schema : TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 276bis,

VMA - 44

MA-LS-02/2015

Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: 20 Ohm RI tot 1 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

Geen

BESLUIT

De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/07/2043 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0303 HENRIK VAN DEN BOSCH

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3


Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 17/07/2043.

STAP 4

BTV Brussel / Bruxelles staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.


Name	Age	Gender	Occupation
John Doe	35	Male	Software Engineer
Jane Smith	28	Female	Marketing Manager
Mike Johnson	42	Male	Sales Representative
Emily White	31	Female	Product Designer
David Brown	38	Male	Operations Manager
Sarah Green	25	Female	Data Analyst
Chris Black	45	Male	Finance Analyst
Lisa Gray	33	Female	Human Resources

Kelder

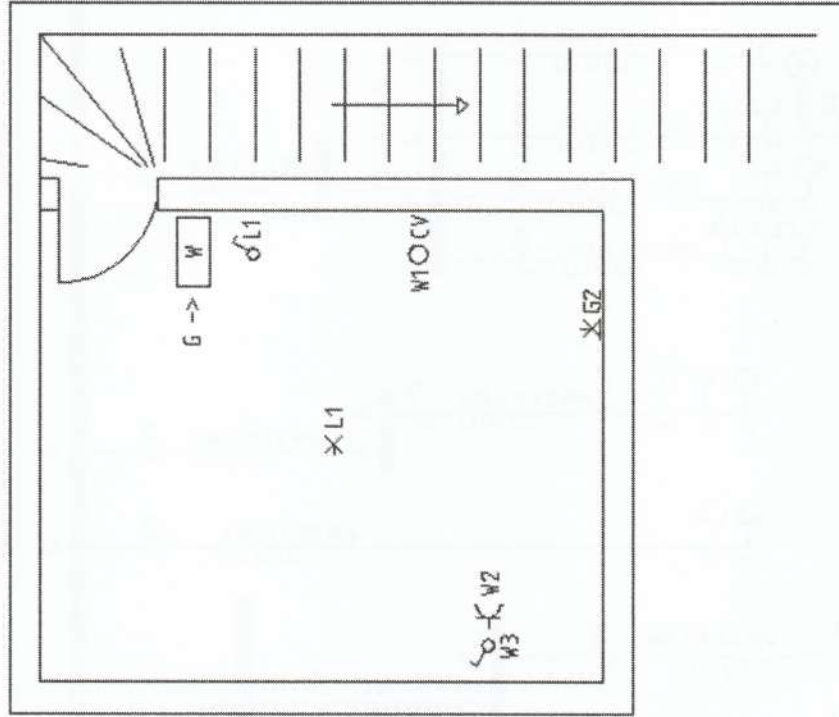

Installateur	Eigenaar	Inspecteur
Danny Van de Steen	Raeymaekers	B50303
SOLOMIE 0521.771.512	Sportlaan 20	<i>H. Van der Pijl</i>
0496 64 50 76	1700 Dilbeek	<i>W. H. H. H. H.</i>

Gelijkvloers

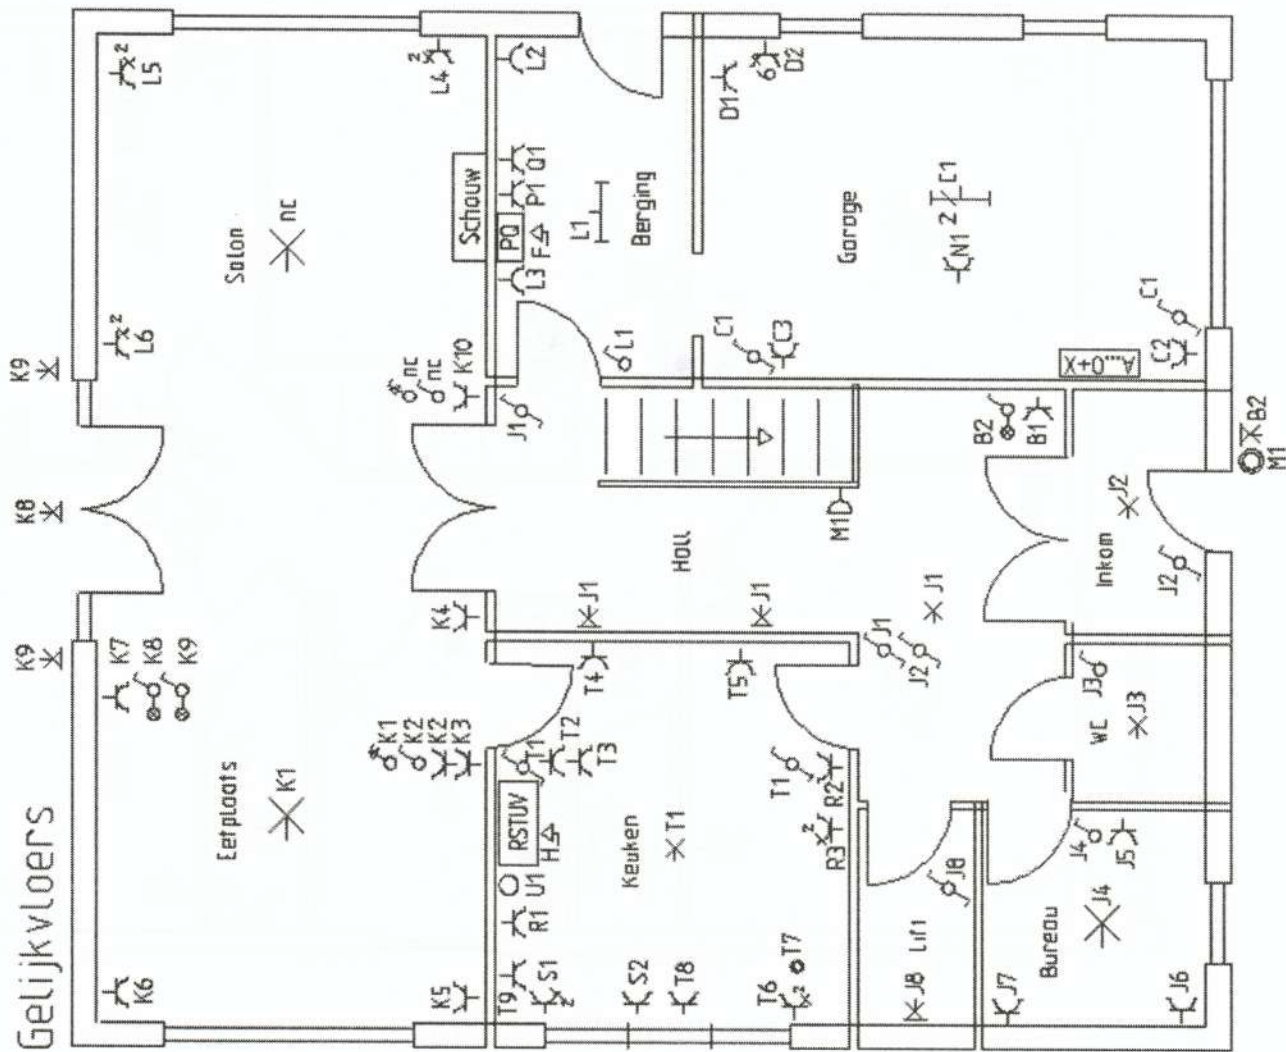

Installateur
Danny Van de Steen
SOLOMIE 0521.771.512
0496 64 50 76

Eigenaar
Raeymaekers
Sportlaan 20
1700 Dilbeek

Installateur
BTV 303
<i>W. Van den Bosch</i>
1407/20 18

Danny Van de Steen
SOLOMIE 0521.771.512
0496 64 50 76

Raeymaekers
Sportlaan 20
1700 Dilbeek

BTU 303
