

**DE INSTALLATIE IS CONFORM**

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN  
T: 03 216 28 90, E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)

Verslagnummer: 0169-171102-01 Datum van het onderzoek: 02/11/2017  
Extra controle datums

**ALGEMENE GEGEVENS:**

ADRES INSTALLATIE: /  
HALEWIJNLAAN 57/3L  
2050 ANTWERPEN


EIGENAAR: /  
Adres: HALEWIJNLAAN 57/3L  
2050 ANTWERPEN

OPDRACHTGEVER: ██████████  
Adres: ██████████  
██████████

INSTALLATEUR: BJL EDGARD  
Adres: AUGUST VERMEYLENLAAN 155  
2050 ANTWERPEN

BTW of IK: 0503681210

Visualisatie van de installatie



EAN: Teller nr. 41290850 Index: 89630,5

**ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:**

Aard installatie:	Nieuwe Installatie / Uitbreiding / Wijziging /	Type der Lokalen:	Appartement
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie:	Na 01/10/81
Aansluiting spanning:	3x400V + N	AREI art.:	86
Voedingskabel hoofdbord:	4 x 6 mm <sup>2</sup>	Bescherming van de aansluiting:	40 A
Type van de aardelektrode:	Baren	Alg. schakelaar: type:	4p 40A/300mA
Aantal borden:	2	Aantal eindstroombanen:	11
Uitwendige invloedsfactoren:		Schema:	TT

**ONDERZOEK:**

Controlebezoek volgens: AREI art. 270, AREI art. 276bis.  
Aard van het onderzoek: Controlebezoek

**METINGEN:**

RA: 6 Ohm RI tot 100 MOhm

**BESCHRIJVING:**

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

**VASTGESTELDE INBREUKEN**

Geen

**NOTA'S**

Geen

**Besluit** De installatie is conform.  
De ingangsklemmen van de algemene ADS worden verzegeld.  
De ééndraads- en situatieschema's worden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 02/11/2042 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,  
0169 JDRG COOLS

voor De Directeur,

**UITGEVOERDE CONTROLES**

- Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)
- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
  - de controle van de staat (vastbindingen, beschadiging, ...) van het vast gemonteerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelkasten, ...;
  - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreeks en onrechtstreeks aanraking;
  - de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
  - de controle van de foutstroom en de juiste aanstelling van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
  - de controle van de conformiteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I
  - de visuele controle van vast of vast opgesteld materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
  - de visuele controle van verplaatsbaar materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.  
Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstromen en de constructies van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS**


- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieschema's;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen aan rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Besluiten van de nota's betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

**WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS**





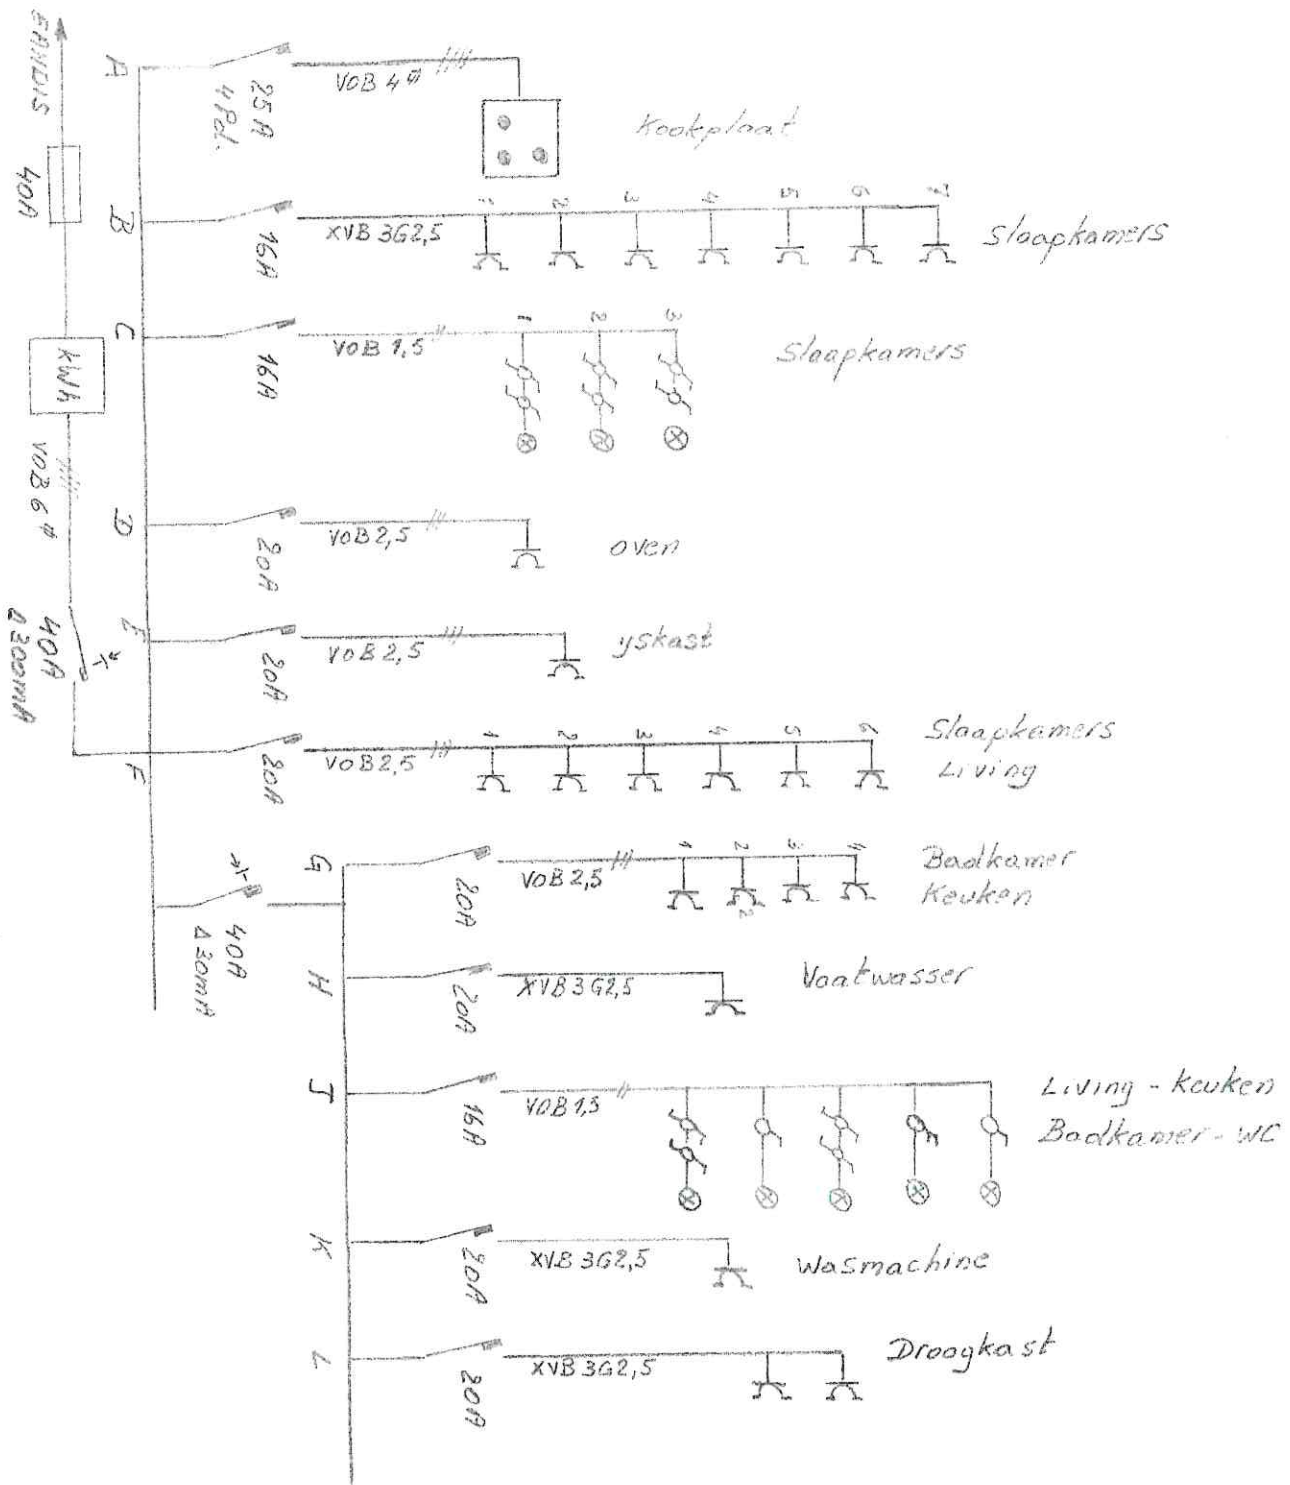

Eigenaar : [REDACTED]  
[REDACTED] (app. 32)  
[REDACTED]

Adres v. uitvoering : Idem

Verantwoordelijke v. uitvoering : Bijl Edgard  
 BTW : BE 0503 681 210

Het keuringsorganisme : BCU 169 Gal, F  
[Signature] 02/11/17
