



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gemboux@vincotte.be



N 214848

Resi code : 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : *J.J. De Pelsmacker* Naam, voornaam : *P.G.V. Coomtebeek*
 Adres : *Somsheghegaten, blok 2, o.s. 1/153, bus 1*
 Ident. Kaart nr. : Post nr. + Stad : *Turnhout*
 BTW nr.: BE *0407.133.548* Tel. : *1 1 1 1 1 1 1 1*

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheid
<input type="checkbox"/> Art 276 : verzwaren	<input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
				<input type="checkbox"/> Art ...	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler : EAN EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: meterstand dag : nacht : kWh excl. nacht meter :
 Bescherming aansluiting (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100 V nr.: meterstand :

Gegevens installatie : Ontworpen voor U_N : 230 V 3x230 V 3N400 V Type aardelektrode :
 Maximale nominale stroom (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord : X *10* mm² - Type : *XVB*

Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : *40* A / *300* mA Aantal borden : *1* Aantal eindstroombanen : *12*
 zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand : *10* Ω Algemeen isolatieniveau : *50* MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.
 Differentieelstroominrichting : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

- De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
- De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

14.5.2018
 door hetzelfde erkend organisme (*)


Agent bezoeker :

Naam : *Verwoel Dierck* Agent nr. : *9846* Datum : *14.5.2018*

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : Situatieschema('s) : *1* Eéndraadsschema('s) : *1*

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

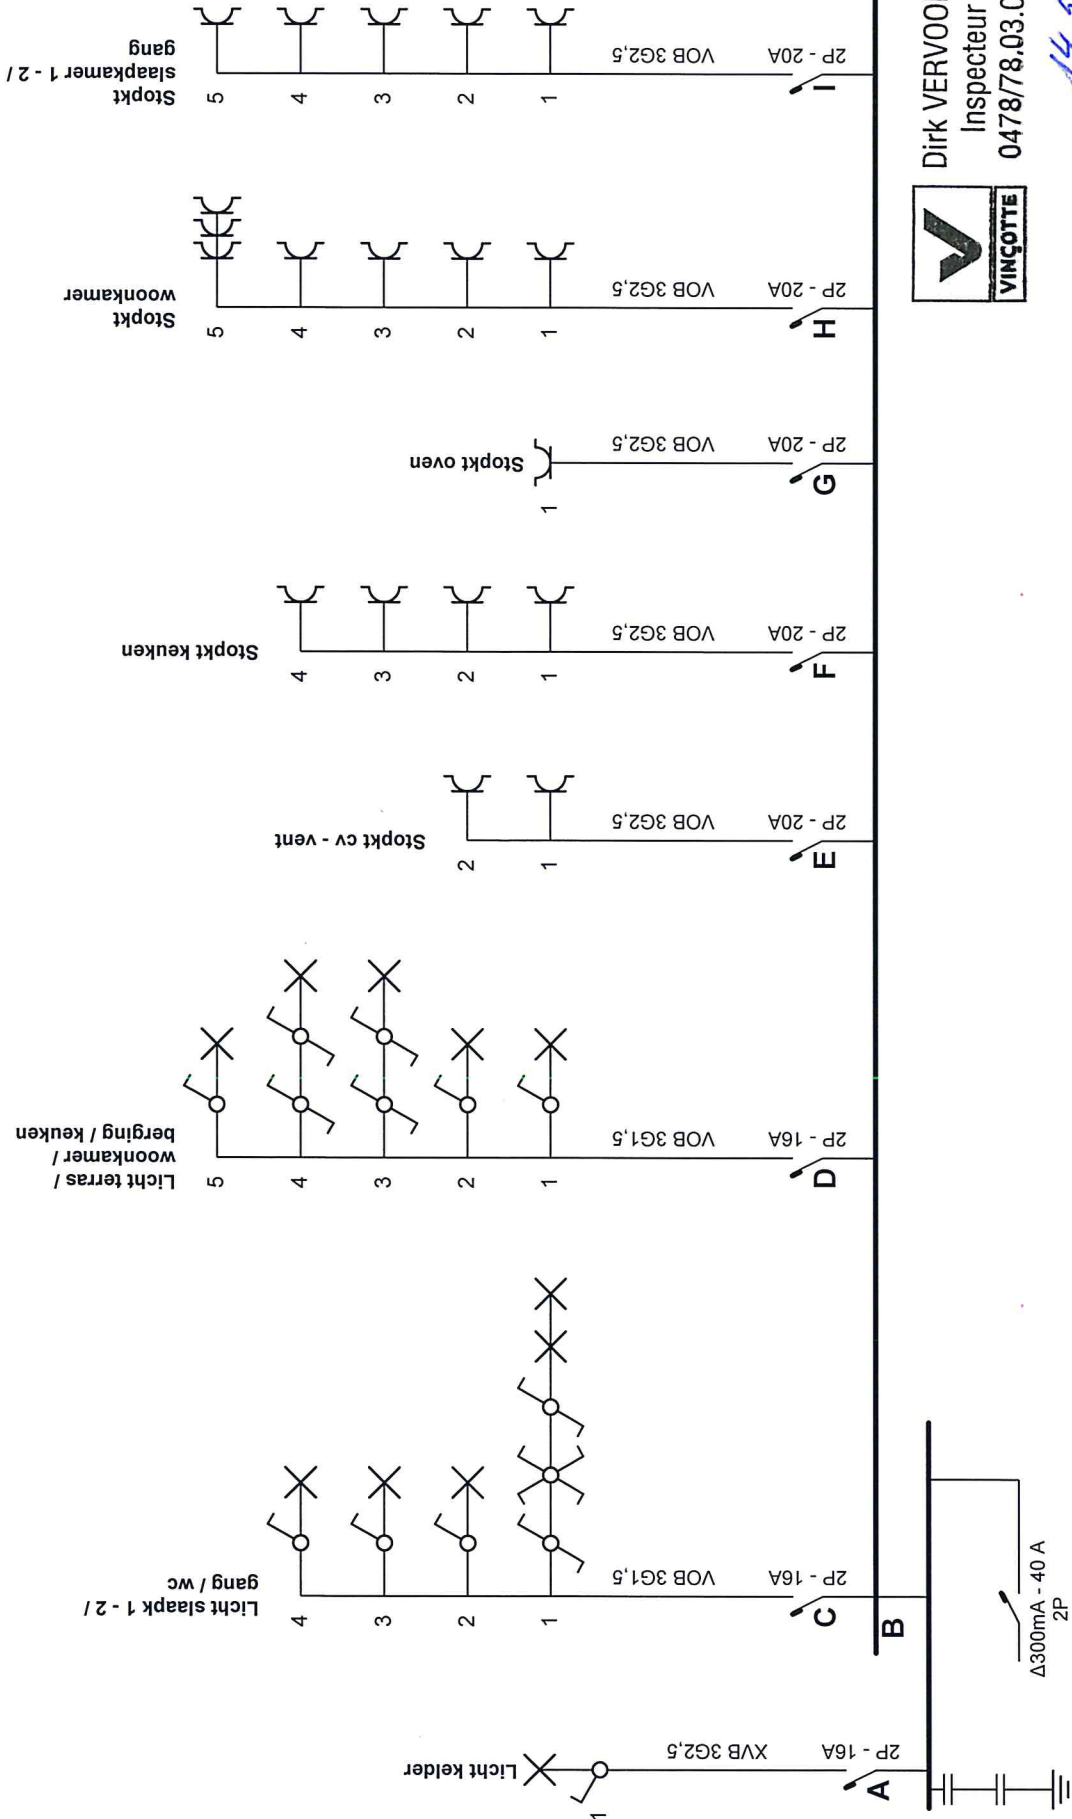

VINÇOTTE
 Dirk VERVOORT
 Inspecteur
 0478/78.03.02


14.5.2018

Plaats van de elektrische installatie
 DGV construct bvba - appartement II'0,1 (153 bus 1)
 Smiskestraat 101 - 147
 Turnhout

Installateur
 J.J. De Prins bvba
 Kapelstraat 41 - 43
 2540 Hove
 Tel.: 03 455 50 43 GSM: 0476 20 62 84
 Fax: 03 454 21 24
 e-mail: jjdeprinsbvba@skynet.be
 BTW BE 0407.133.546

p. 1/4
 Eendraadschema
 1 x 400V + N ~ 50Hz



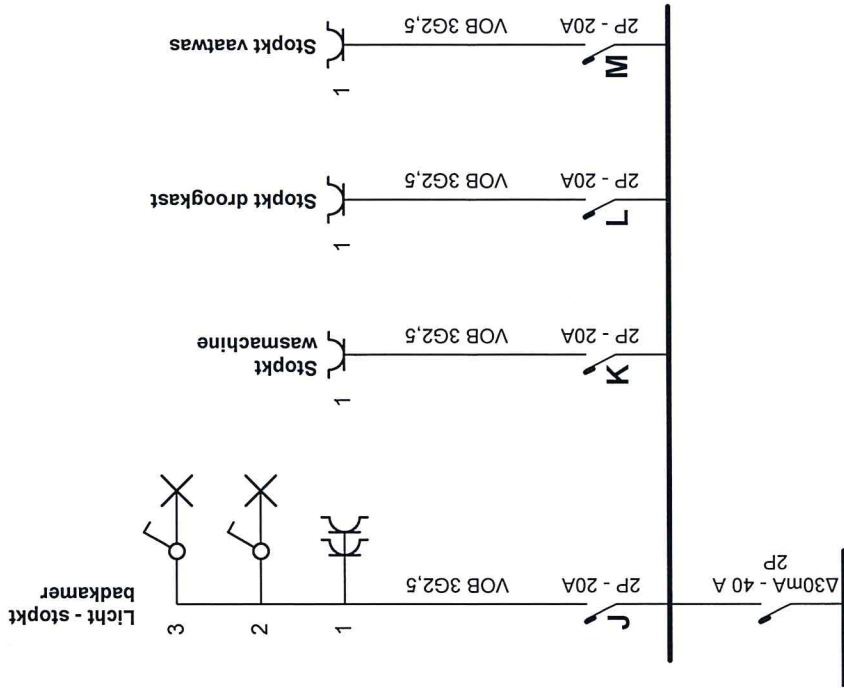

Dirk VERVOORT
Inspecteur
0478/78.03.02

14.5.2018


Plaats van de elektrische installatie
DGV construct bvba appartement l'0,1 (153 bus 1)
Smiskestraat 101 - 147
Turnhout

Installateur
J.J. De Prins bvba
Kapelstraat 41 - 43
2540 Hove
Tel.: 03 455 50 43 GSM: 0476 20 62 84
Fax: 03 454 21 24
e-mail: jjdeprinsbvba@skynet.be
BTW BE 0407.133.546



p. 2/4
Eendraadschema
1 x 400V + N ~ 50Hz

Gelijkvloers Appartement 153 bus 1

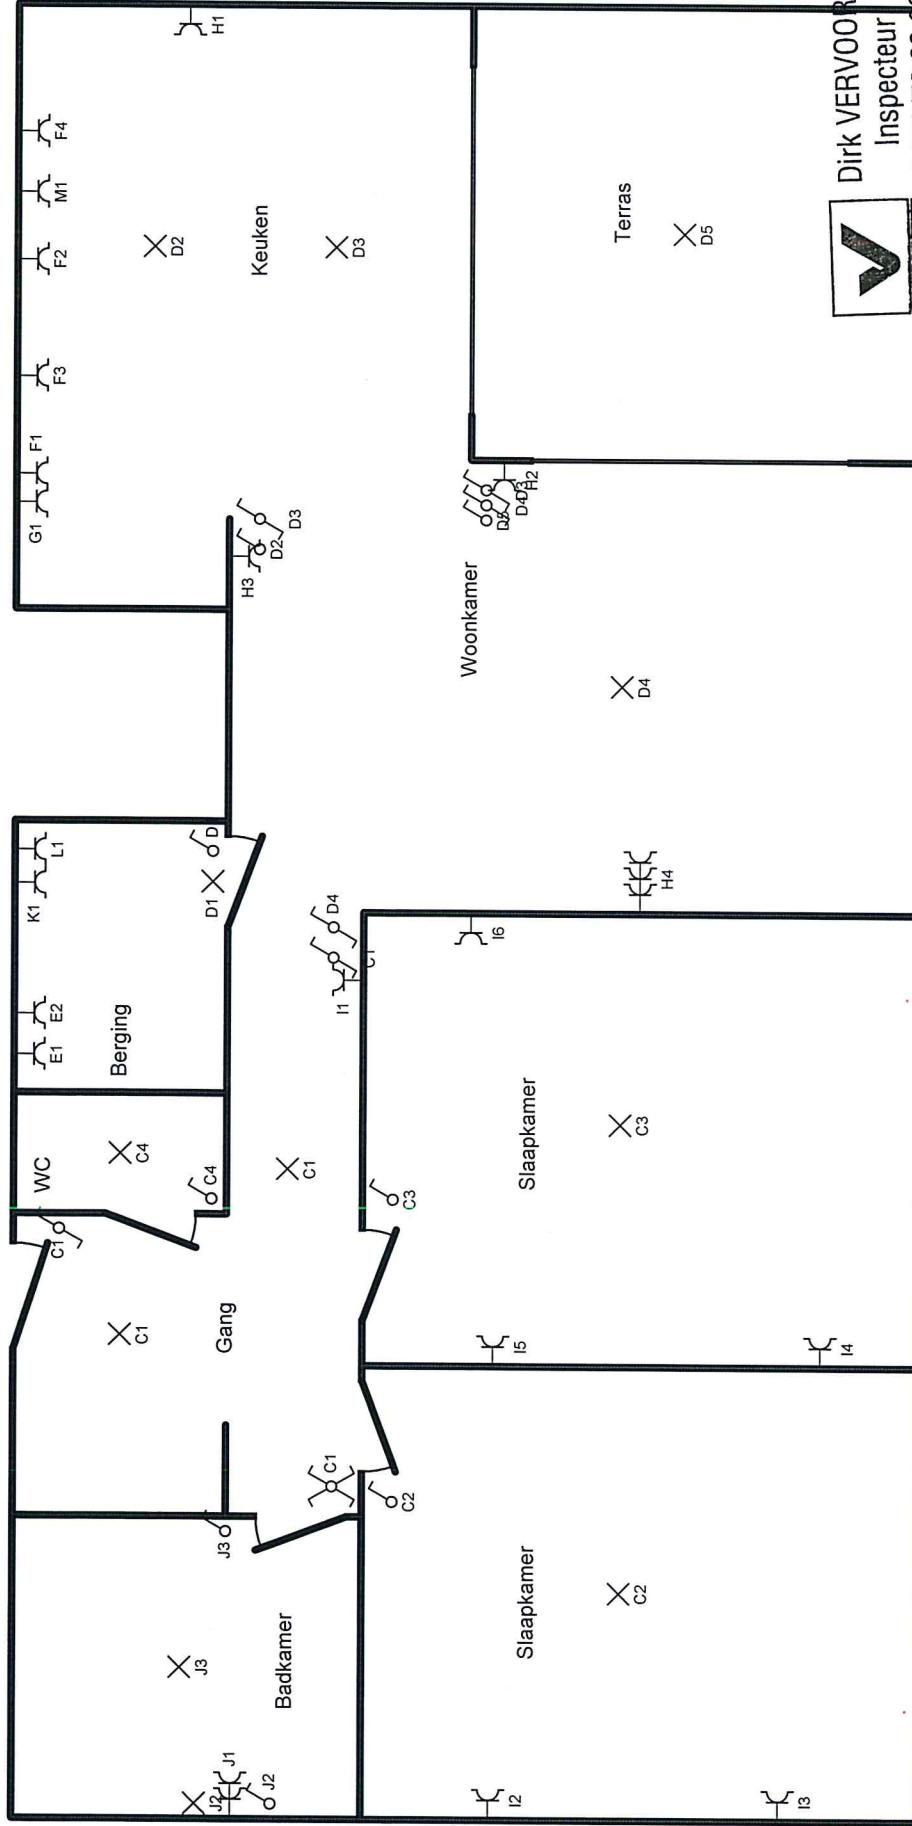



Dirk VERVOORT
 Inspecteur
 0478.78.03.02

14.5.2018

<p>p. 1/1 Situatieschema 1 x 400V + N ~ 50Hz</p>	<p>Installateur J.J. De Prins bvba Kapelstraat 41 - 43 2540 Hove Tel.: 03 455 50 43 GSM: 0476 20 62 84 Fax: 03 454 21 24 e-mail: jjdeprinsbvba@skynet.be BTW BE 0407.133.546</p>	<p>Plaats van de elektrische installatie DGV construct bvba appartement II'0,1 (153 bus 1) Smiskestraat 101 - 147 Turnhout</p>
---	--	--



- A Licht kelder
- B
- C Licht slaapk 1 - 2 / gang / wc
- D Licht terras / woonkamer / berging / keuken
- E Stopkt cv - vent
- F Stopkt keuken
- G Stopkt oven
- H Stopkt woonkamer
- I Stopkt slaapkamer 1 - 2 / gang
- J Licht - stopkt badkamer
- K Stopkt wasmachine
- L Stopkt droogkast
- M Stopkt vaatwas



Dirk VERVOORT
Inspecteur
0478/78.03.02

14.6.2018

<p>Plaats van de elektrische installatie DGV construct bvba - appartement II 0,1 (153 bus 1) Smiskestraat 101 - 147 Turnhout</p>	<p>Installateur J.J. De Prins bvba Kapelstraat 41 - 43 2540 Hove Tel: 03 455 50 43 GSM: 0476 20 62 84 Fax: 03 454 21 24 e-mail: jjdeprinsbvba@skynet.be BTW BE 0407.133.546</p>	<p>p. 4/4 Lijst Kringen 1 x 400V + N ~ 50Hz</p>
