

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 14/01/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 14/01/2021
Verslagnummer: 0261-210114-01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0261

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VERBEECK PATRICK
 Adres: LAARHOFSTRAAT 127, 2627 SCHELLE
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: VME
 Adres: SINT-JANSTRAAT 2-8, 2140 BORGERHOUT
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend
 Adres:
 BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: VME
 Adres: SINT-JANSTRAAT 2-8, 2140 BORGERHOUT
 EAN- code:
 Nummer teller: 41292189
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek volgens bijlage III.2-1 van boek III van de codex over het welzijn op het werk
 Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.




Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 6 mm²
 Type aardelektrode: Aardingsbaren
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 20A
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 5 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie één draadsschema's en situatieplannen
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
 beschermde stroombanen: Zie schema's

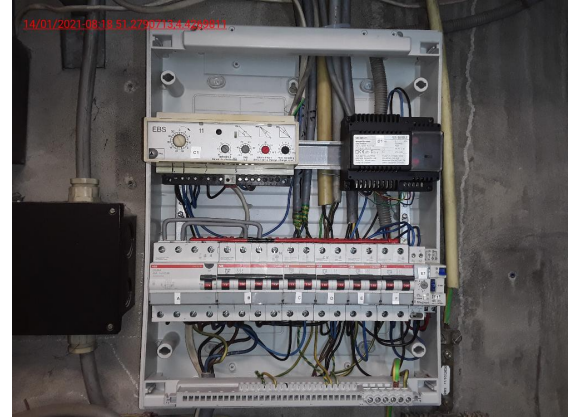

Document met uitwendige invloeden: zie schema
 Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
 Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
 Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.
 Andere gegevens: geen

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 28 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 100 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 14/01/2026





Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):

Willeen Peeters

