

Keuringsverslag van een fotovoltaïsche laagspanningsinstallatie ≤ 10KVA

Datum: 18/06/2013

Inspecteur: Yves Pelgrims

Installateur: Defiaat

EAN :-

B.T.W nr.: -

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam **Blandenstraat**
Huisnummer **170**
Postcode **3053**
Gemeente **Haasrode**

Eigenaar:

Naam
Straatnaam **Blandenstraat**
Huisnummer **170**
Postcode **3053**
Gemeente **Haasrode**

WETGEVING AREI art 86 andere art 270 art 271 Synergrid C10 / C11

HOOFDMETER Serie Nr: 54449697 Meterstand dag: 120132,4 Meterstand nacht: 69684,6

ANDERE METER NVT Meterstand: enkel nacht andere:

GROENE METER

Serie Nr:

Meterstand

Europese markering tot 30/10/2016

CE- en metrologische markering vanaf 01/01/2012

Phase II III IV

7033474

432,7

aanwezig afwezig

aanwezig afwezig

Phase II III IV

aanwezig afwezig

aanwezig afwezig

Phase II III IV

aanwezig afwezig

aanwezig afwezig

AARDLEKBEVEILIGING

In

Icc

I_Δ

Beveiligde kringen

Type

Differentiële schakelaar

40 A

3 kA

300 mA

Alle

A AC

A

kA

mA

A AC

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN

Aantal

Piekvermogen per stuk

Totaal Piekvermogen

30

245 Wp

7350 Wp

OMVORMER(S)

Aantal(s)

Pac max (W)

Iac (A)

Merk - Type

Serie Nr:

Beveiliging In + type

1

7000

11,5

SE 7 K

7E1001C8 57

C 20A 4p

METINGEN

Re = 5,4 Ω

Rifotovolt = 500 MΩ

Ri algemeen = 0,7 MΩ

OK NOK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

GEEN OPMERKINGEN

CONCLUSIE


- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor: **18/06/2038**
- aantal bijlage(n) bij dit verslag: **1**
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 1

VOOR DE INSPECTEUR

Yves Pelgrims


VOOR DE DIRECTEUR

Carlos Lopez


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overleden van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.
- De inspecteur heeft de toelating dit verslag te ondertekenen in afwezigheid van de directeur.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

30 x 245 Wp pony

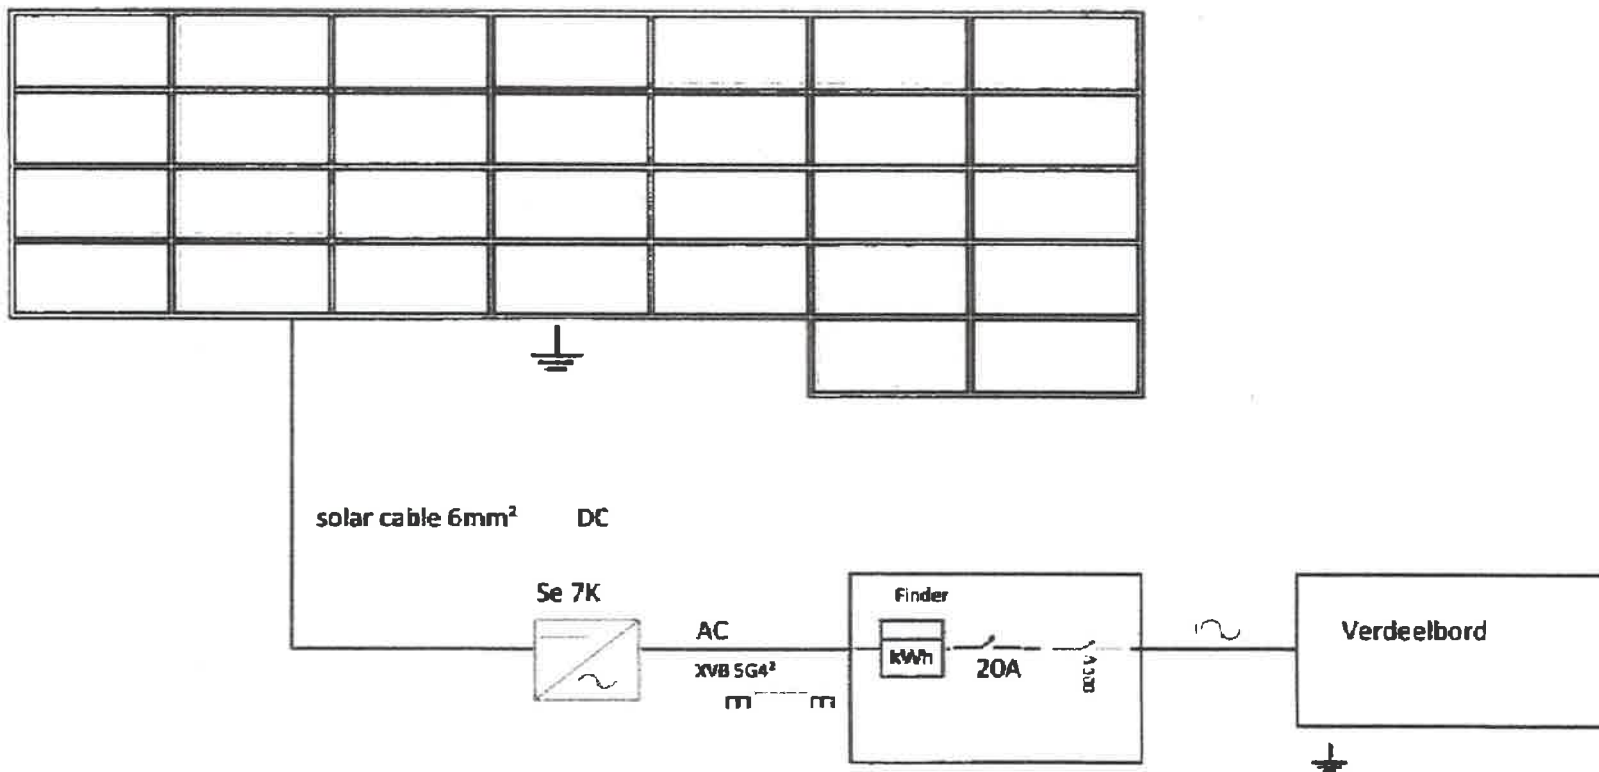

Serienummer SolarEdge 7k : SN : SJ4812-07E1001C8-57

Teller Finder : 7E3684000010 - 7033474



Defisat Solar			
De Vunt 4		0	
B-3220	Holsbeek	B-3035	Haasrode
