

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	ET 177/2016/5/25/7	Datum van bezoek: Date de visite:	25/05/2016
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	INTER-VILVOORDSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING Parkstraat 115 - 1800 VILVOORDE BTW BE 0400.676.613		IK: CI:
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Infrax	Nr teller: N° compteur:	11204069
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	De Saedeleerstraat (Valerius) 18 - 1800 VILVOORDE		
Eigenaar: Propriétaire:	INTERVILVOORDE De Saedeleerstraat (Valerius) 18 - 1800 VILVOORDE		
Installateur:	BESTAANDE INSTALLATIE	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS2A/HUIS1 (Periodieke controle van een huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271	Net:
Onderzoek / Contrôle: Woning/Maison			
Spanning / Tension: 2x230V	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 2 x 4 mm ² VOB		Max. beveiliging / Protection max.: 40A
Aardelektrode / Electrode de terre: Pen/Piquets	5,44 Ohm	Isolatie / Isolément: 2,68 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 5	
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	ALGEMEEN
40A	30mA	A/s	ALGEMEEN
TestΔIn		1.ΔIn	
OK		OK	
AREI/RGIE		271 - 278	
271 - 278			
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général: OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct: OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect: OK	Aansluitingen: Raccordements: OK
Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle: OK			

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

ET 177/2016/5/25/7

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via [website](http://www.electro-test.be) / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. / Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

Het één draadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. / Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.S.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 25/05/2041


Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l'inspecteur:
VISUM (Datum / Date):




HACOUR Koen

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

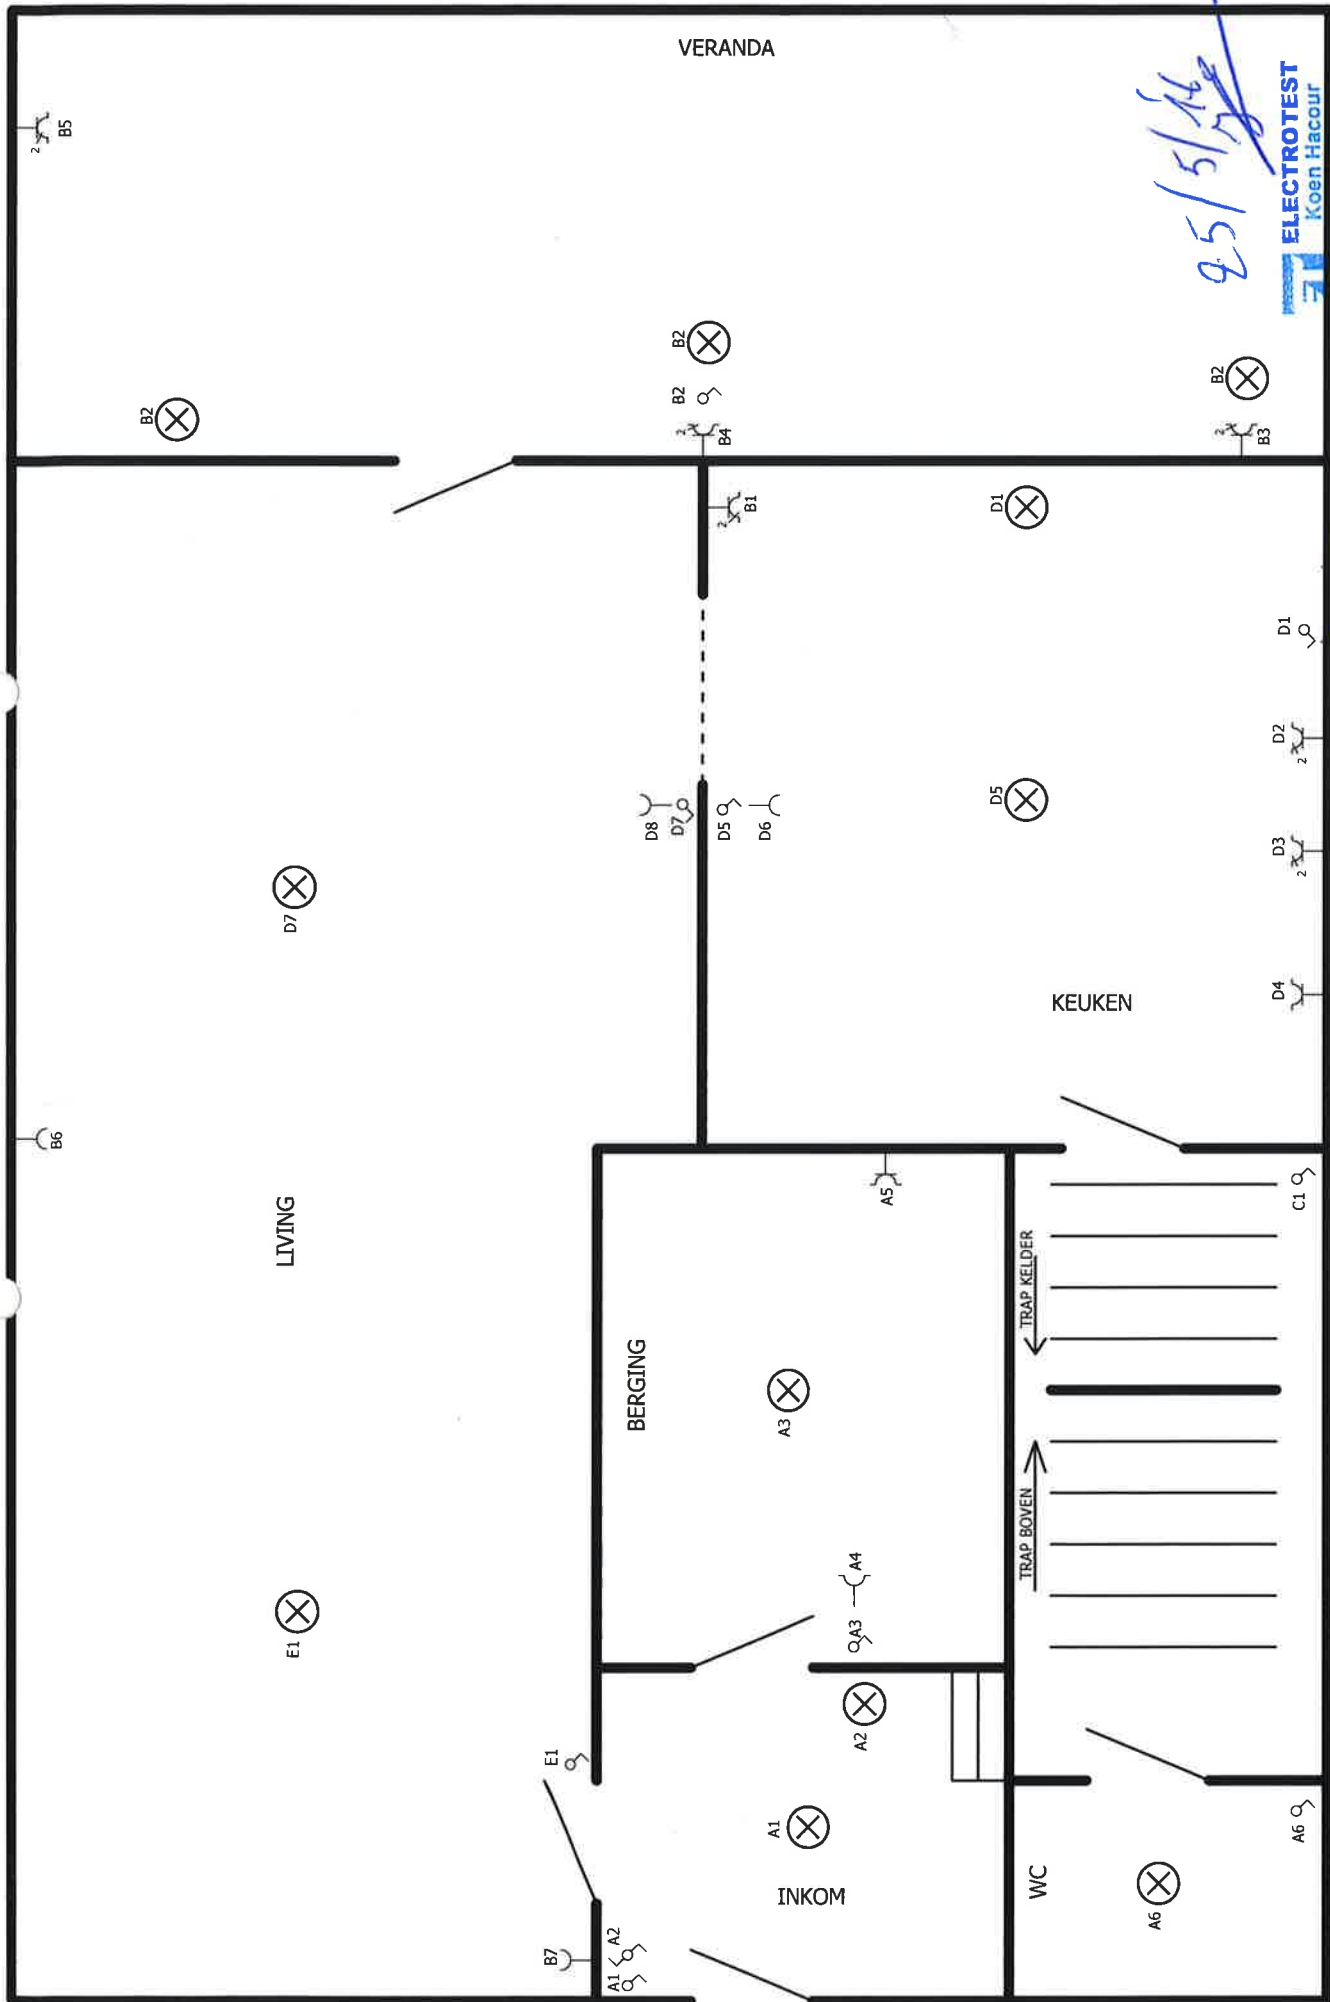

Verdeelbord Intervilvoorde + Valerius De Saedeleerstraat 18	12P214	Gelijktvoers Per 12/01/2016 van Peeters d'Arco 16 B-1220 Willebroek pds@panelsandinstallations.be http://www.ph-biba.be	Revisie datum by yve FB
--	---------------	---	---------------------------------------

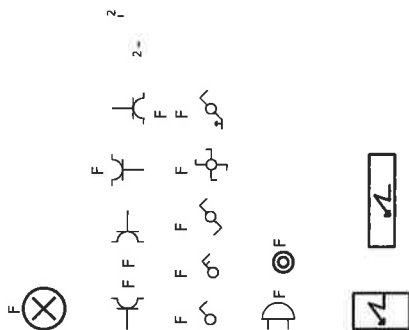

95/5/16

ELECTROTESA
Koen Hacour

inspecteur
koen.hacour@electro-test.be
Gsm 0475 75 10 55

Verdeelbord Intervilvoorde
+Valerius De Saedeleerstraat 18

12P214

Verdieping 1


info@participatiedinstituten.nl
<http://www.pi-bvba.be>

<http://www.pi-bvb.it>

device datum

how to

11

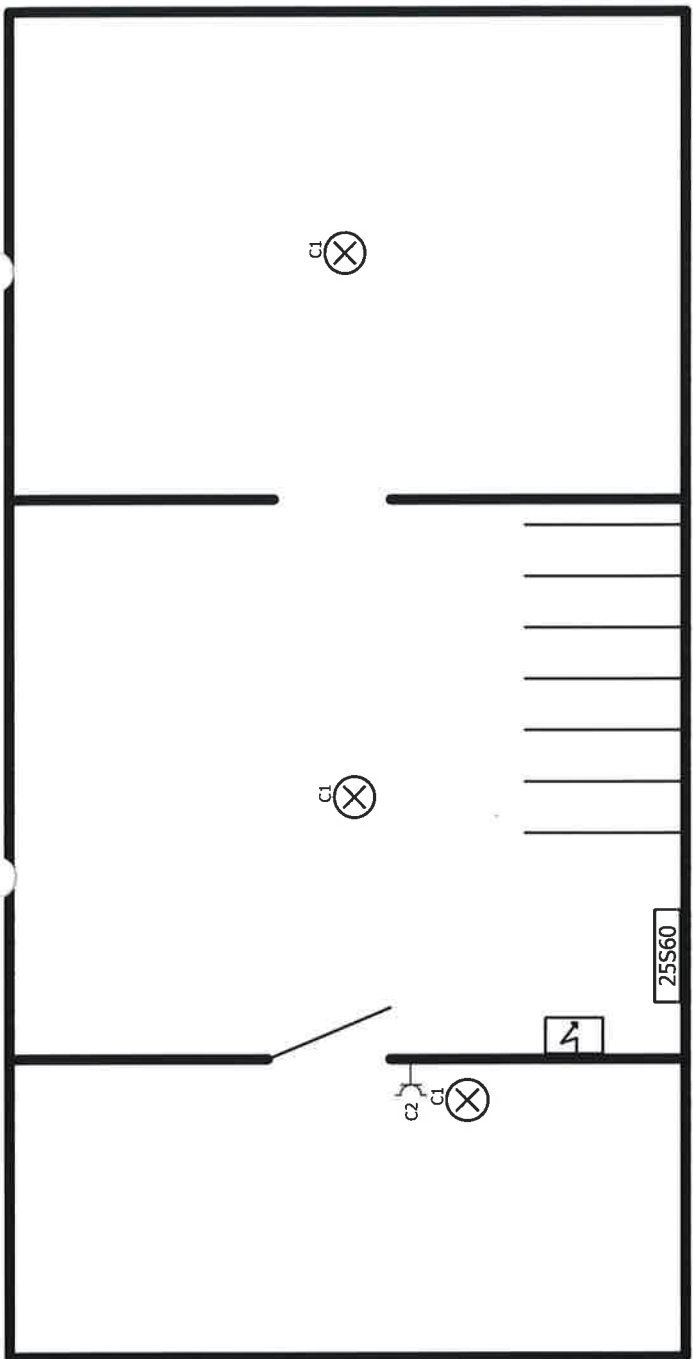

25/5/16

ELECTROTEST

Koen Hacour

Inspecteur

koen.hacour@electro-test.be

Gsm 0475 75 10 55

[Handwritten signature]

Verdeelbord Intervilvoorde +Valerius De Saedeleerstraat 18	12P214	Kelder	Revisie	datum	by jve	FS



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen zvv

☐ BTV Antwerpen	Tel 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☒ BTV West-Vlaanderen	Tel 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

Datum van onderzoek: 25/05/2016

DNB:

U. ref.: O. ref.: Verslagnr.: 2431460525105
VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS ☐ Indienstelling periodiek

Plaats van onderzoek: Vleermuis De Saedeleerskwaat 18
 1800 Vleermuis

EIGENAAR: Janssens Vleermuis

Adres: Odeon

OPDRACHTGEVER: Nedexco

Adres: Kruisweg 3 3680 Meerbeke

INSTALLATEUR: Belskand

Adres:

BTW nr.: 0887.730.538

Aanwezige personen: Nedexco

Gebruiker van de installatie:

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN: gasmeter: Klasse: G4 Nr.: 13049453 FLO6 Index [m³]: 443816786

Installatie: MOP [mbar]: 20 ☐ nieuw ☒ bestaande ☐ uitbreiding ☐ gedeelte van een installatie ☐ zie schema in bijlage

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...): W Ø 28 ± 1mm Fe 1" ± 1mm W Ø 15 ± 7mm

W Ø 22 ±

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, ...): Kookplaat Electrolux. Geen hanplaat leesaan
 Gasmeter in Riving 12, 8 Kw B1; Buren opbouw 23 Kw B11 B3 in bedkama.

2. ONDERZOEK: Volgens de actuele staat van de onderzochte aardgas binneninstallatie (gedeelten) en voor zover het visueel onderzoek mogelijk is:

☐ 2.1. Gelijkvormigheidsonderzoek volgens werkinstructie: 10Id013A, ☐ 10Id013B,

En aan de norm(en) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002 die van toepassing zijn op de onderzochte installatie (gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, ventilatie, afvoer, ...), volgens punt 2.2.

☒ 2.2. De proeven volgens werkinstructie: 10Id012, ☐ 10Id012B.

Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare delen tijdens het afzepen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange periode. Deze periode: is de tijd nodig voor het afzepen, en is in functie van de omvang van de installatie en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie. De proeven:

- ☐ Niet destructieve controle: zie bijlage. (*)
- ☐ Mechanische weerstandsproef/sterkteproef: zonder de elementen die niet kunnen weerstaan aan de proefdrukken. Meetinstrument: manometer.
- Proeffluidum: ☐ lucht, ☐ inert gas, ☐ water, Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]:
- ☒ Dichtheidsproef:
- Meetinstrument: ☐ manometer, ☒ gasmeter klasse ≤ G6.
- Proeffluidum: ☐ lucht, ☐ inert gas, ☒ aardgas. Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: / ☐ MOP.

3. VASTSTELLINGEN EN/OF NOTA'S: Verkantingen: De dichtheidsproef heeft voldoende geslonken

Anders: Geen

4. BESLUIT:

- ☒ A. Uit het onderzoek volgens het punt 2.1, blijkt dat de onderzochte installatie conform is.
- ☐ B. Uit het onderzoek volgens het punt 2.1, blijkt dat de onderzochte installatie niet conform is.
- ☒ C. Het onderzoek volgens punt 2.2., heeft voldoende geslonken.
- ☐ D. Het onderzoek volgens punt 2.2., heeft geen voldoende geslonken.

5. MEDEDELINGEN EN Plichten: zie verso

6. BIJLAGEN: ☐ BTV verslag nrs. ☐ Uitbesteding (*) ☐ Installatieschema ☐ Bewijs CE-markering, EG-verklaring van de leidingen DN > 25 mm op M.D.B., M.D.C. (richtlijn drukapparatuur 97/23/EG)

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

voor de directeur,

Ondertekend voor gelezen en geïnformeerd,
(naam, handtekening)



* V E R S L A G - R A P P O R T *



115-INSP

5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN

- De installaties waarvan het onderzoek geen voldoening heeft geschonken of die in strijd zijn met de normen of regelgeving mogen niet in dienst zijn. De distributienetbeheerder en alle belanghebbende (eigenaars, huurders, gebruikers, ...) dienen steeds onmiddellijk te worden geïnformeerd door de opdrachtgever of andere geïnformeerde personen. Indien ze in dienst blijven, moeten de werken, nodig om de overtredingen die opgemerkt werden te verhelpen, zonder vertraging uitgevoerd worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
 - De geldende gebruiks-, onderhouds-, lokale- en veiligheidsvoorschriften zijn te respecteren. Dit onderzoek betreft niet de procedures, noch de goede werking van de toestellen of accessoires, noch het onderhoud. Er zijn, buiten dit rapport, meer documenten nodig, o.a. getuigschrift van de installateur volgens art. 48 K.B. 28.6.1971.
 - De installatie moet gecontroleerd worden na wijziging of uitbreiding, voor de indienststelling.
 - In geval van gasreuk, alarmeer uw DNB:
Eandis 0800 65 065, Infrac 0800 60 888, Sibelga 0800 19 400, ORES 0800 87 087, RESA 04 362 98 38.
 - Def. : MOP: maximale bedrijfsdruk, maximum operating pressure of PMS(A). DNB: distributienetbeheerder.
 - Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
 - Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
 - Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door: (naam van de onderaannemer) (facultatief).
-
- Enkel de tekst na de aangekruiste vakjes "☐" zijn van toepassing in dit verslag.

