

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 21/04/2026

Inspecteur: Jarne Lattré

Mentor:

Installateur: Vansieleghe Leendert

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0788 907 334

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481245

Datum verslag: 21/04/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Jan Breydellaan
Huisnummer 32
Busnummer 3
Postcode 8200
Gemeente Sint-Andries
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Vansieleghe Leendert
BE 0788 907 334
+32 495 39 77 52
elektriciteitleendert@gmail.com

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54



Teller Nr. : 84885716-98

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 13,6 MΩ

OK

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal kringen: 8

RE: 13,27 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie eendraadschema	-	-	-	-	-

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

N32 Volgende gedeelte van de installatie werden gekeurd volgens Boek 1 Afdeling 6.5. en 8.2.2.:

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 21/4/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 13:24 tot 14:00

De inspecteur Jarne Lattré



Jarne Lattré
ACEG VZW - #416


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 21/4/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

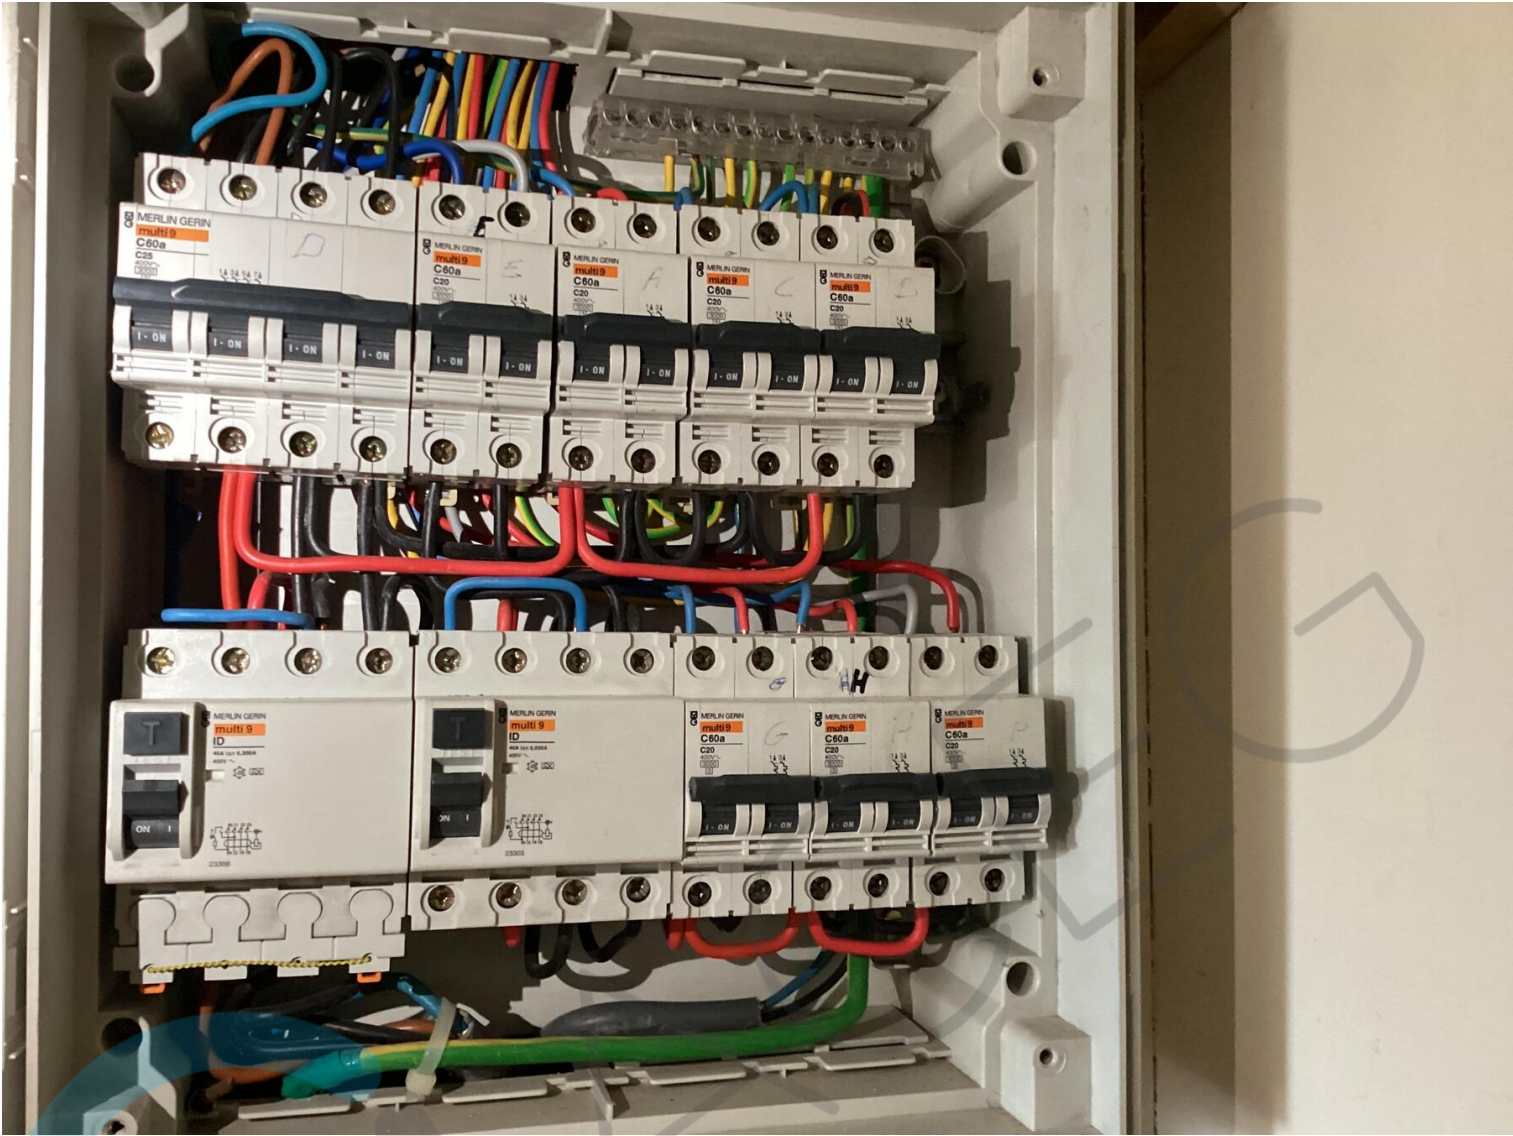

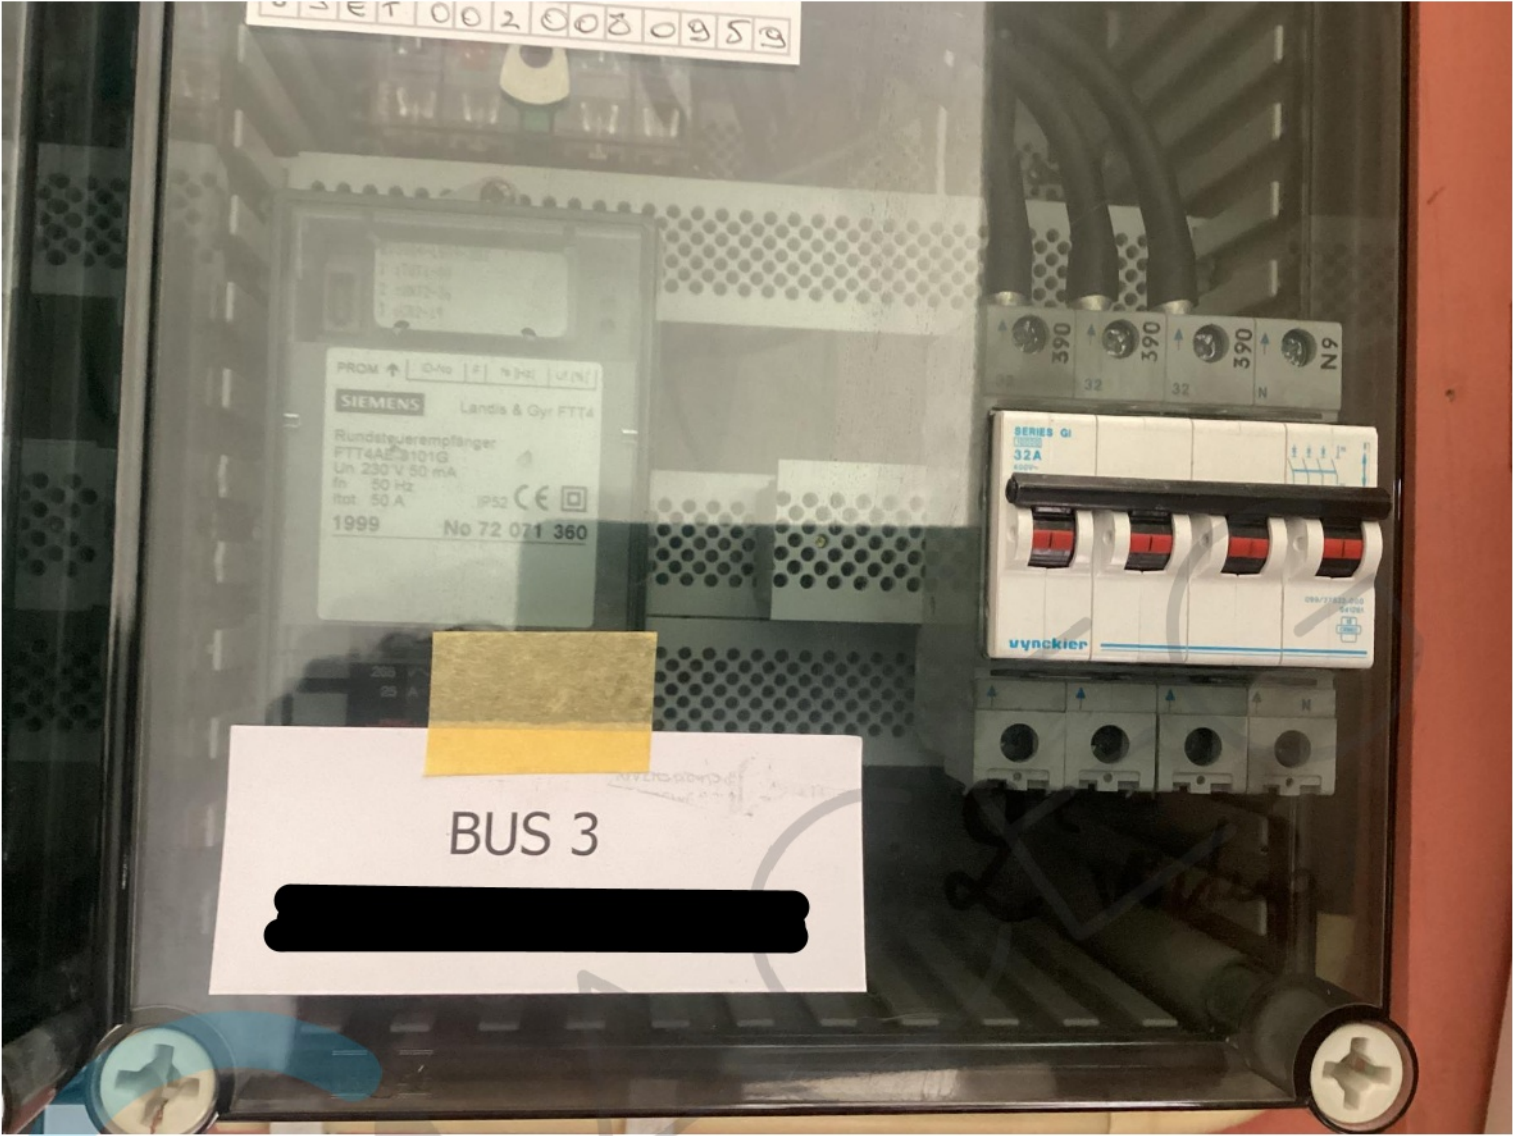


BUS 3

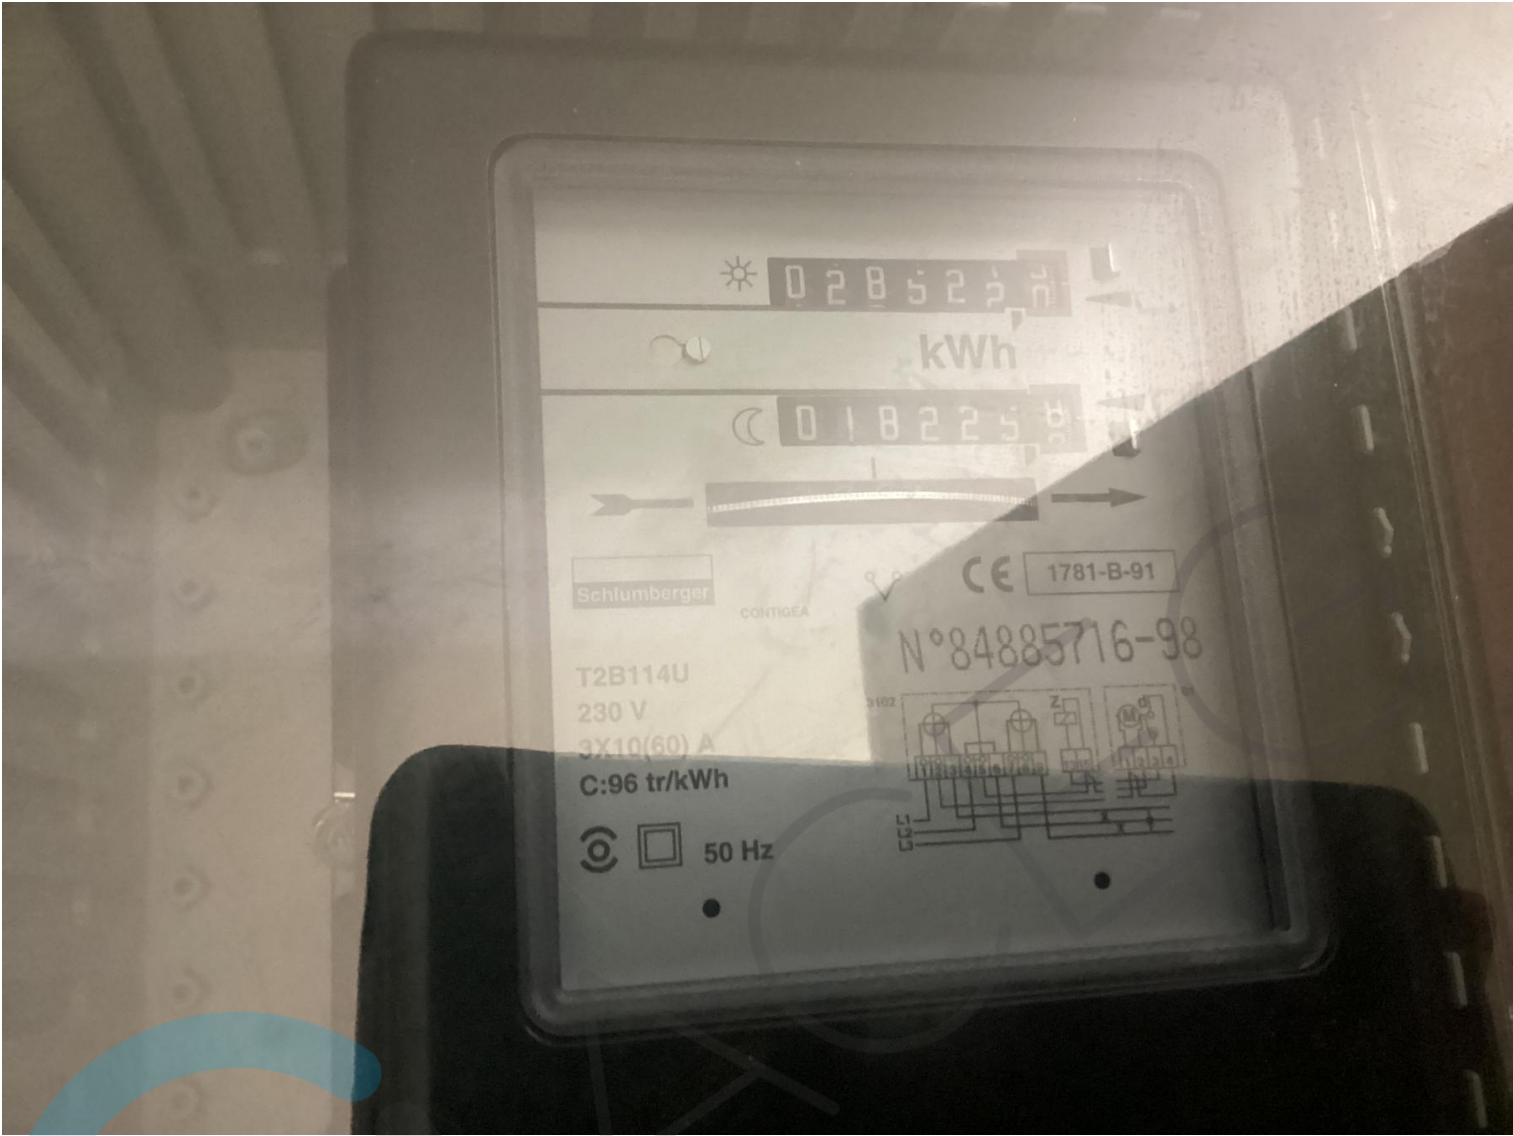

kookplaat	bel (parlefoon) licht inkom stopkontakt living stopkontakt keuken stopkontakt boiler	licht slaapkamer R stopkontakten sl R stopkont dampkap 2 stopkontanten - wastafel keuken	stopkontakt frigo stopkontakt oven 2 stopkontakten - frigo keuken	licht slaapkamer L stopkontakten sl L 2 stopkontakten - schouw living
D L1 , L2 , L3	E L2 , L3	A L1 , L2	C L2 , L3	B L1 , L3

Differentieel	Differentieel	vaatwasmachine keuken	wasmachine badkamer	licht keuken licht living licht badkamer stopkontakt badkamer stopkontakt dak keuken licht wastafel keuken 3 stopkontakten muur - living
300 mA L1 , L2 , L3	30 mA L1 , L2 , L3	G L1 , L2	H L1 , L3	F L1 , L3

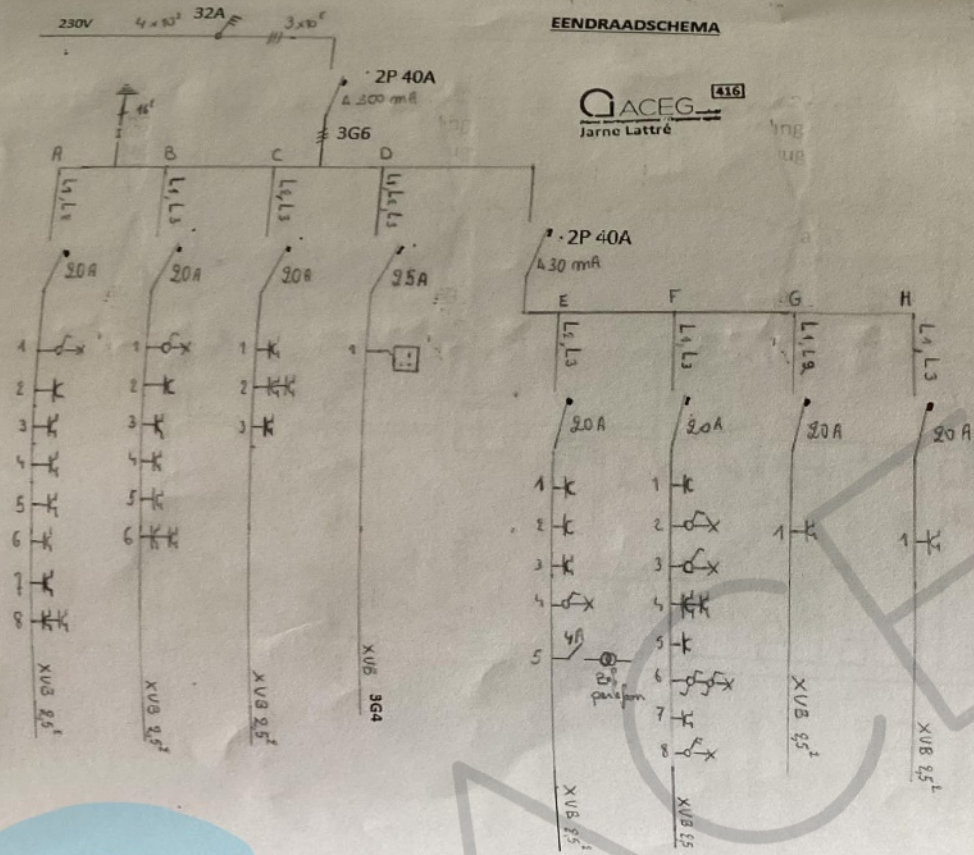

Verantwoordelijke uitvoering der werken:

Eigenaar:

Plaats van uitvoering:

Jan Breydellaan 32
2e verdiep BUS 3
8200 Sint Andries

Eannr.: 5414488200408633


voordelijke
ing der werken:

ar:

van uitvoering:
reydellaan 32
e veriep, Bus 3
Sint Andries

ACEG
Lattre

Elektriteitsplan - 2e verdiep

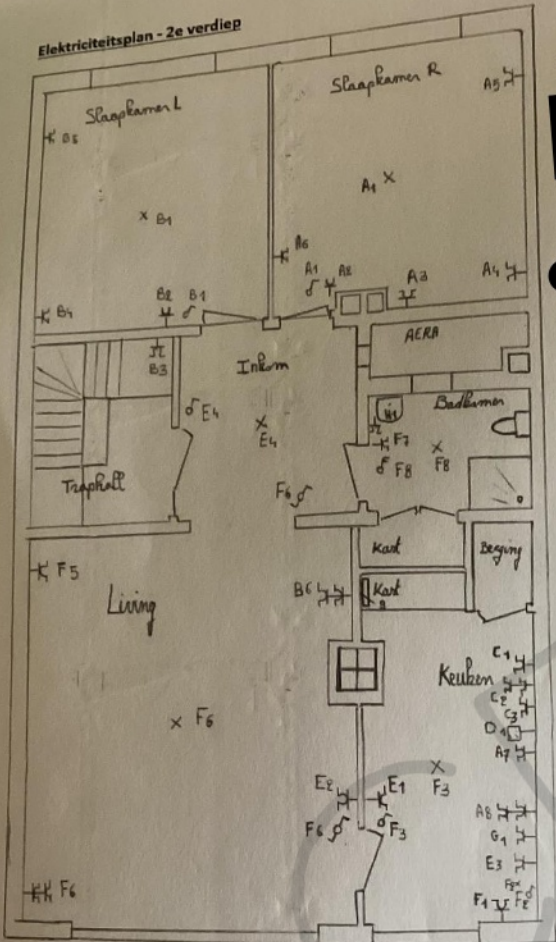

Verantwoordelijke
uitvoering der werken

Eigenaar:

ACEG
Jarne Lattre

Plaats van uitvoering:
Jan Breydellaan 32
2e veriep, Bus 3
8200 Sint Andries

