



N°234-INSP



ELECTROTEST
TECHNISCHE CONTROLES EN OPLEIDINGEN
CONTRÔLES TECHNIQUES ET FORMATIONS

Maatschappelijke zetel / Siège social
Electro-Test vzw/asbl
Kerkstraat 33, 1820 Melsbroek
tel: 02/751.98.39
fax: 02/751.52.09

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	ET 177/2016/7/27/3	Datum van bezoek: Date de visite:	27/07/2016
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	I 8TW BE 0400.576.613	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur:	11209106
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Smitsstraat (Jacob) 12 - 1800 VILVOORDE		
Eigenaar: Propriétaire:	Smitsstraat (Jacob) 12 - 1800 VILVOORDE		
Installateur:	BESTAANDE INSTALLATIE	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:							
Aard van onderzoek: ARET / Genre de contrôle: RGIE		Art. hh: 86		Art. onderzoek: 271		Net:	
Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison							
Spanning / Tension: 2x230V		Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 3 x 4 mm ² XVB			Max. beveiliging / Protection max.: 40A		
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	14.5	Ohm	Isolatie / Isolement:	36.8	MOhm	
				Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1		
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:				Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 8+IRES			
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstrombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	ARET/RGIE	
40A	300mA	A/s	ALGEMEEN	OK	OK	271 - 278	
40A	30mA	A/s	ALGEMEEN	OK	OK	271 - 278	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		Rechtstreekse aanraking: Contact direct:		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:		Aansluitingen: Raccordements:	
OK		OK		OK		OK	

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

ET 177/2016/7/27/3

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via [website](http://www.electro-test.be) / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFUS IBAN: BE83 0682 1176 9115

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.600

BIC-adres: KREDDEBR

BIC-adres: GKCCBE33

info@electro-test.be

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar onbegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. / Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
Het aëndraadschema en opstellingschema werden voorgezien getekend en stemmen overeen met de installatie. / Le schéma unifilaire et de position ont été vus et sont conformes avec l'installation.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.).

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 27/07/2041

Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l'inspecteur:
VISUM (Datum / Date):



HACOUR Koen

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via [website](http://www.electro-test.be) / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

ET 177/2016/7/27/3

BUITEN
KOER/SERRE



Verdeelbord Intervilvoorde
+Jacob Smitsstraat 12

12P214





P&I bvba
Honderdweg 12
B 9230 Wetteren
info@panelhandinstallations.be
http://www.p-i-bvba.be

Gelijkvloers

Revisie datum by jvc

F8

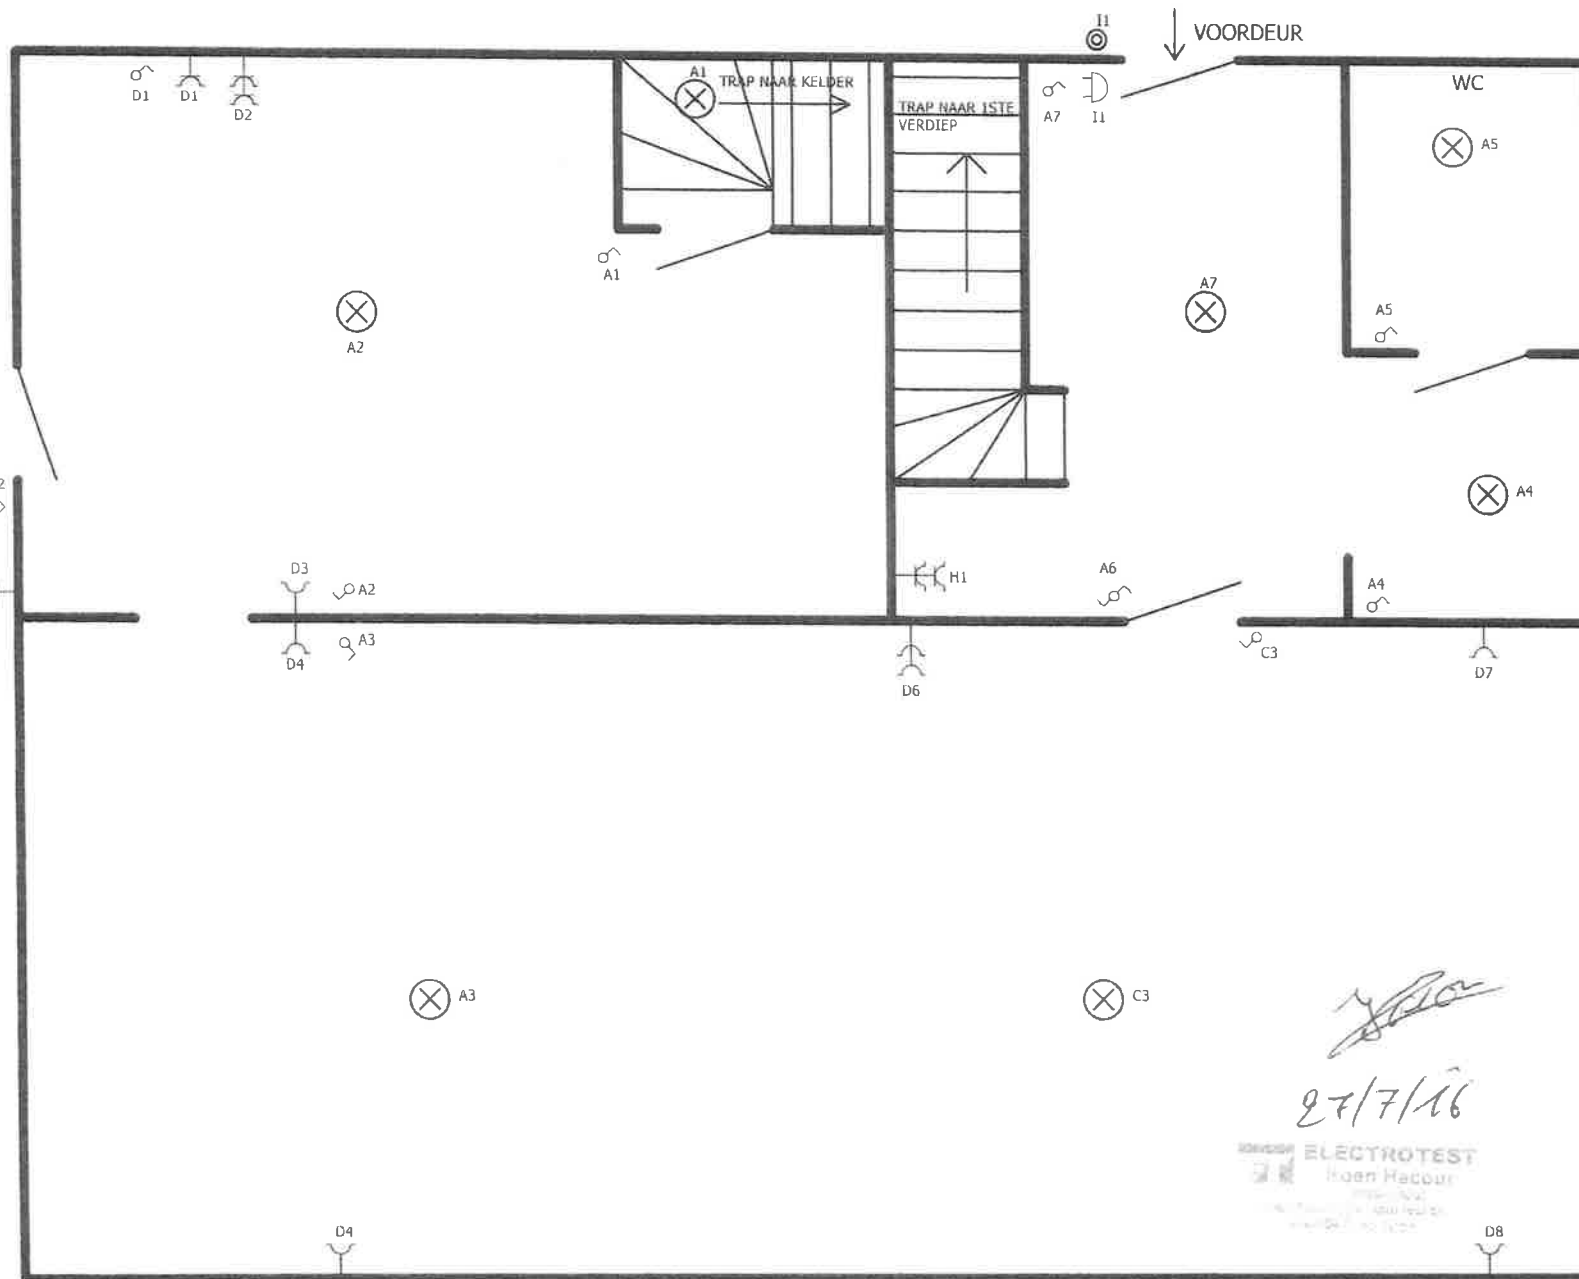

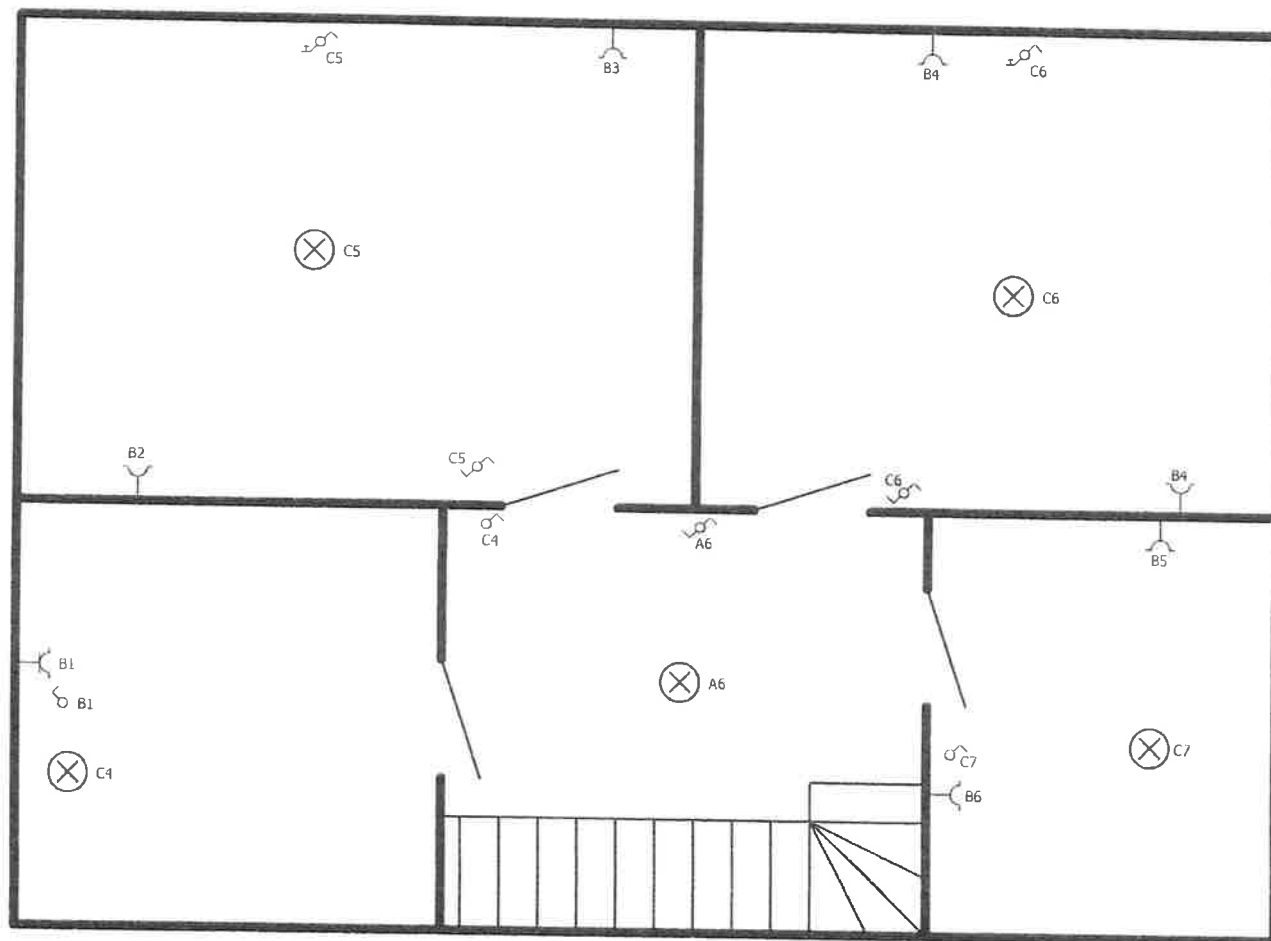

Handwritten signature
27/7/16

ELECTROTEST
Koen Hacour
Inspecteur
Kleinkeuzeweg 10, 3000 Leuven
0478 40 40 40

Verdeelbord Intervilvoorde
+Jacob Smitsstraat 12

12P214




P&I bvba
Horslerdweg 12
B-9230 Wekeren
info@panelsandinstallations.be
http://www.pi-bvba.be

Verdieping 1

Revisie datum by wie

FB

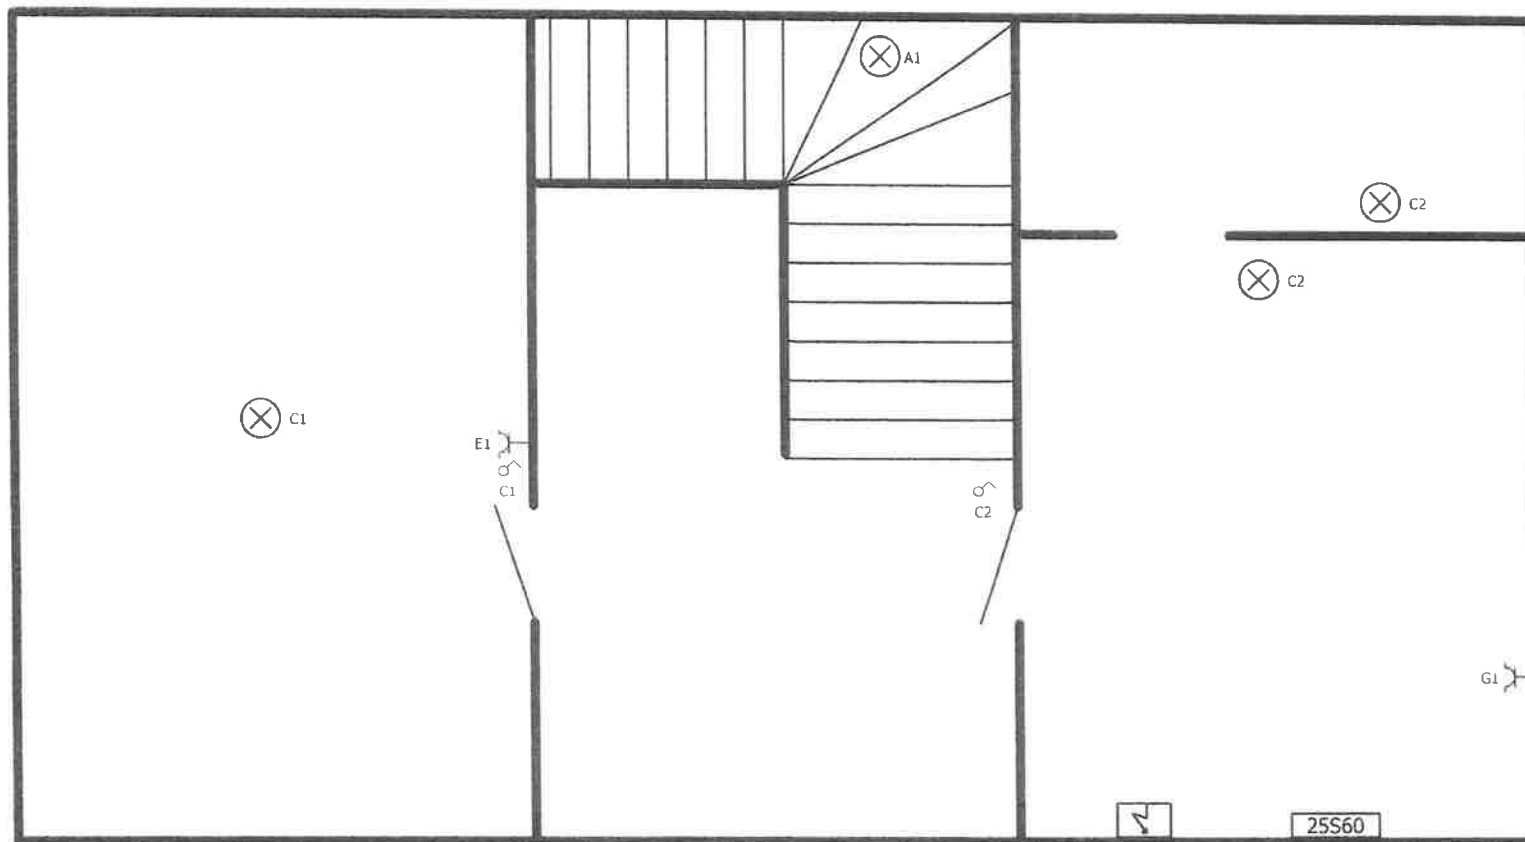


Handwritten signature
27/7/16

ELECTROTEST
Koen Hacour
Projectant
Kerkweg 10, 3000 Leuven
030 211 11 11



Adres van de woning waar de installatie geplaatst wordt
De verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken Handtekening Datum
Afgevaardigde van het keuringsorganisme Handtekening Datum
Eigenaar Handtekening Datum
Bijlagen:

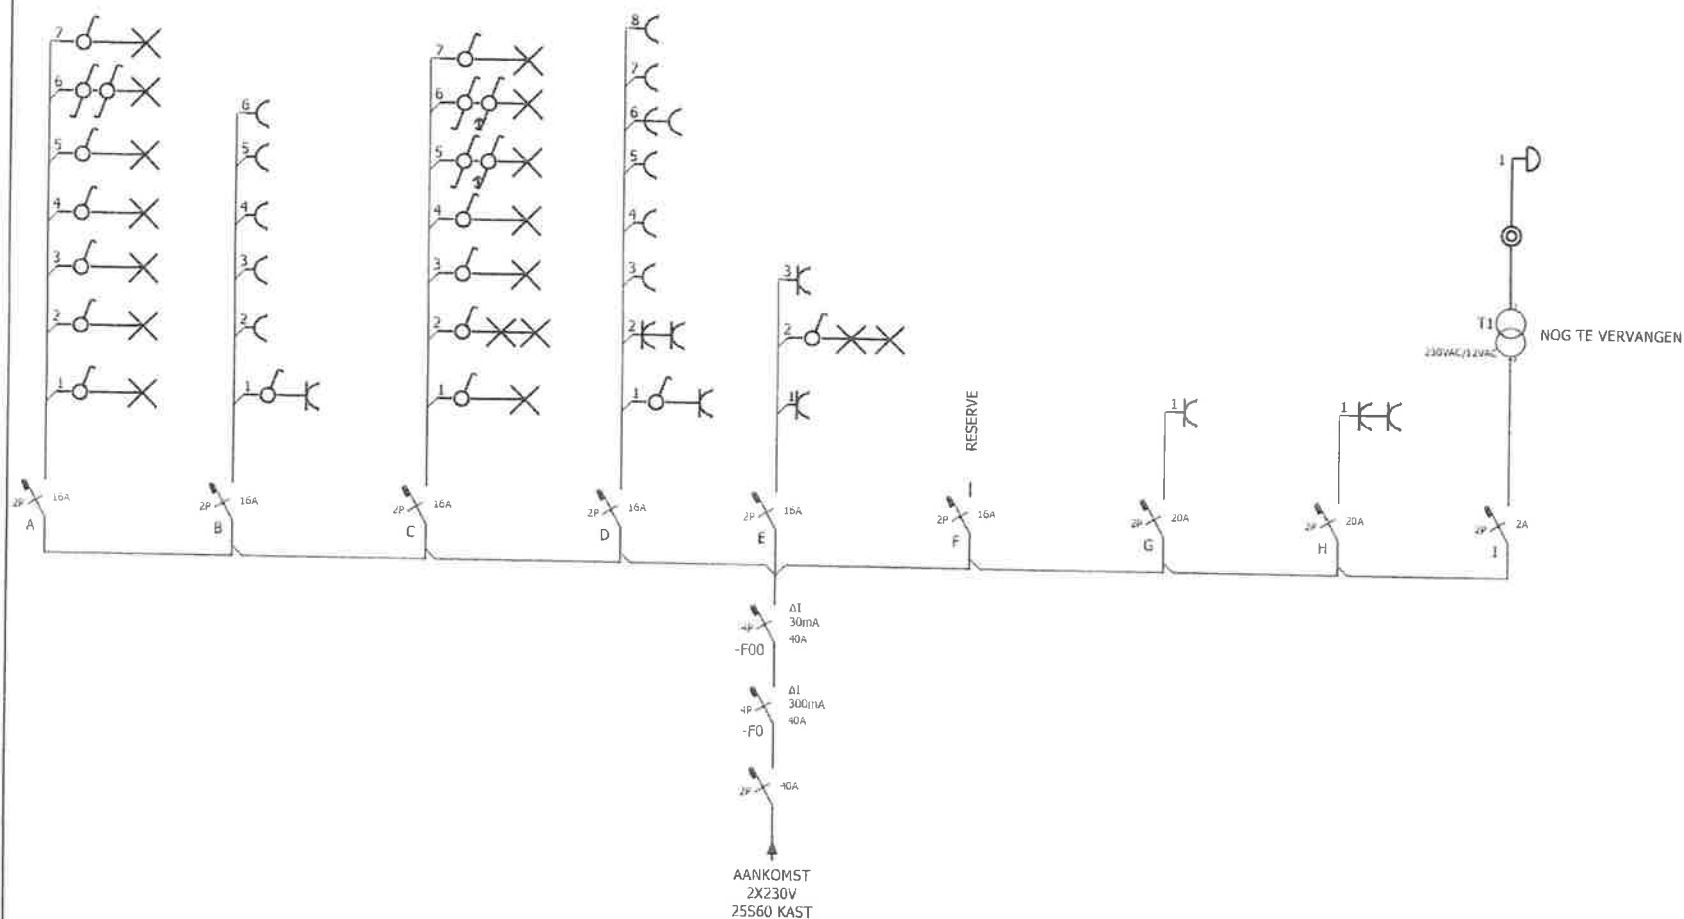

Handwritten signature
27/7/16

ELECTROTEST
Koen Macour
Industrieel
Kleinhandel
Nieuwstraat 10
3000 Leuven

Verdeelbord Intervallvoorde
+Jacob Smitsstraat 12

12P214



P&L bvba
Hordelweg 12
B-9230 Willebroek
info@pandl.be
http://www.p-l-bvba.be

Eendraad

Revisie datum: 09 june '16

FB



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbrugghe nv

☐ BTV Antwerpen	Tel 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☒ BTV West-Vlaanderen	Tel 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

Datum van onderzoek: 27/07/2016

DNB:

U.ref.: O.ref.: Verslagnr: 245460727103

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

indienststelling periodiek

Plaats van onderzoek: Jacob Smetsstraat 12

EIGENAAR:

Adres: Dem

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR: Berkaend

Adres:

BTW nr: 0837.750.538

Aanwezige personen: Haderico

Gebruiker van de installatie: Erik Vervaeke

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN: gasmeter: Klasse: G4 Nr: 1307884 FLO6 Index [m³]: 476,9557

Installatie: MOP [mbar]: 20 ☐ nieuw ☒ bestaande ☐ uitbreiding ☐ gedeelte van een installatie ☐ zie schema in bijlage

Leidingen en toebehoren (diameters, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...): F1" x 10m F1/4" x 4m

Toestellen (merk, model, type, capaciteit, vermogen, ...): Fuser Koolhydraat 10kW, Supera Type B
in omvang (geen koolhydraat, bestaande) Junkers Hydroprover 28kW B11

2. ONDERZOEK: Volgens de actuele staat van de onderzochte aardgas binneninstallatie (gedeelten) en voor zover het visueel onderzoek mogelijk is:

☐ 2.1. Gelijkvormigheidsonderzoek volgens werkinstructie: 10Id013A, ☐ 10Id013B,

En aan de norm(en) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002 die van toepassing zijn op de onderzochte installatie (gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer, ...), volgens punt 2.2.

☒ 2.2. De proeven volgens werkinstructie: 10Id012, ☐ 10Id012B,

Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare delen tijdens het afzeppen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange periode. Deze periode: is de tijd nodig voor het afzeppen, en is in functie van de omvang van de installatie en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie. De proeven:

- ☐ Niet destructieve controle: zie bijlage (*)
- ☐ Mechanische weerstandsproef/sterkteproef: zonder de elementen die niet kunnen weerstaan aan de proefdrukken. Meetinstrument: manometer
- ☐ Dichtheidsproef: Proeffluidum: ☐ lucht, ☐ inert gas, ☐ water, Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]:
- ☒ Dichtheidsproef: Meetinstrument: ☐ manometer, ☒ gasmeter klasse ≤ G6, Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]:
- ☐ Dichtheidsproef: Proeffluidum: ☐ lucht, ☒ inert gas, ☒ aardgas, Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: / ☐ MOP.

3. VASTSTELLINGEN EN/OF NOTA'S: Verklaringen: De dichtheidsproef heeft voldoende geschonken.

Nota's: Enkel de dichtheidsproef maakt deel uit van de controle

4. BESLUIT:

- ☐ A. Uit het onderzoek volgens het punt 2.1, blijkt dat de onderzochte installatie conform is.
- ☐ B. Uit het onderzoek volgens het punt 2.1, blijkt dat de onderzochte installatie niet conform is.
- ☒ C. Het onderzoek volgens punt 2.2, heeft voldoende geschonken.
- ☐ D. Het onderzoek volgens punt 2.2, heeft geen voldoende geschonken.

5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN: zie verso

6. BIJLAGEN: ☐ BTV verslag nrs. ☐ Uitbesteding (*) ☐ Installatieschema ☐ Bewijs CE-markering, EG-verklaring van de leidingen DN>25 mm en M.D.B. M.D.C. (richtlijn drukapparatuur 97/23/EG)

De agent onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

voor de directeur,

Ondertekend voor gelezen en geïnformeerd,
(naam, handtekening)



* VERSLAG - RAPPORT *

