



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : 30435438A



F 110096

Rési code :

☐ Antwerpen-Limburg

tél : 03 221 86 11

☐ Oost & West - Vlaanderen

tél : 09 244 77 11

☐ Brabant

tél : 02 674 57 11

☒ Wallonie

tél : 081 432 611

10

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom :	Nom, Prénom : 1 ^{er} Avont et commun
N° carte d'identité :	Adresse : 11, Rue Ferdinand Henaux
N°TVA : BE	CP + Commune : 9400 Elzevir
	Tél :

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☒ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☐ Art 86	☐ Art 271bis	☐ Unité d'habitation
	☐ mobile	☐ temporaire		☒ Art 87	☐ Art 278	☒ Unité de travail domestique
☒ Art 271	☐ périodique	☒ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ Parties communes
☐ Art 276 : renforcement	☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			☐ Art	☐ Art	☐ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° 21636708	Index jour :	Index nuit :
Données installation	Protection branchement (A) : ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	n° :	
	Conçue pour U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type de prise de terre : ☐ boucle de terre ☒ barres / piquets	
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal : 4 X 10 mm ² - Type : XUB	Dispositif diff. gén. : 63 A / 300 mA	
	Dispositif diff. gén. : 63 A / 300 mA	Nombre de tableaux : 1+1	Nombre de circuits terminaux : 13
☐ Voir annexe(s)	Schémas vu sur place		

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ >/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre 12.1 Ω		☒ Isolement général : 21 MΩ		☒ Continuité de terre		☒ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
☒ Néant	
Infractions Installation existante	
☒ Néant	
Remarques	Visa GRD ou mandataire :
☒ Néant	

Conclusion(s) :

☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.

☒ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

Agent visiteur :

Nom : C. L. U. B.

Agent n° 2338

Date : 16/11/2015

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : ☐ Schéma(s) de position :


☐ Schéma(s) unifilaire(s) :

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- ☐ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- ☐ Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.


- LIBELLE -	SYMBOLE	ANNEXE
Interrupteur simple		PROPRIETAIRE Rue Fer HENAU 11 4000 LIEGE Signature:
Interrupteur bipolaire		
Interrupteur unipolaire va-et-vient		
Interrupteur bipolaire va-et-vient		
Commutateur intermédiaire pour va-et-vient		
Commutateur unipolaire		
Dispositif de protection à courant Différentiel résiduel		Lieux des travaux: Rue Ferd Henaux 11 4000 LIEGE APPART 1 ét AVANT commun
Petit Disjoncteur de la taille de 22 Amps		
Sonnerie		
Appareil de chauffage		
Bouton poussoir		
Minuterie		ELECTRICIEN
Télérupteur		MEYERBOLD J - P 0496/13.89.56 Signature:
Socle de prise de courant + Terre + protection		
Bloc autonome d'éclairage de sécurité		
Point lumineux		
Luminaire à fluorescence		
Transformateur		Controlé Le 16 / 11 / 2015 AIB VINCOTTE OLEVIER Signature:
Compteur		
Chauffe eau électrique		
Cuisinière électrique		
Lessiveuse		
Sechoir		N de Circuits : 13 Schéma (s) de position : 3 Schéma (s) Unifilaire (s) : 2
Lave-vaisselle		
TENSION DE SERVICE = 220		
Observation N° compteur : 21636789 Code EAN :		

	COFFRET 1° ETAGE	
01		DIFFERENTIEL 63AMP 300MA (coffret Compteur)
02	Disjoncteur 16 amp	Alimentation Exutoire (les deux cages)
03	Disjoncteur 16 amp	Alimentation Parlophone & Ecl Bureau Olivier
04	Disjoncteur 16 amp	Prise Bureau Olivier
05	Disjoncteur 16 amp	Ecl Wc & Lavabo & Réserve
06	Disjoncteur 16 amp	Prise Réserve
07	Disjoncteur 16 amp	Prise Bureau Carine & Ecl Bureau Carine
08	Disjoncteur 16 amp	Prise Bureau Olivier
09	Disjoncteur 16 amp	Alimentation Minuterie & secours
10	Disjoncteur 20 amp	Prise sous Coffret & Alimentation Volet
11	Disjoncteur 20 amp	Prise Bureau Carine
12	Disjoncteur 20 amp	Alimentation Chaudière
13	Disjoncteur 20 amp	Climatisation Bureau Olivier
14	Disjoncteur 20 amp	Climatisation Bureau Carine
15		Redresseur Parlophone
16		Minuterie Cage Avant
17		Minuterie Cage Arrière


COFFRET ELECTRIQUE

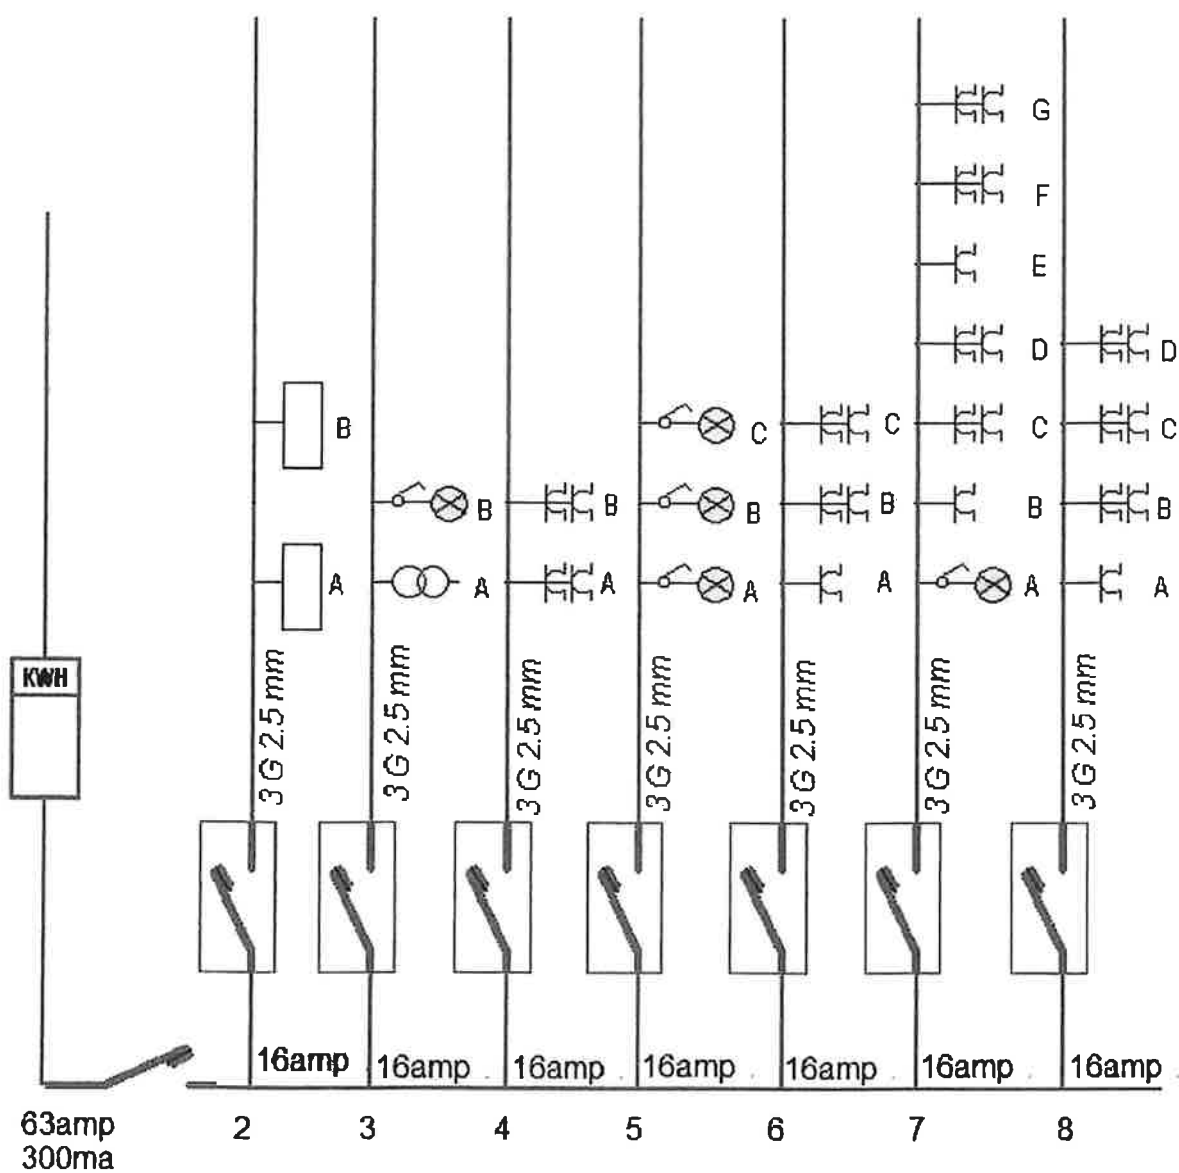


COFFRET ELECTRIQUE

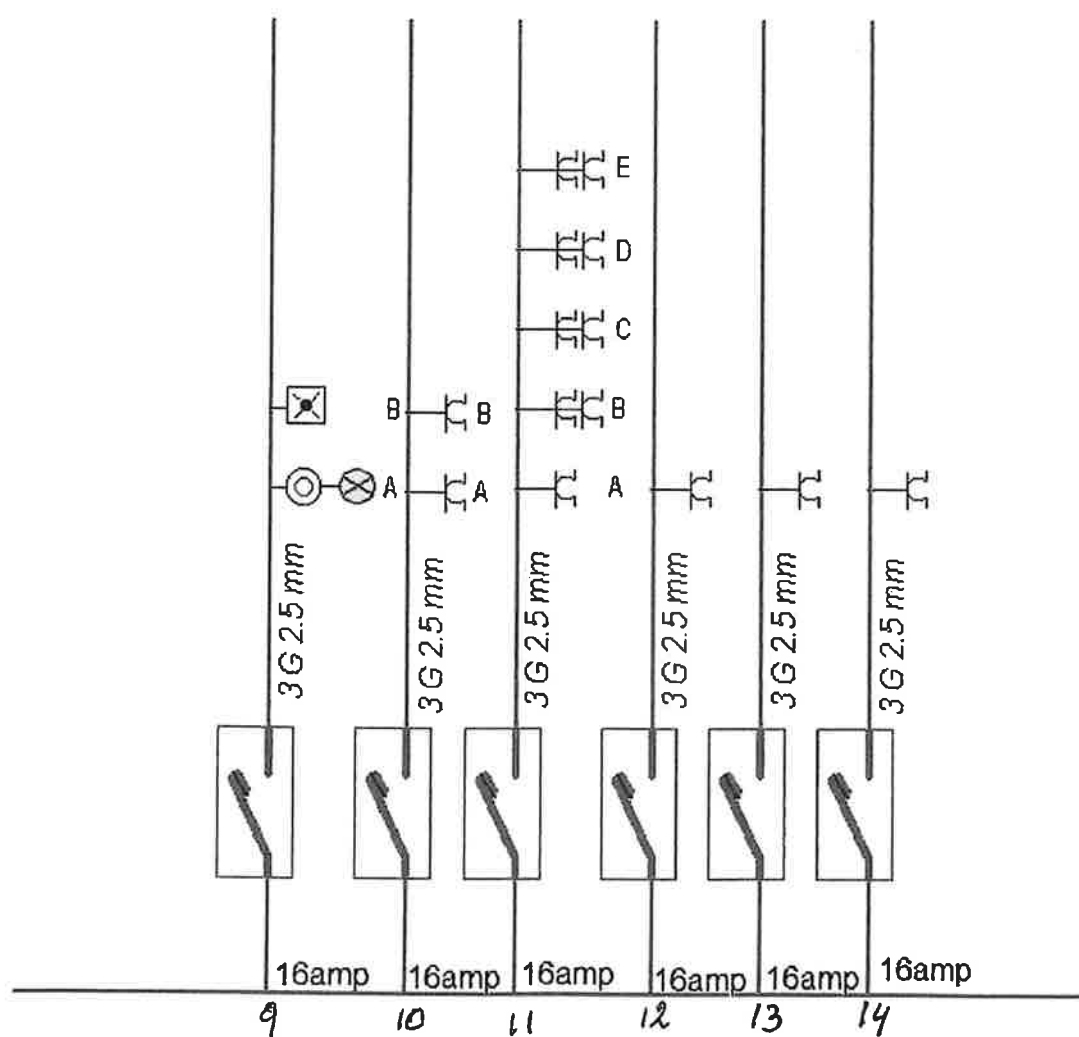


COTE RUE

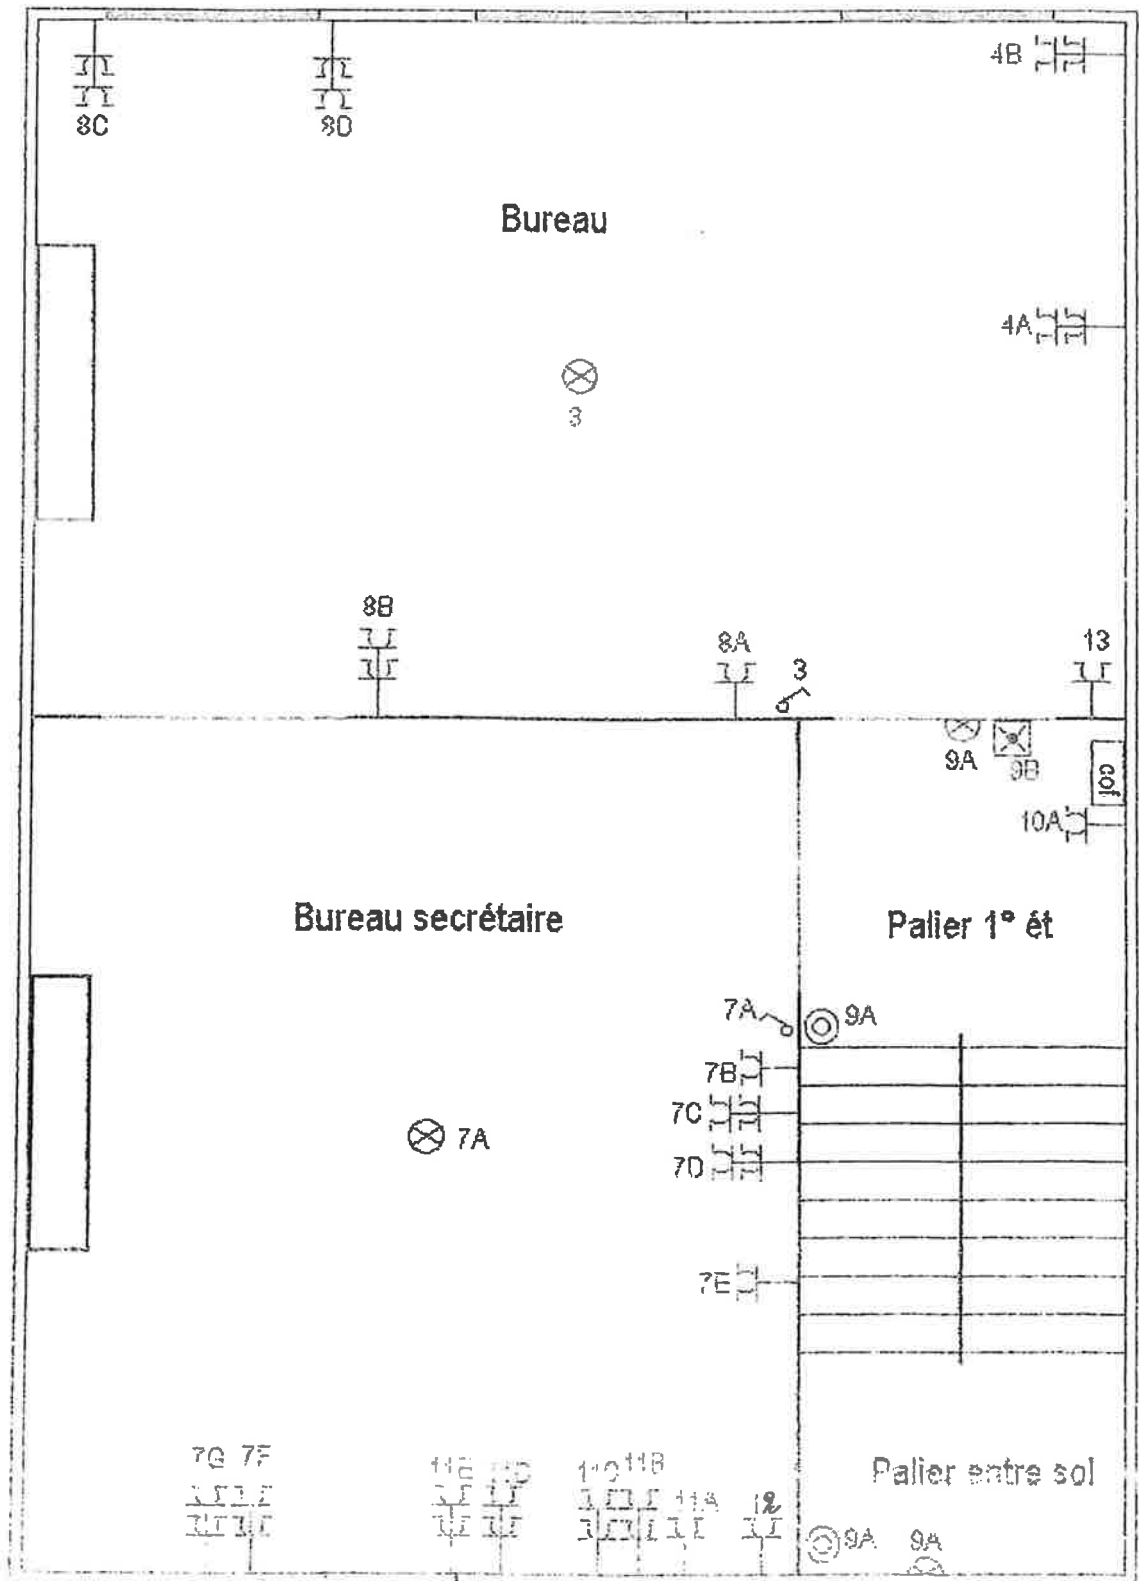

COTE RUE

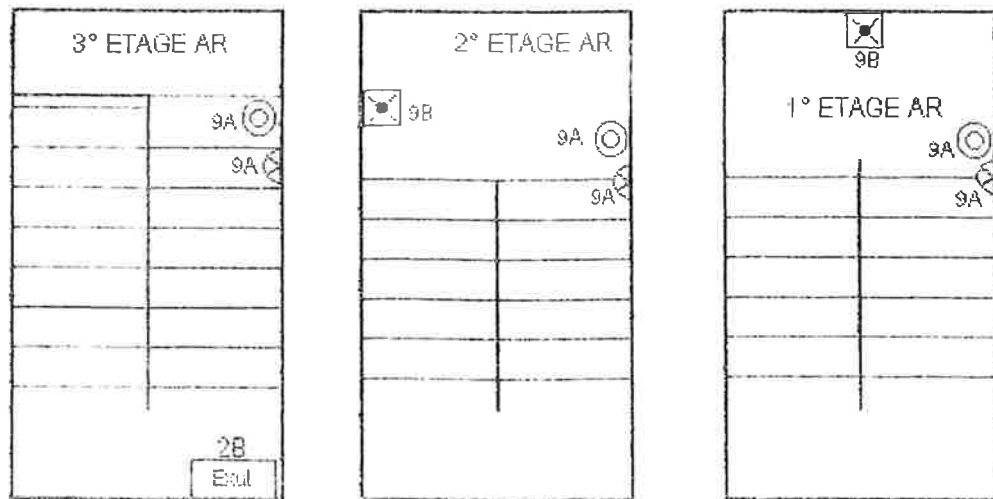

ENTRE SOL

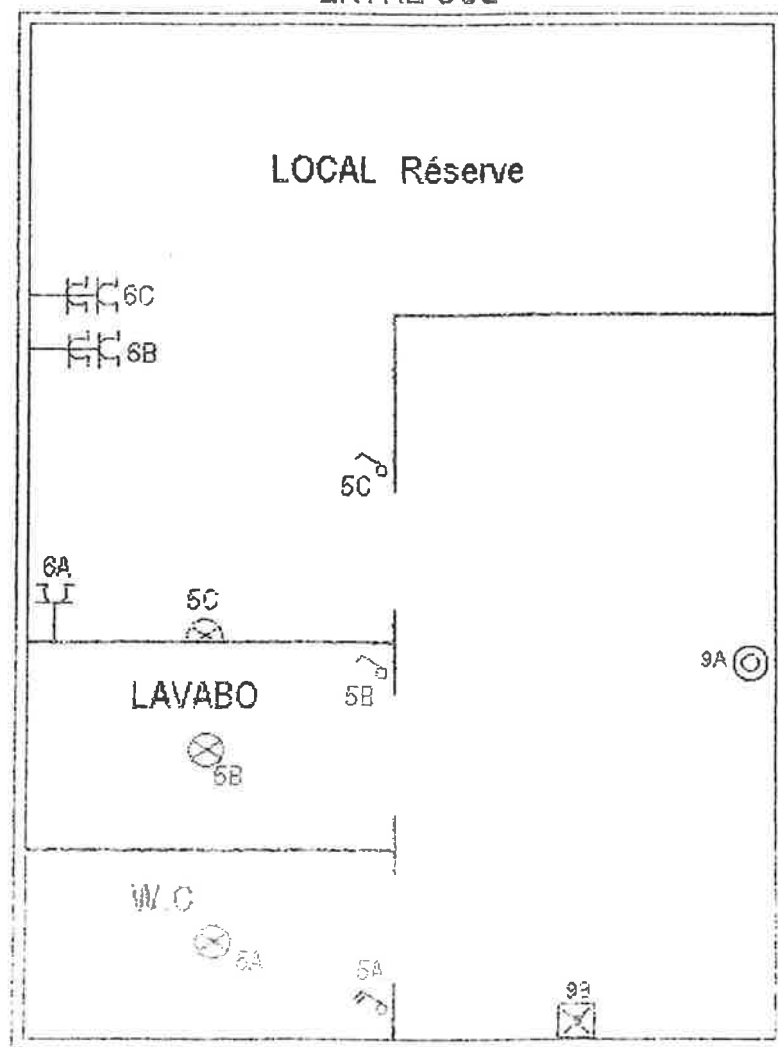

COTE RUE


4° ETAGE AV



3° ETAGE AV



2° ETAGE AV

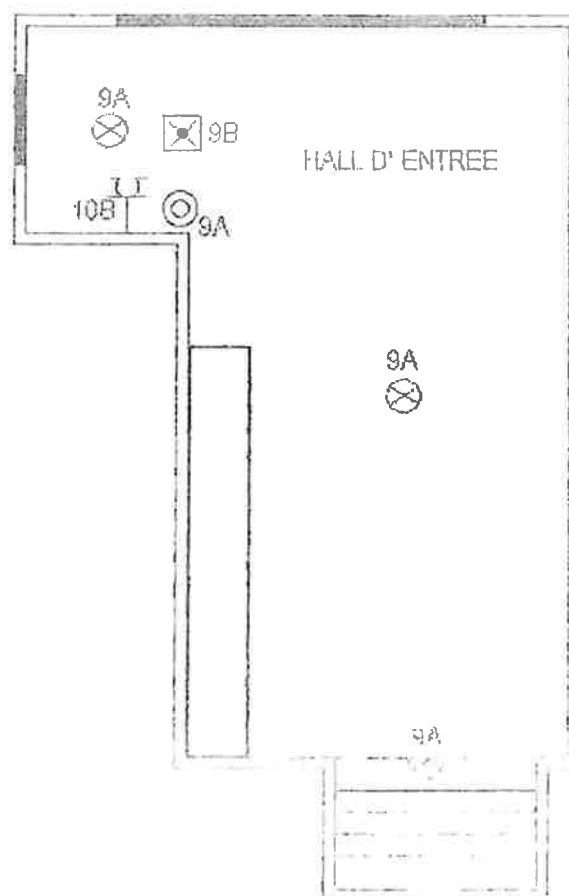



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : 304.35438 B



F 110097

Rési code :

☐ Antwerpen-Limburg

tél : 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tél : 09 244 77 11

☐ Brabant

tél : 02 674 57 11

☒ Wallonie

tél : 081 432 611

10

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :		Installation :		Propriétaire / gestionnaire :	
Nom, Prénom :		Nom, Prénom :	App. 3ème Arrivée		
N° carte d'identité :		Adresse :	M. Rue Ferdinand Henoux		
N°TVA : BE		CP + Commune :	9000 Gileppe		
		Tél. :	1		

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Unité de travail domestique
☒ Art 271	☐ périodique	☒ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ Parties communes
☐ Art 276 : renforcement		☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation		☐ Art	☐ Art	☒ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN		☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n°	68927173	Index jour :	
Données installation	Protection branchement (A) :	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ 125	☐ Compt. kWh exclusif nuit :	
	Conçue pour U _N :	☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type de prise de terre :	
	Courant nominal maximum (A) :	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐ boucle de terre ☒ barres / piquets	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal :	4 X 1.0 mm² - Type : XNB	☐	
	Dispositif diff. gén. :	63 A / 300 mA	Nombre de tableaux :	1
	Schéma ou sur place		Nombre de circuits terminaux :	6

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ >/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : 12.1 Ω		☒ Isolement général : 2.1 MΩ		☒ Continuité de terre		☐ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
☒ Néant	
Infractions Installation existante	
☒ Néant	
Remarques	Contrôle des parties visibles et accessibles de l'installation
☐ Néant	

Conclusion(s) :

☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.

☒ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

Agent visiteur :

Nom : CLEVER

Agent n° : 2338

Date : 16/11/2015

Annexe(s) : ☐ Schéma(s) de position : ☒

☐ Schéma(s) unifilaire(s) : ☐

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

16.11.2015 (*)

☒ par le même organisme de contrôle.


Pour le Directeur Général : Signature


- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- ☐ Les Informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- ☐ Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

- LIBELLE -	SYMBOLE	ANNEXE
Interrupteur simple		PROPRIETAIRE Rue Fer HENAUX 11 4000 LIEGE Signature:
Interrupteur bipolaire		
Interrupteur unipolaire va-et-vient		
Interrupteur bipolaire va-et-vient		
Commutateur intermédiaire pour va-et-vient		
Commutateur unipolaire		
Dispositif de protection à courant Différentiel résiduel		Lieux des travaux: Rue Ferd Henaux 11 4000 LIEGE APPART 3ét ARRIERE
Petit Disjoncteur de la taille de 22 Amps		
Sonnerie		
Appareil de chauffage		
Bouton poussoir		
Minuterie		ELECTRICIEN
Télérupteur		MEYFROND J - P 0496/13.89.56 Signature:
Socle de prise de courant + Terre + protection		
Bloc autonome d'éclairage de sécurité		
Point lumineux		
Luminaire à fluorescence		
Transformateur		Controlé Le 16 / 11 / 2015 AIB VINCOTTE CLEVER Signature:
Compteur		
Chauffe eau électrique		
Cuisinière électrique		
Lessiveuse		
Sechoir		N de Circuits : 6 Schéma (s) de position : 1 Schéma (s) Unifilaire (s) : 1
Lave-vaisselle		
TENSION DE SERVICE = 220		
Observation N° compteur : 68827173		
Code EAN :		

3ét ARRIERE		COFFRET
01		DIFFERENTIEL 63 AMP 300 MA
02	Disjoncteur 32 amp	PLAQUE ELECTRIQUE
03	Disjoncteur 16 amp	PRISE CUISINE
04	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE SEJOUR - CHAMBRE
05	Disjoncteur 16 amp	PRISE CHAMBRE
06		DIFFERENTIEL 63 AMP 30 MA
07	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE S.D.B.
08	Disjoncteur 16 amp	PRISE S.D.B.

COFFRET ELECTRIQUE

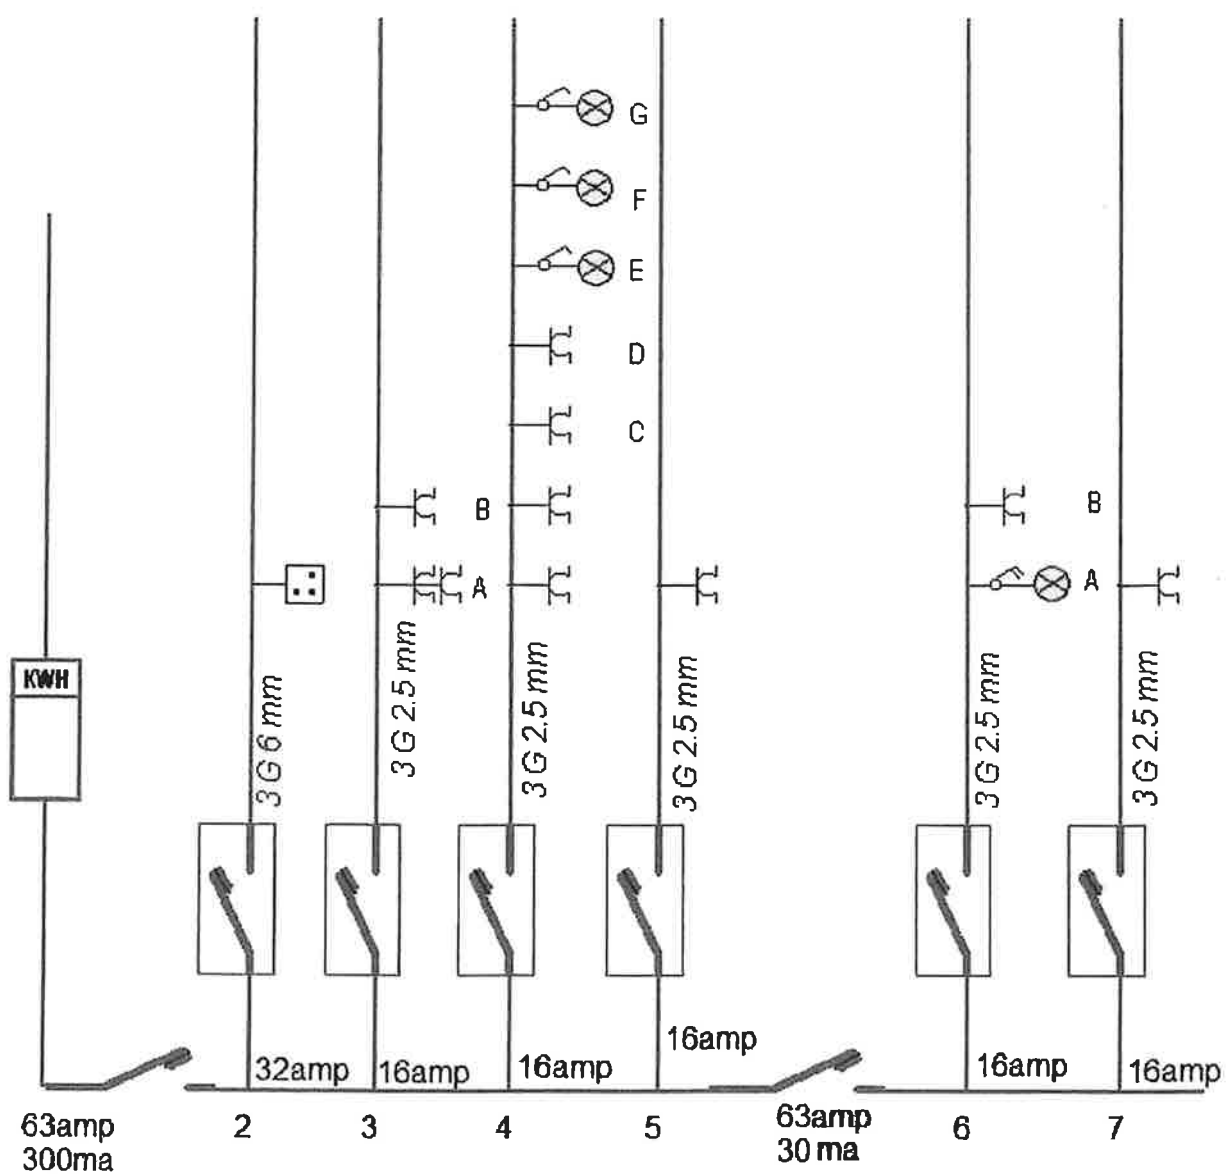

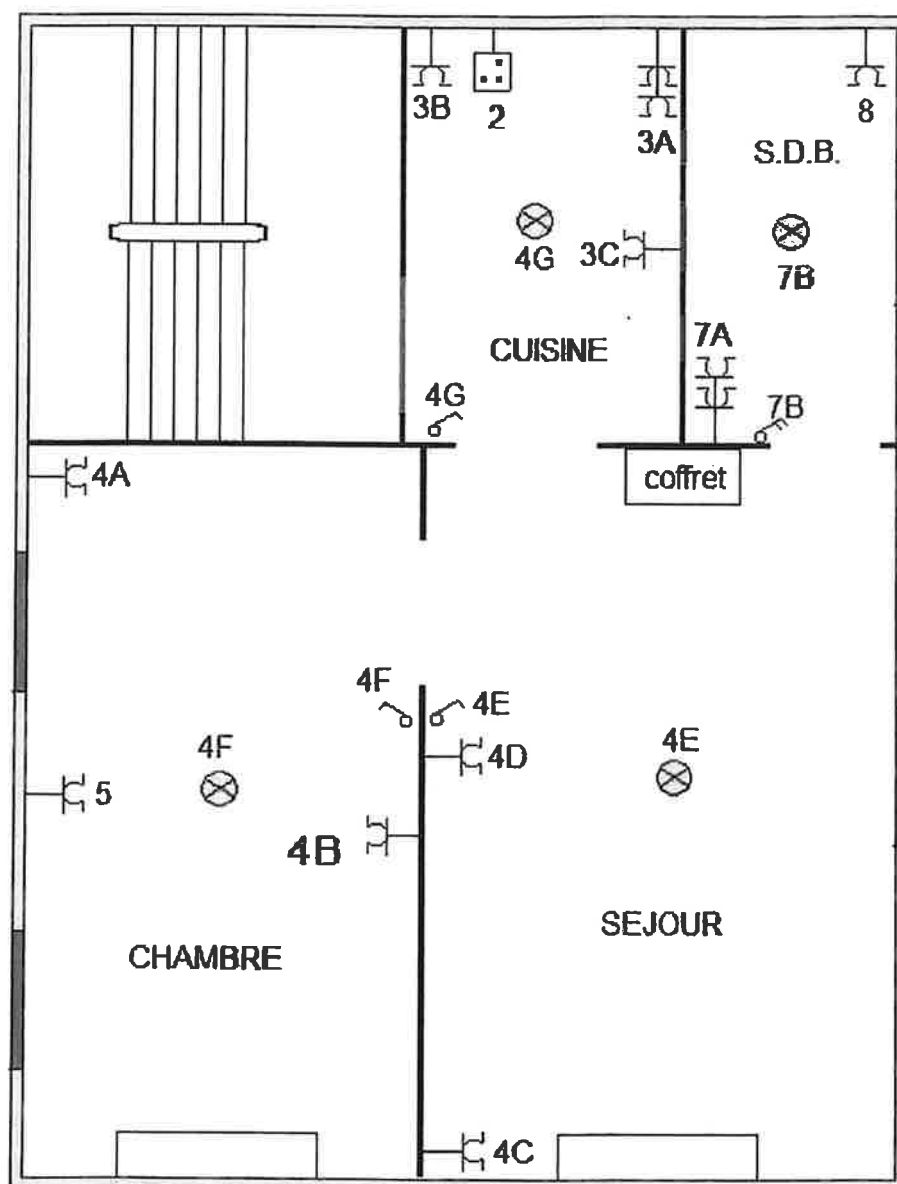



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles
Safety, quality and environmental services

Rapport n°: 304.354.30.C



F 110098

☐ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tél : 03 221 86 11
tél : 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen
☒ Wallonie

tél : 09 244 77 11
tél : 081 432 611

Résid code :

10

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom :	Nom, Prénom :	Adresse :
N° carte d'identité :	CP + Commune :	Tél. :
N° TVA : BE		

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
☐ Art 271	☐ périodique	☒ contrôle	☐	☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Unité de travail domestique
☐ Art 276	☐ renforcement	☐ Art 276bis	☐ vente d'une unité d'habitation	☐ Art 88	☐ Art	☐ Parties communes
				☐ Art	☐ Art	☐ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
Compt. kWh n°	688.271.67	Index jour :	Index nuit :
Protection branchement (A) :	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☒ 45	☐ Compt. kWh exclusif nuit :
Données installation	Conçue pour U _N :	☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type de prise de terre :
	Courant nominal maximum (A) :	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ boucle de terre ☒ barres / piquets
	Câble d'alimentation tableau principal :	5 x 10 mm ² - Type : SUB	☐
Description installation	Dispositif diff. gén. :	63 A / 300 mA	Nombre de tableaux :
☐ Voir annexe(s)			Nombre de circuits terminaux :

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ >/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre	12.1. Ω	☒ Isolement général	7.1. MΩ	☒ Continuité de terre	☐ Test dispositif diff.		
Le dispositif différentiel général : ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle Installation	
☒ Néant	
Infractions Installation existante	
☒ Néant	
Remarques	Contrôle de parties visible et accessible de l'installation
☐ Néant	

Conclusion(s) :

☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☒ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

16.11.2015 (*)

☒ par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : CLEVER

Agent n° : 2338 Date : 16/11/2015

Pour le Directeur Général : Signature


Annexe(s) : ☐ Schéma(s) de position : ☐ Schéma(s) unifilaire(s) :


- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

- LIBELLE -	SYMBOLE	ANNEXE
Interrupteur simple		PROPRIETAIRE Rue Fer HENAUX 11 4000 LIEGE Signature:
Interrupteur bipolaire		
Interrupteur unipolaire va-et-vient		
Interrupteur bipolaire va-et-vient		
Commutateur intermédiaire pour va-et-vient		
Commutateur unipolaire		
Dispositif de protection à courant Différentiel résiduel		Lieux des travaux: Rue Ferd Henaux 11 4000 LIEGE APPART 2ét ARRIERE
Petit Disjoncteur de la taille de 22 Amps		
Sonnerie		
Appareil de chauffage		
Bouton poussoir		
Minuterie		
Télérupteur		ELECTRICIEN MEYERFROID J - P 0496/13.89.56 Signature:
Socle de prise de courant + Terre + protection		
Bloc autonome d'éclairage de sécurité		
Point lumineux		
Luminaire à fluorescence		
Transformateur		
Compteur		Controlé Le 16 / 11 / 2015 AIB VINCOTTE GLEVIER Signature:
Chauffe eau électrique		
Cuisinière électrique		
Lessiveuse		
Sechoir		
Lave-vaisselle		
TENSION DE SERVICE = 220		N de Circuits : 7 Schéma (s) de position : 1 Schéma (s) Unifilaire (s) : 1
Observation N° compteur : 68827167 Code EAN :		

2ét ARRIERE		COFFRET
01		DIFFERENTIEL 63 AMP 300 MA
02	Disjoncteur 32 amp	PLAQUE ELECTRIQUE
03	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE CHAMBRE - SEJOUR
04	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE CUISINE
05	Disjoncteur 16 amp	PRISE CHAMBRE
06	Disjoncteur 16 amp	PRISE SEJOUR
07		DIFFERENTIEL 63 AMP 30 MA
08	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE S.D.B.
09	Disjoncteur 16 amp	PRISE S.D.B.

COFFRET ELECTRIQUE

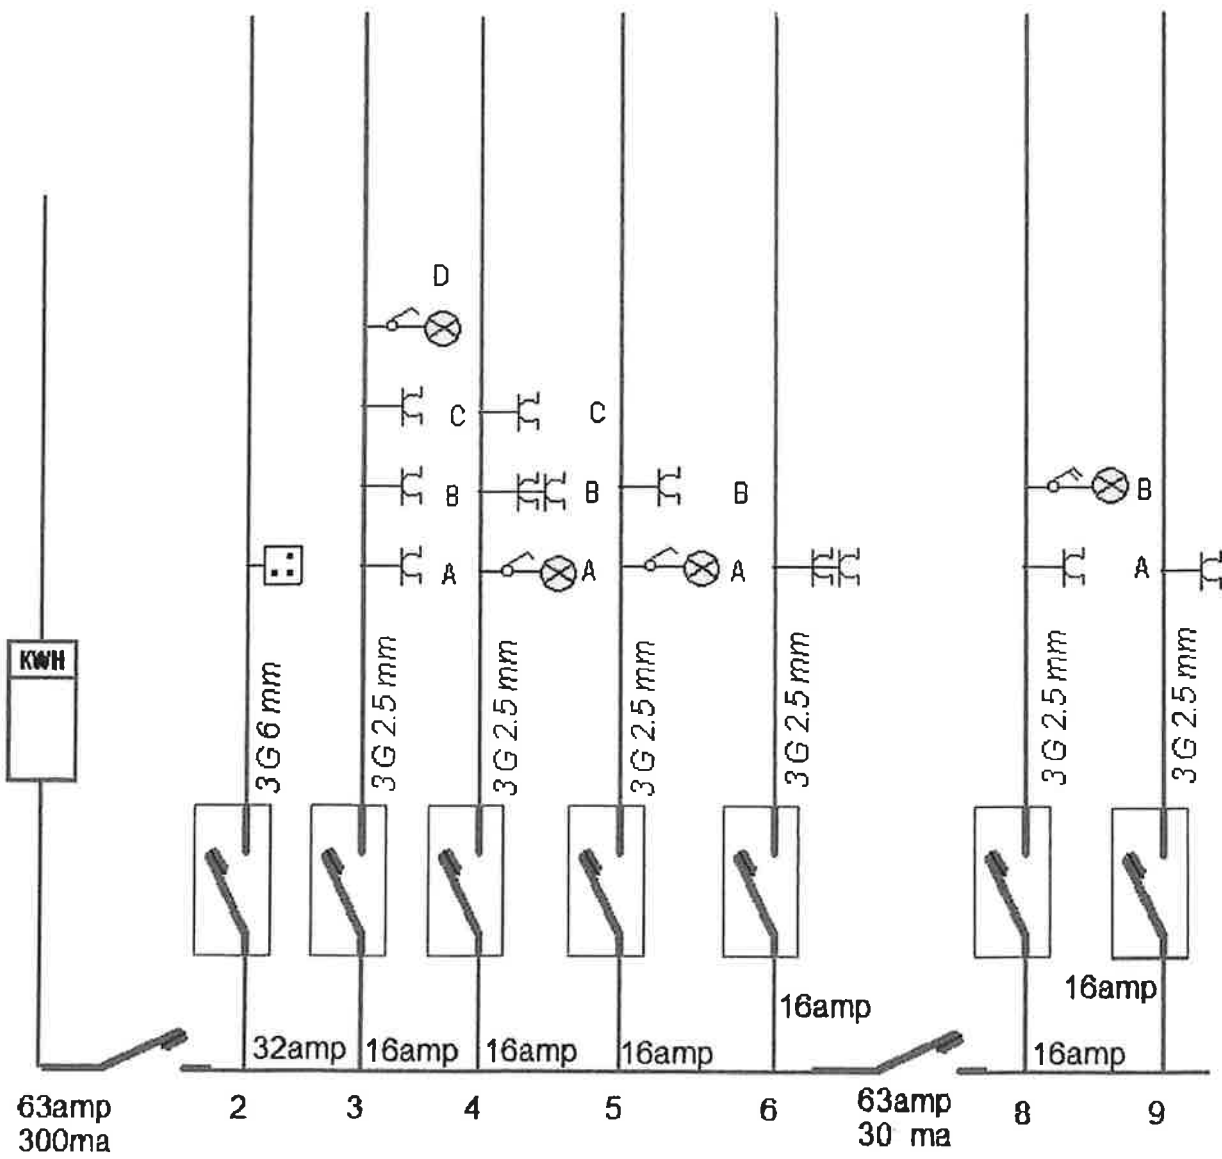

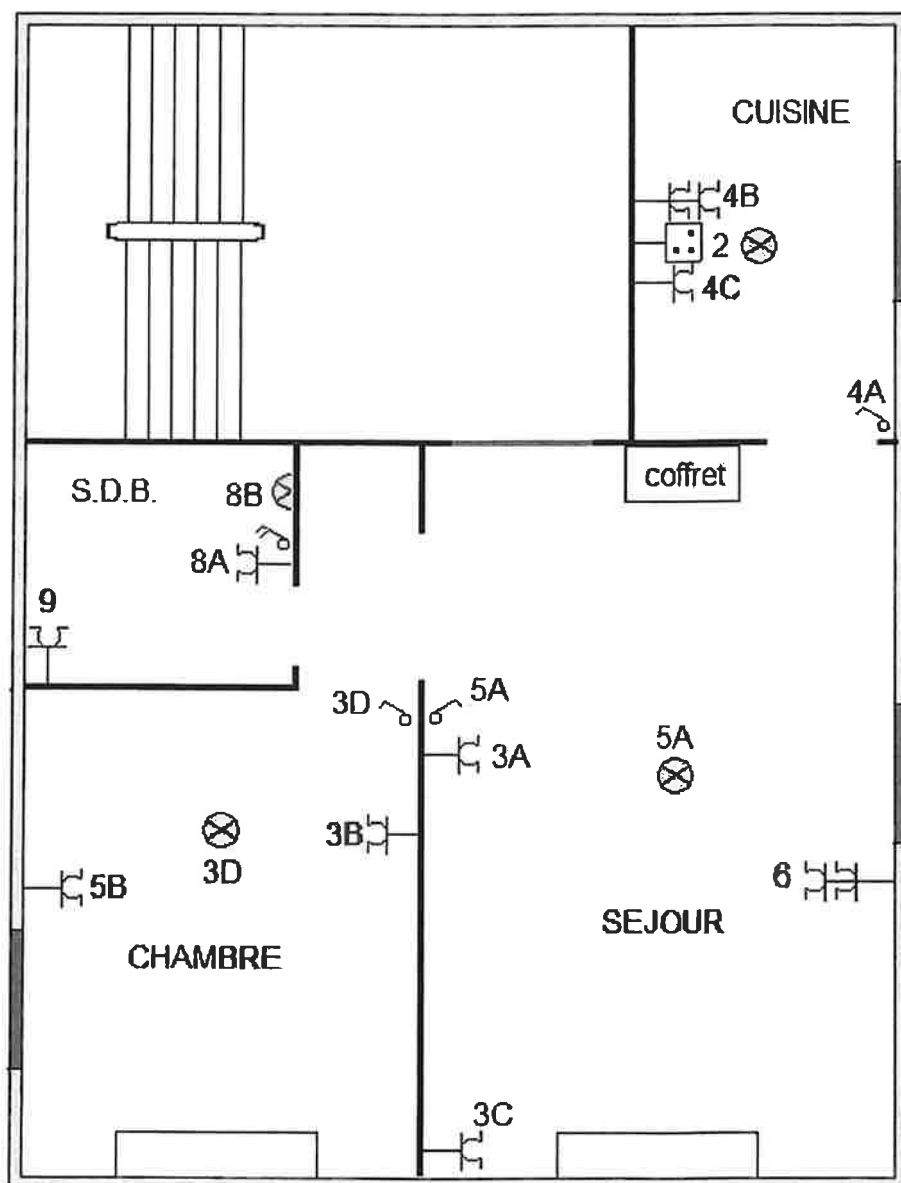



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : 304.354.30.D



F 110099

Rési code :

☐ Antwerpen-Limburg

tél : 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tél : 09 244 77 11

☐ Brabant

tél : 02 674 57 11

☒ Wallonie

tél : 081 432 611

10

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom :	Nom, Prénom : App. Mr. Argiere
N° carte d'identité :	Adresse : 11 Rue Ferdinand Henoux
N°TVA : BE	CP + Commune : 9000 Lige
	Tél. : 1

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Unité de travail domestique
☒ Art 271	☐ périodique	☒ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ Parties communes
☐ Art 276 : renforcement	☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			☐ Art	☐ Art	☒ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° 28838468	Index jour :	Index nuit :
Données installation	Protection branchement (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ 125	☐ Compt. kWh exclusif nuit :	
	Conçue pour U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type de prise de terre : ☐ boucle de terre ☒ barres / piquets	
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal : 3 X 6 mm ² - Type : SUB	Dispositif diff. gén. : 63 A / 300 mA	
	Dispositif diff. gén. : 63 A / 300 mA	Nombre de tableaux : 1+1	Nombre de circuits terminaux : 7
☐ Voir annexe(s)	Schémas ou sur place		

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ >/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : 12.1 Ω	☒ Isolement général : 7.7 MΩ	☒ Continuité de terre	☐ Test dispositif diff.				
Le dispositif différentiel général : ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation		
☒ Néant		
Infractions Installation existante		
☒ Néant		
Remarques	Contrôle des parties visibles et accessibles de l'installation	Visa GRD ou mandataire :
☐ Néant		

Conclusion(s) :

☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.

☒ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

Agent visiteur :

Nom : CLEVER

Agent n° 2338

Date : 16/11/2015

Annexe(s) : ☐ Schéma(s) de position :

☐ Schéma(s) unifilaire(s) :

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

16/11/2015 (*)

☒ par le même organisme de contrôle.


Pour le Directeur Général : Signature

- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.


- LIBELLE -	SYMBOLE	ANNEXE
Interrupteur simple		PROPRIETAIRE Rue Fer HENAUX 11 4000 LIEGE Signature:
Interrupteur bipolaire		
Interrupteur unipolaire va-et-vient		
Interrupteur bipolaire va-et-vient		
Commutateur intermédiaire pour va-et-vient		
Commutateur unipolaire		
Dispositif de protection à courant Différentiel résiduel		Lieux des travaux: Rue Ferd Henaux 11 4000 LIEGE APPART 1ét ARRIERE
Petit Disjoncteur de la taille de 22 Amps		
Sonnerie		
Appareil de chauffage		
Bouton poussoir		
Minuterie		ELECTRICIEN MEYERBOND J - P 0496/13.89.56 Signature:
Télerrupteur		
Socle de prise de courant + Terre + protection		
Bloc autonome d'éclairage de sécurité		
Point lumineux		
Luminaire à fluorescence		Controlé Le 16 / 11 / 2015 AIB VINCOTTE CLEVER Signature:
Transformateur		
Compteur		
Chauffe eau électrique		
Cuisinière électrique		
Lessiveuse		N de Circuits : 7 Schéma (s) de position : 1 Schéma (s) Unifilaire (s) : 1
Sechoir		
Lave-vaisselle		
TENSION DE SERVICE = 220		
Observation N° compteur : 28839469 Code EAN :		

1 ét ARRIERE		COFFRET
01		DIFFERENTIEL 63 AMP 300 MA
02	Disjoncteur 32 amp	PLAQUE ELECTRIQUE
03	Disjoncteur 16 amp	PRISE CHAMBRE
04	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE CHAMBRE - SEJOUR
05	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE CUISINE
06	Disjoncteur 16 amp	PRISE SEJOUR
07		DIFFERENTIEL 63 AMP 30 MA
08	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE S.D.B.
09	Disjoncteur 16 amp	PRISE S.D.B.

COFFRET ELECTRIQUE

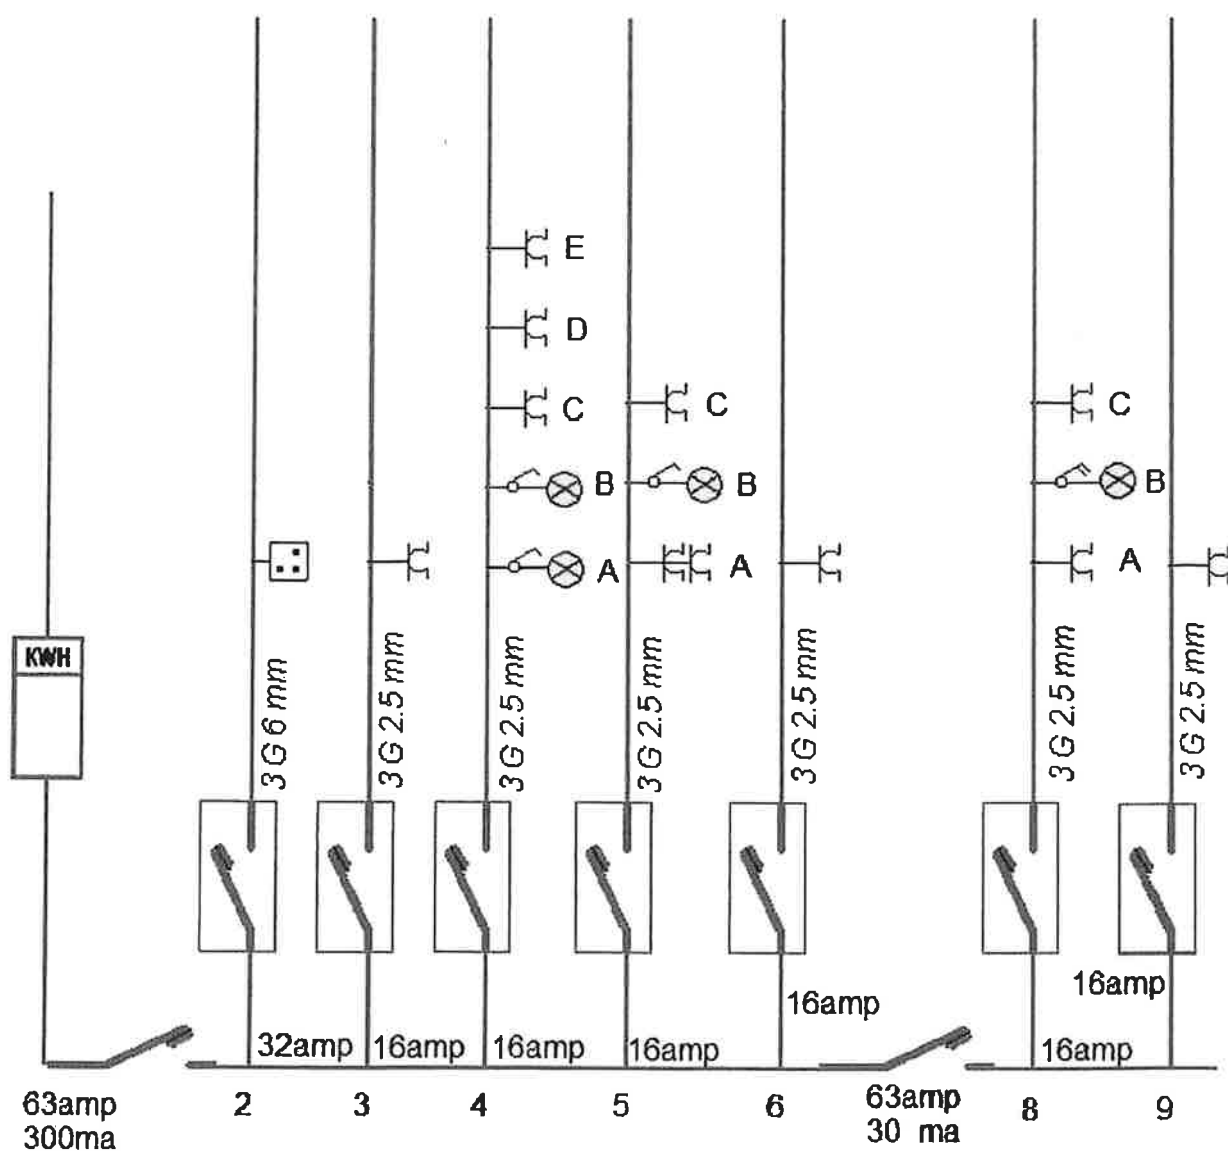

J

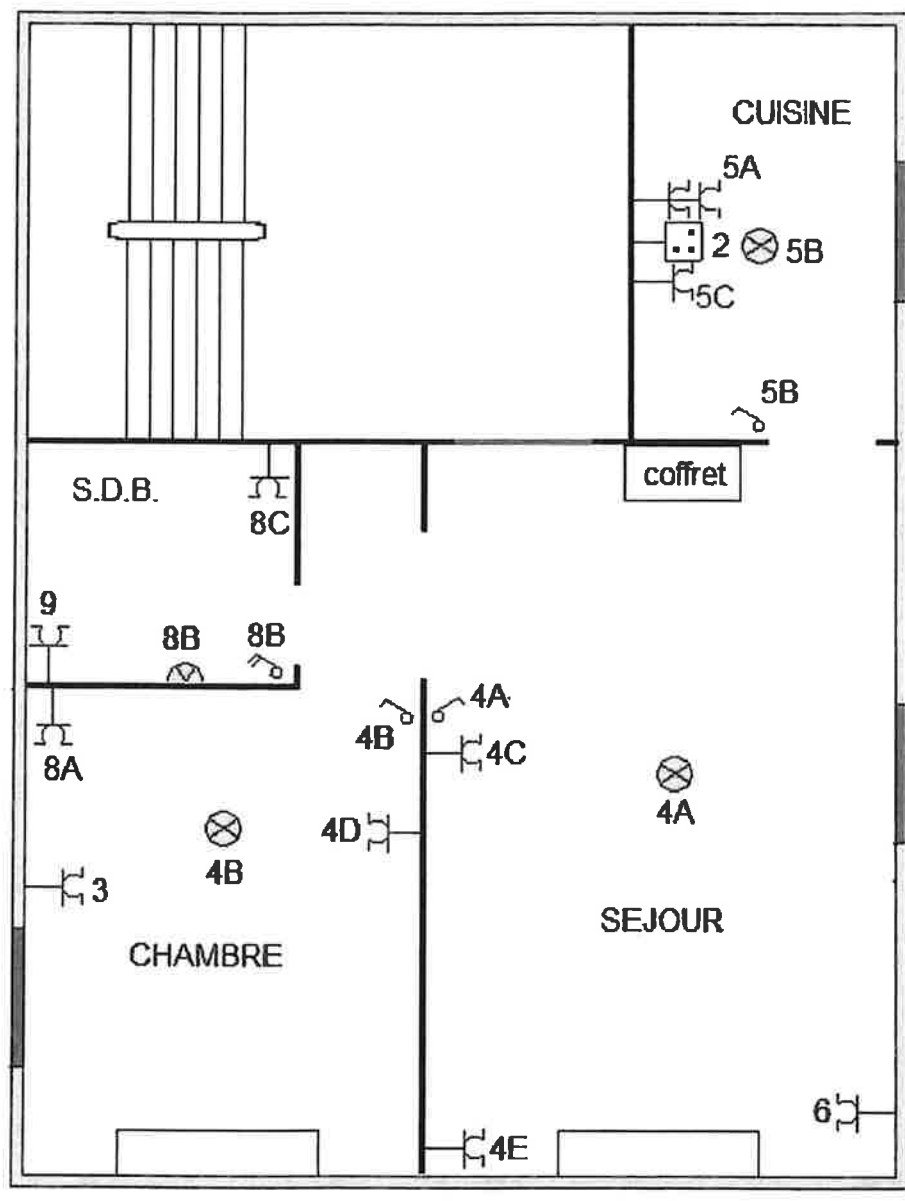


50010122


- LIBELLE -	SYMBOLE	ANNEXE
Interrupteur simple		PROPRIETAIRE Rue Fer HENAUX 11 4000 LIEGE Signature:
Interrupteur bipolaire		
Interrupteur unipolaire va-et-vient		
Interrupteur bipolaire va-et-vient		
Commutateur intermédiaire pour va-et-vient		
Commutateur unipolaire		
Dispositif de protection à courant Différentiel résiduel		Lieux des travaux: Rue Ferd Henaux 11 4000 LIEGE APPART 4 ét AVANT DROIT
Petit Disjoncteur de la taille de 22 Amps		
Sonnerie		
Appareil de chauffage		
Bouton poussoir		
Minuterie		ELECTRICIEN <i>MEYFROND J - P</i> 0496/13.89.56 Signature:
Télérupteur		Controlé Le 16 / 11 / 2015 AIB VINCOTTE <i>CLEVER</i> Signature:
Socle de prise de courant + Terre + protection		
Bloc autonome d'éclairage de sécurité		
Point lumineux		
Luminaire à fluorescence		
Transformateur		N de Circuits : 7 Schéma (s) de position : 1 Schéma (s) Unifilaire (s) : 1
Compteur		
Chauffe eau électrique		
Cuisinière électrique		
Lessiveuse		
Sechoir		
Lave-vaisselle		
TENSION DE SERVICE = 220		
Observation N° compteur : 68827179 Code EAN :		

4 ét AVANT DROIT		COFFRET
01		DIFFERENTIEL 63 AMP 300 MA
02	Disjoncteur 32 amp	PLAQUE ELECTRIQUE
03	Disjoncteur 16 amp	ECL HALL & SEJOUR
04	Disjoncteur 16 amp	PRISE CUISINE & SEJOUR
05	Disjoncteur 16 amp	PRISE SEJOUR
06		DIFFERENTIEL 63 AMP 30 MA
07	Disjoncteur 16 amp	PRISE CUISINE
08	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE S.D.B.
09	Disjoncteur 16 amp	PRISE DEBARRAS

COFFRET ELECTRIQUE

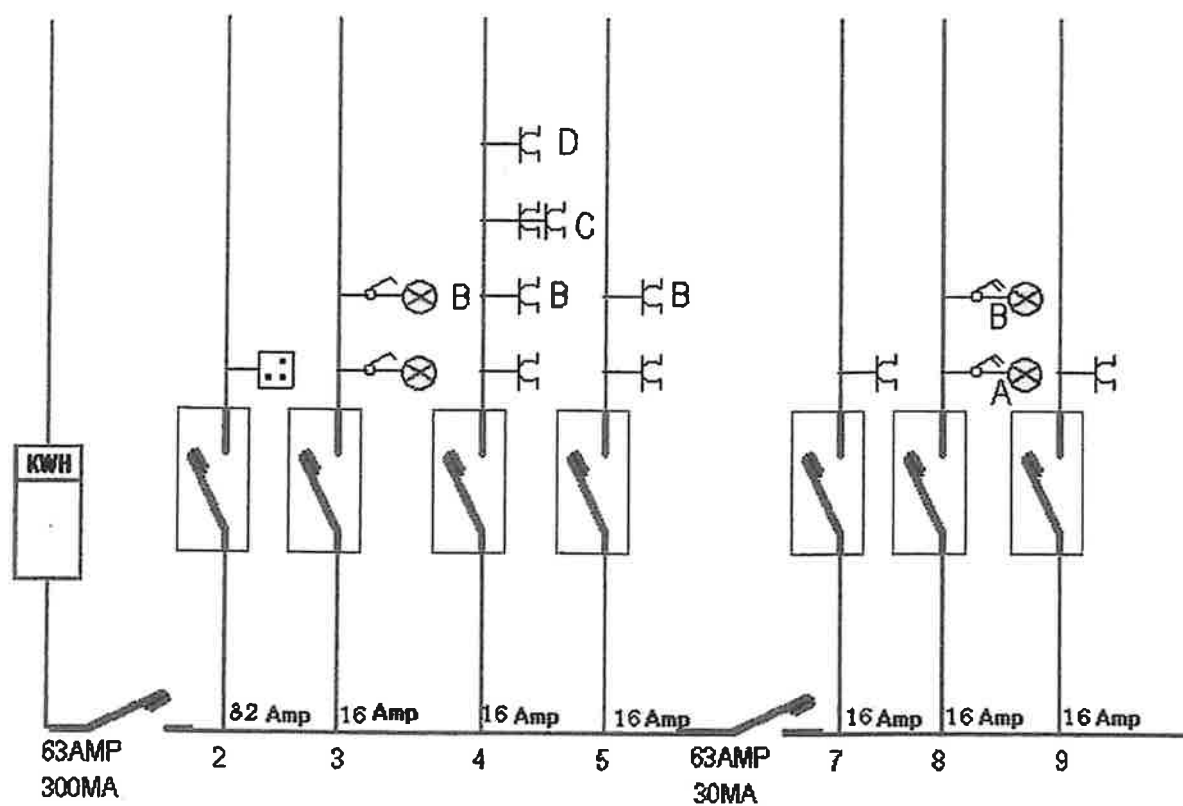

COTE RUE

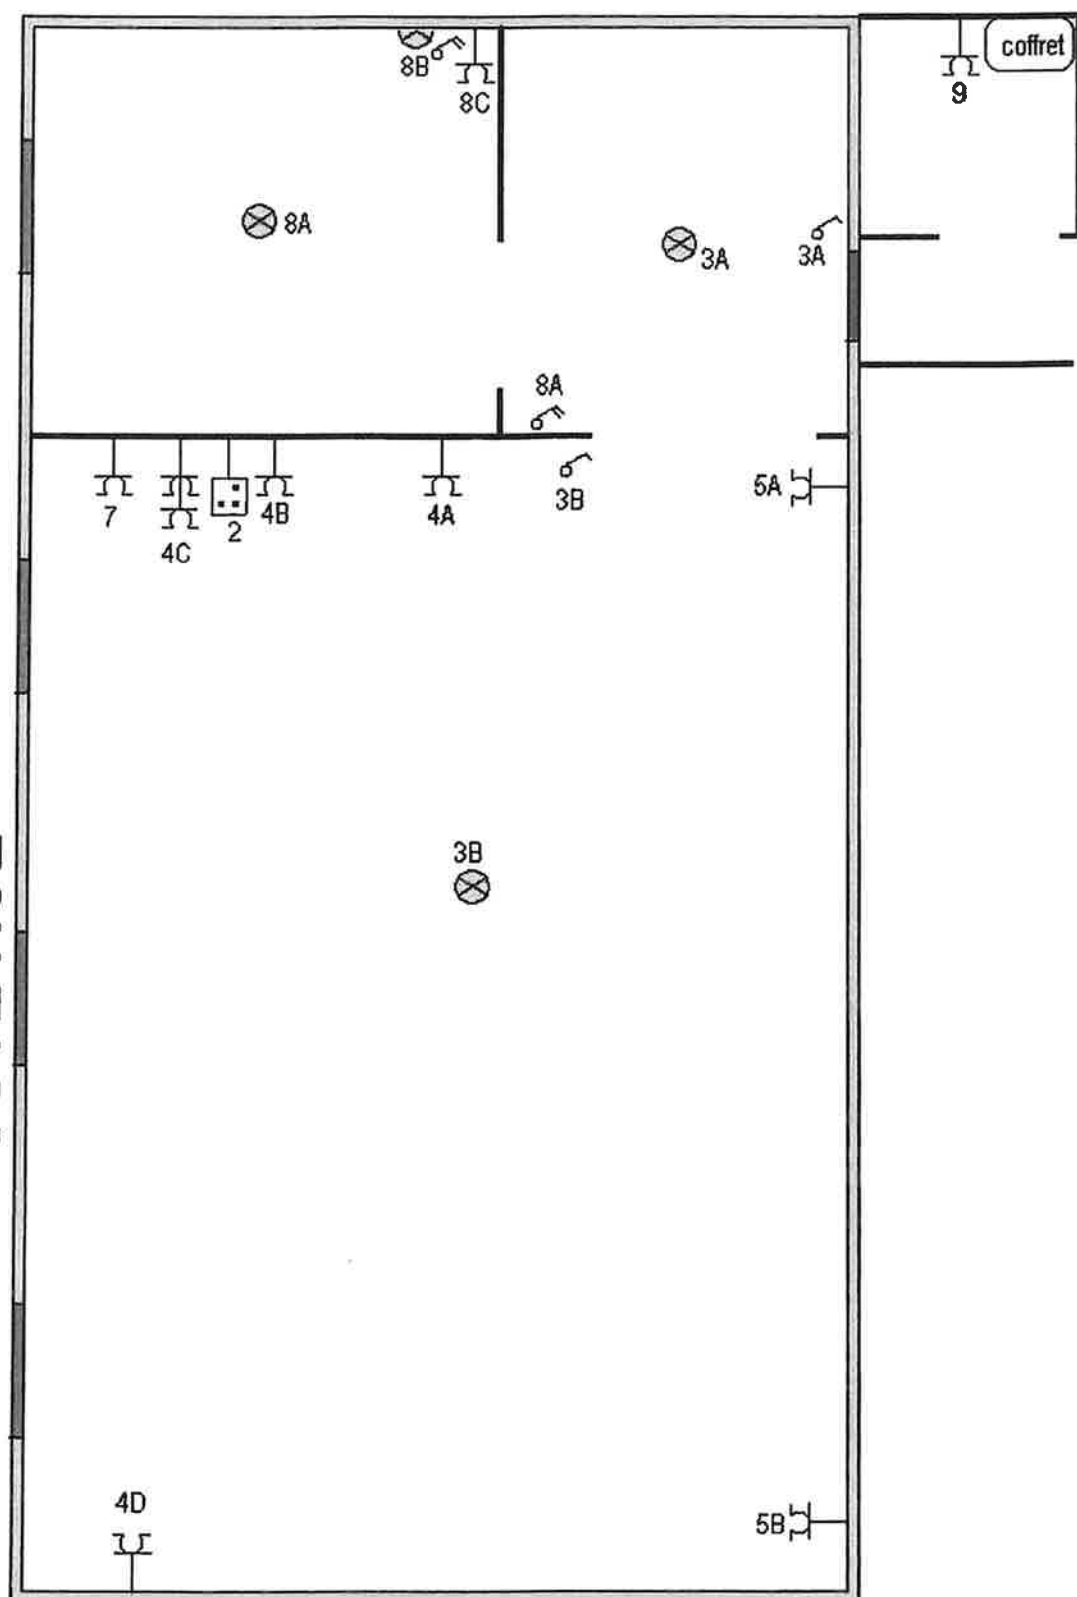



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : 32435438 F



F 110101

Rési code :

☐ Antwerpen-Limburg

tél : 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tél : 09 244 77 11

☐ Brabant

tél : 02 674 57 11

☒ Wallonie

tél : 081 432 611

10

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom :	Nom, Prénom : <u>App. G. Aveant J. Aveant</u>
N° carte d'identité :	Adresse : <u>11 Rue Ferdinand Henoux</u>
N° TVA : BE	CP + Commune : <u>9000 Lige</u>
	Tél. : <u>1 1 1 1 1 1 1 1</u>

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Unité de travail domestique
☒ Art 271	☐ périodique	☒ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ Parties communes
☐ Art 276 : renforcement	☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			☐ Art	☐ Art	☒ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° <u>688.271.73</u>	Index jour :	Index nuit :
	Protection branchement (A) : ☒ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	n° :	
Données installation	Conçue pour U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type de prise de terre :	
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ boucle de terre ☒ barres / piquets	
	Câble d'alimentation tableau principal : <u>4</u> X <u>12</u> mm ² - Type : <u>XUB</u>	☐	
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>63</u> A <u>1300</u> mA	Nombre de tableaux : <u>1+1</u>	Nombre de circuits terminaux : <u>7</u>
	<u>Schémas vu sur place</u>		
☐ Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indr.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ >/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>12.1</u> Ω		☒ Aisolement général : <u>7.7</u> MΩ		☒ Continuité de terre		☐ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation		
☒ Néant		
Infractions Installation existante		
☒ Néant		
Remarques	<u>Contrôle ok des parties visibles et accessibles de l'installation.</u>	Visa GRD ou mandataire :
☐ Néant		

Conclusion(s) :

☐ La nouvelle installation est conforme ☒ n'est pas conforme au RGIE.

☒ L'installation existante est conforme ☒ n'est pas conforme au RGIE.

Agent visiteur :

Nom : C. LEVER

Agent n° 2338

Date 16/11/2015

Annexe(s) : ☐ Schéma(s) de position :

☐ Schéma(s) unifilaire(s) :

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

16.11.2015 (*)

☐ par le même organisme de contrôle.


Pour le Directeur Général : Signature


- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

LIBELLE	SYMBOLE	ANNEXE
Interrupteur simple		PROPRIETAIRE Rue Fer HENAUX 11 4000 LIEGE Signature:
Interrupteur bipolaire		
Interrupteur unipolaire va-et-vient		
Interrupteur bipolaire va-et-vient		
Commutateur intermédiaire pour va-et-vient		
Commutateur unipolaire		
Dispositif de protection à courant Différentiel résiduel		Lieux des travaux: Rue Ferd Henaux 11 4000 LIEGE APPART 4 ét AVANT GAUCHE
Petit Disjoncteur de la taille de 22 Amps		
Sonnerie		
Appareil de chauffage		
Bouton poussoir		
Minuterie		
Télérupteur		ELECTRICIEN MEYEROLD J - P 0496/13.89.56 Signature:
Socle de prise de courant + Terre + protection		
Bloc autonome d'éclairage de sécurité		
Point lumineux		
Luminaire à fluorescence		
Transformateur		
Compteur		Controlé Le 16 / 11 / 2015 AIB VINCOTTE CLEVER Signature:
Chauffe eau électrique		
Cuisinière électrique		
Lessiveuse		
Sechoir		
Lave-vaisselle		
TENSION DE SERVICE = 220		N de Circuits : 7 Schéma (s) de position : 1 Schéma (s) Unifilaire (s) : 1
Observation N° compteur : 33496707 Code EAN :		

4 AVANT GAUCHE		COFFRET
01		DIFFERENTIEL 63 AMP 300 MA
02	Disjoncteur 32 amp	PLAQUE ELECTRIQUE
03	Disjoncteur 16 amp	ECL DEBARRAS & SEJOUR
04	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE CUISINE
05	Disjoncteur 16 amp	PRISE SEJOUR
06		DIFFERENTIEL 63 AMP 30 MA
07	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE S.D.B.
08	Disjoncteur 16 amp	PRISE DEBARRAS
09	Disjoncteur 16 amp	PRISE CUISINE

COFFRET ELECTRIQUE

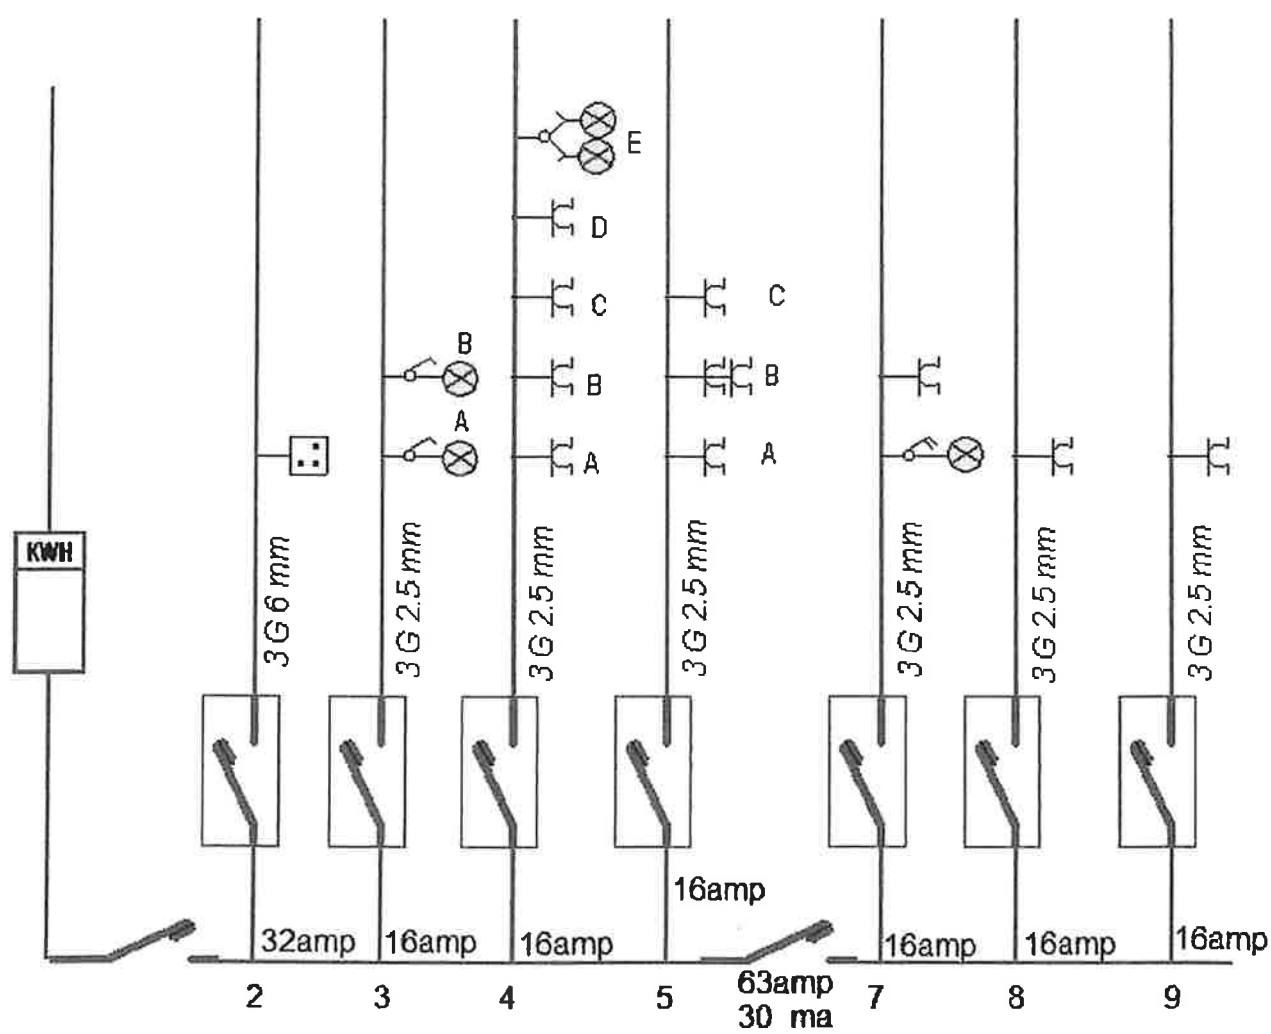

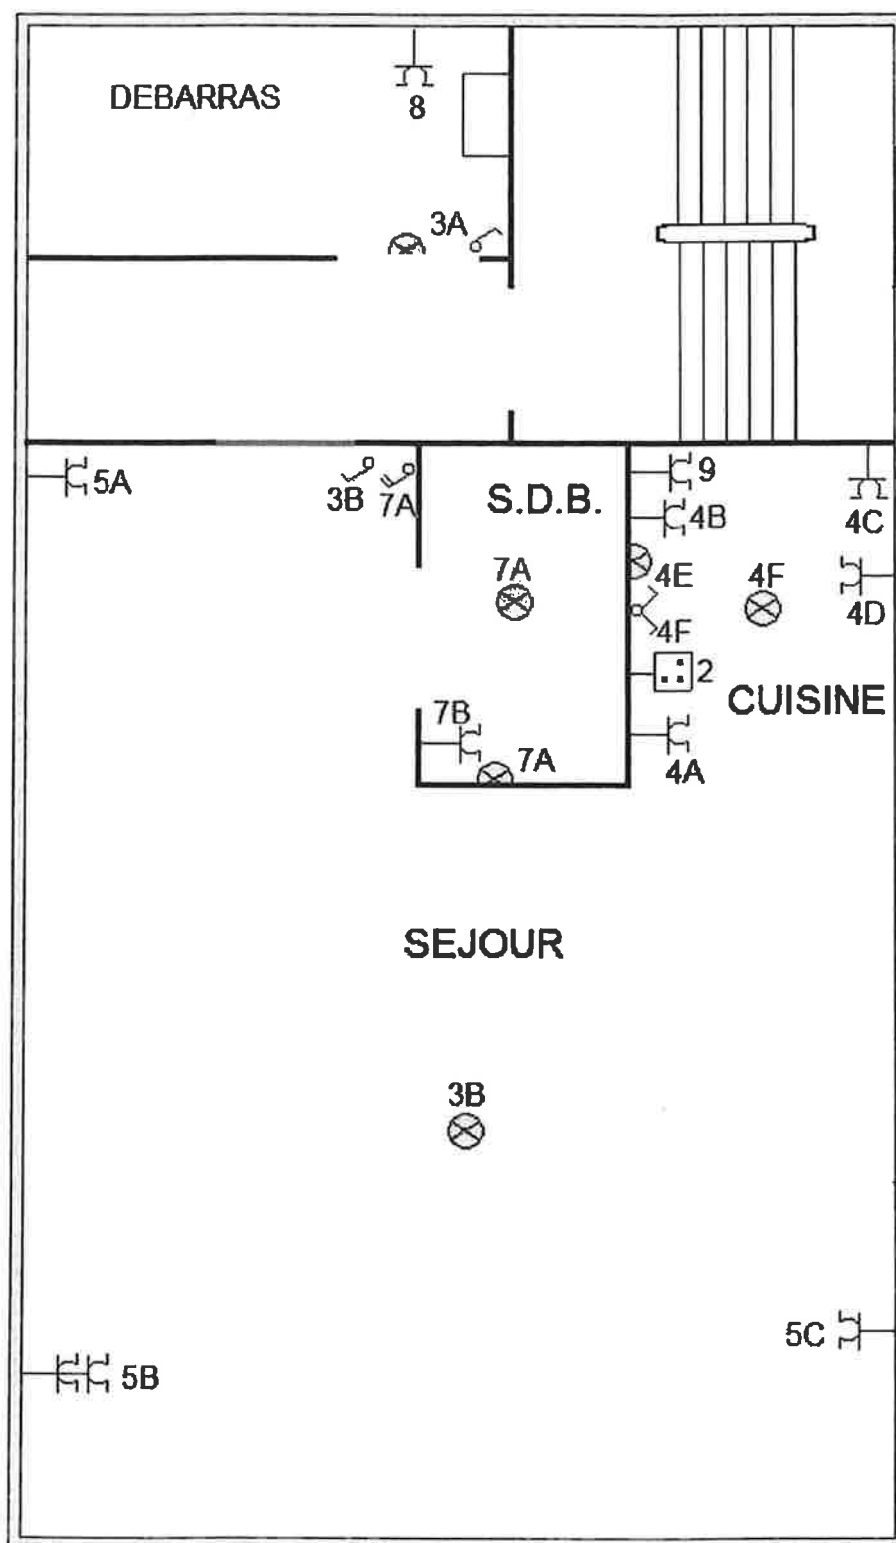



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : 304354306



F 110102

☐ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tél : 03 221 86 11
tél : 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen
☒ Wallonie

tél : 09 244 77 11
tél : 081 432 611

Rési code :

10

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom :	Nom, Prénom : App. 3ème Avant
N° carte d'identité :	Adresse : 11 Rue Ferdinand I leaux
N° TVA : BE	CP + Commune : 4000 Liège
	Tél. : 1

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
☐ Art 271	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Unité de travail domestique
☒ Art 271	☐ périodique	☒ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ Parties communes
☐ Art 276 : renforcement	☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			☐ Art	☐ Art	☐ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° 332.834.84	Index jour :	Index nuit :
	Protection branchement (A) : ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	n° :	Index nuit :
Données installation	Conçue pour U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type de prise de terre :	
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ boucle de terre	☒ barres / piquets
	Câble d'alimentation tableau principal : 4 X 10 mm² - Type : RUB	☐	
Description installation	Dispositif diff. gén. : G.3 A / 300 mA	Nombre de tableaux : 1+1	Nombre de circuits terminaux : 8
☐ Voir annexe(s)	Schémas vu sur place		

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ >/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre 12.1 Ω	☒ Aislement général : 7.1 MΩ	☒ Continuité de terre	☐ Test dispositif diff.				
Le dispositif différentiel général : ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation		
☒ Néant		
Infractions Installation existante		
☒ Néant		
Remarques	Contrôle ok, parties visibles et accessibles de l'installation	Visa GRD ou mandataire :
☐ Néant		

Conclusion(s) :

☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☒ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

16.1.1.2015 (*)

☐ par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : C. LEVAT

Agent n° 2335

Date : 16/11/2015

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : ☐ Schéma(s) de position :


☐ Schéma(s) unifilaire(s) :

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et de, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.


LIBELLE	SYMBOLE	ANNEXE
Interrupteur simple		PROPRIETAIRE Rue Fer HENAUX 11 4000 LIEGE Signature:
Interrupteur bipolaire		
Interrupteur unipolaire va-et-vient		
Interrupteur bipolaire va-et-vient		
Commutateur intermédiaire pour va-et-vient		
Commutateur unipolaire		
Dispositif de protection à courant Différentiel résiduel		Lieux des travaux: Rue Ferd Henaux 11 4000 LIEGE APPART 3et AVANT
Petit Disjoncteur de la taille de 22 Amps		
Sonnerie		
Appareil de chauffage		
Bouton poussoir		
Minuterie		ELECTRICIEN MEYFROND J - P 0496/13.89.56 Signature:
Télérupteur		
Socle de prise de courant + Terre + protection		
Bloc autonome d'éclairage de sécurité		
Point lumineux		
Luminaire à fluorescence		Controlé Le 16/11/2015 AIB VINCOTTE GLIVIER Signature:
Transformateur		
Compteur		
Chauffe eau électrique		
Cuisinière électrique		
Lessiveuse		N de Circuits : 8 Schéma (s) de position : 1 Schéma (s) Unifilaire (s) : 2
Sechoir		
Lave-vaisselle		
TENSION DE SERVICE = 220		
Observation N° compteur : 33283484 Code EAN :		


3 ét avant		COFFRET
01		DIFFERENTIEL 63 AMP 300 MA
02	Disjoncteur 32 amp	PLAQUE ELECTRIQUE
03	Disjoncteur 16 amp	ECL HALL & WC
04	Disjoncteur 16 amp	PRISE CUISINE - SEJOUR - CHAMBRE
05	Disjoncteur 16 amp	PRISE CUISINE - SEJOUR
06	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRIS SEJOUR - ECL CUISINE
07		DIFFERENTIEL 63 AMP 30 MA
08	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE S.D.B. - ECL & PRISE CHAMBRE
09	Disjoncteur 16 amp	PRISE CUISINE
10	Disjoncteur 16 amp	PRISE HALL

COFFRET ELECTRIQUE

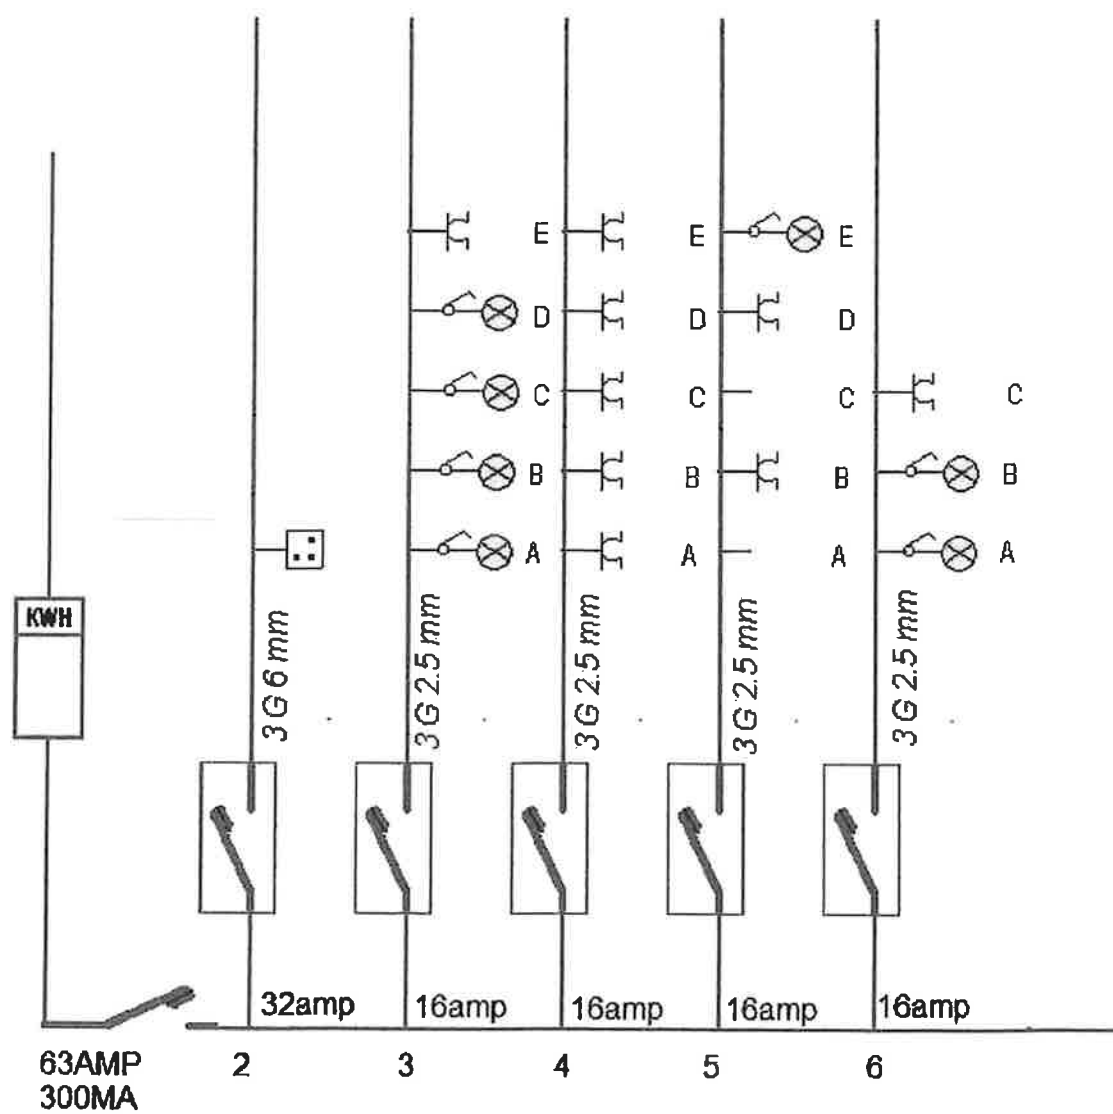

COFFRET ELECTRIQUE

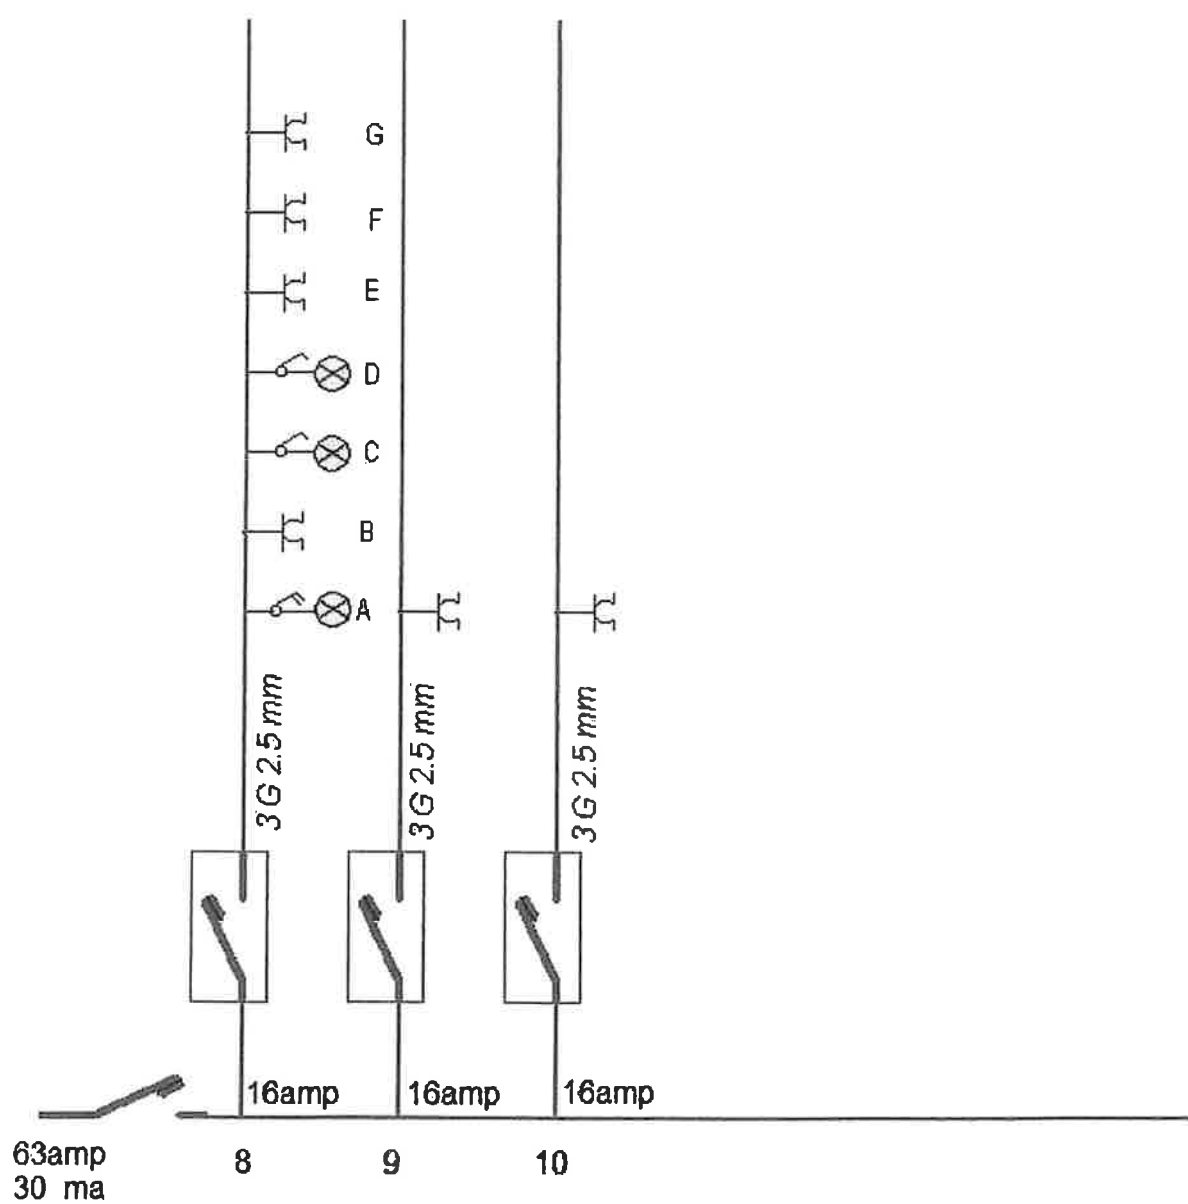

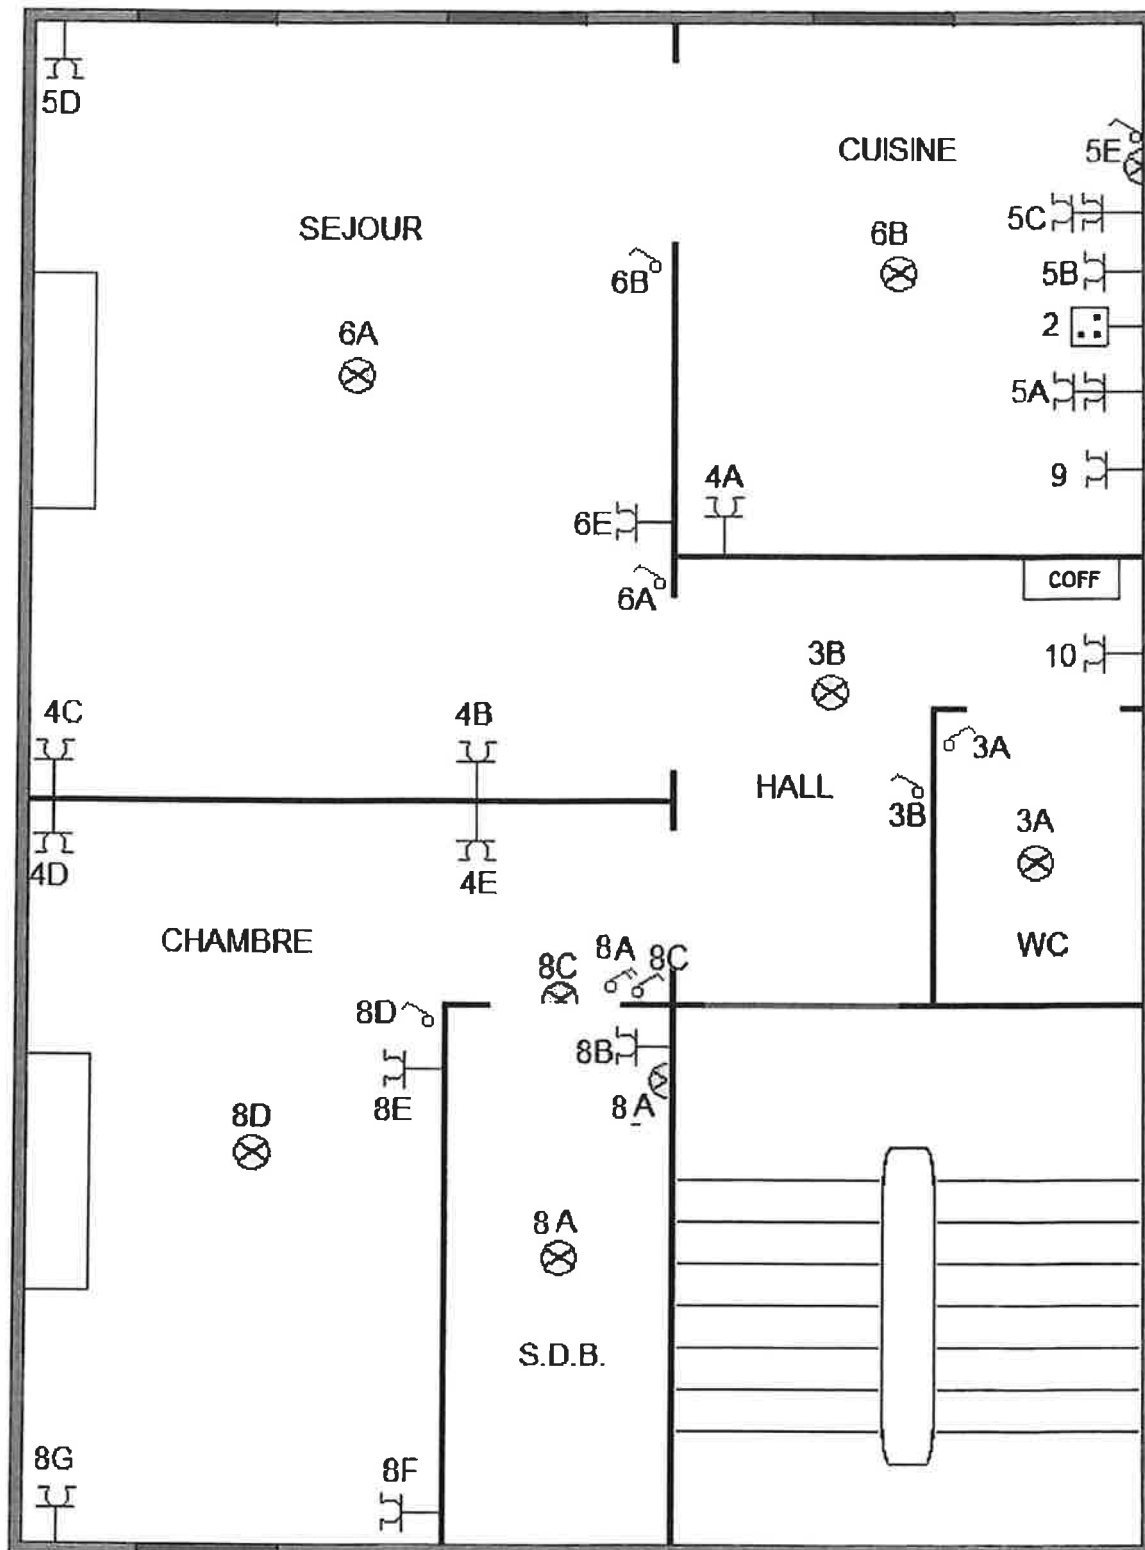



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : 30435438.H



F 110103

Rési code :

☐ Antwerpen-Limburg

tél : 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tél : 09 244 77 11

☐ Brabant

tél : 02 674 57 11

☒ Wallonie

tél : 081 432 611

10

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom :	Nom, Prénom : <u>Dep 2ème Avenue</u>
N° carte d'identité :	Adresse : <u>11 Rue Ferdinand Henoux</u>
N° TVA : BE	CP + Commune : <u>9000 Liège</u>
	Tél. : <u>1</u>

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Unité de travail domestique
☒ Art 271	☐ périodique	☒ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ Parties communes
☐ Art 276 : renforcement	☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation	☐ Art	☐ Art	☐ Art	☐ Art	☒ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	☐ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° : <u>68103542</u>	Index jour :	Index nuit :
	Protection branchement (A) : ☒ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ Compt. kWh exclusif nuit :	n° : Index nuit :
Données installation	Conçue pour U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type de prise de terre :	☐ boucle de terre ☒ barres / piquets
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100		☐
	Câble d'alimentation tableau principal : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>XUB</u>		
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>63</u> A <u>1300</u> mA	Nombre de tableaux : <u>1+1</u>	Nombre de circuits terminaux : <u>7</u>
☐ Voir annexe(s)	<u>Schémas en sur place</u>		

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ >/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre <u>12.1</u> Ω	☒ Isolement général : <u>7</u> MΩ	☒ Continuité de terre	☐ Test dispositif diff.				
Le dispositif différentiel général : ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	<u>/</u>
Infractions Installation existante	<u>/</u>
Remarques	<u>Contrôle des parties visibles et accessibles de l'installation.</u>
☐ Néant	Visa GRD ou mandataire :

Conclusion(s) :

☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

16.11.2015 (*)

☐ par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : CLAUVER

Agent n° 2338

Date 16.11.2015

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : ☐ Schéma(s) de position :

☐ Schéma(s) unifilaire(s) :

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

- LIBELLE -	SYMBOLE	ANNEXE
Interrupteur simple		PROPRIETAIRE Rue Fer HENAU 11 4000 LIEGE Signature:
Interrupteur bipolaire		
Interrupteur unipolaire va-et-vient		
Interrupteur bipolaire va-et-vient		
Commutateur intermédiaire pour va-et-vient		
Commutateur unipolaire		
Dispositif de protection à courant Différentiel résiduel		Lieux des travaux: Rue Ferd Henaux 11 4000 LIEGE APPART 2 ét AVANT
Petit Disjoncteur de la taille de 22 Amps		
Sonnerie		
Appareil de chauffage		
Bouton poussoir		
Minuterie		
Télérupteur		ELECTRICIEN <i>MAYFROND J - P</i> 0496/13.89.56 Signature:
Socle de prise de courant + Terre + protection		
Bloc autonome d'éclairage de sécurité		
Point lumineux		
Luminaire à fluorescence		
Transformateur		
Compteur		AIB VINCOTTE <i>GLEVER</i> Signature:
Chauffe eau électrique		
Cuisinière électrique		
Lessiveuse		
Sechoir		
Lave-vaisselle		
TENSION DE SERVICE = 220		N de Circuits : 7 Schéma (s) de position : 1 Schéma (s) Unifilaire (s) : 1
Observation N° compteur : 69103542 Code EAN :		

2 ét avant		COFFRET
01		DIFFERENTIEL 63 AMP 300 MA
02	Disjoncteur 32 amp	PLAQUE ELECTRIQUE
03	Disjoncteur 16 amp	ECL HALL
04	Disjoncteur 16 amp	PRISE CUISINE - SEJOUR
05	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRIS SEJOUR - CHAMBRE ECL CUISINE
06		DIFFERENTIEL 63 AMP 30 MA
07	Disjoncteur 16 amp	ECL & PRISE S.D.B.
08	Disjoncteur 16 amp	PRISE S.D.B.
09	Disjoncteur 16 amp	PRISE CUISINE

COFFRET ELECTRIQUE

