



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : P045880131



Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK - EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr. :	Aanvrager :
Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :
Naam, voornaam :	Eigenaar of beheerder :
Ident. Kaart nr. :	Naam, voornaam :
BTW nr.: BE 841501724	Adres : Reinpadstraat 21/B3
	Post nr. + Stad : 3600 GENK
	Tel. :

Basis van het onderzoek : ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐	
☐ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☒ Art 271 bis ☒ ① Wooneenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ ② Huishoudelijke werkeenheid
☒ Art 271 ☐ periodiek ☒ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art ☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwaaring ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	☐ Art ☐ Art ☐ ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN 5 4 1 4 4 9 2 0 6 0 0 5 9 5 5 1 1 3 ☒ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.: 33035108 meterstand dag : 22228 nacht : 33321 ☐ kWh excl. nacht meter : Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr. : meterstand : Ontworpen voor U _N : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400 V ☐ Type aardelektrode : Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ aardingslus ☒ pen / baar Voedingsleiding hoofdbord : 2 X 10 mm ² - Type : VOB ☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 13
☒ zie bijlage	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☒ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 25 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau : 3.12 MΩ ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting : ☐ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Visum DNB :
☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☒ Nihil	Aangestelde DNB : Naam :
Opmerkingen	Visum :
☐ Nihil	Betreft herkeuring na verkoop - verslag SGS

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie	☒ voldoet ☐ voldoet niet	aan het AREI.
☒ De bestaande installatie	☒ voldoet ☐ voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor:

02/04/2038(*)

☐ door hetzelfde erkend organisme (**).

(*) Termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker :

Naam : Winten Roel

Agent nr. 4588

Datum : 2/4/2013

Voor de directeur generaal : Handtekening

Aantal bijlagen : ☒ Situatieschema(s) : 1 ☒ Eéndraadsschema(s) : 3 ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

A. ISOLATIE

- 1101 De algemene isolatieweerstand voor de installatiedelen gebouwd vóór 24/06/2000 is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 25.000 Ohm (art. 20 AREI).
- 1104 De isolatieweerstand van deze ring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm (art. 20 AREI).

B. AARDING

- 1021 De aardgeleider dient stroomafwaarts van de hoofdaardingsklem aangesloten te worden en de beschermingsgeleider van toestellen en/of equipotentiale verbindingen stroomopwaarts.
- 1201 Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (art. 68 – 71 AREI).
- 1202 Afwezigheid van aardingslus onder de fundering. Een afwijking moet aangevraagd worden aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Bestuur Energie - North Gate III, Koning Albert II laan 16 – 1000 Brussel – tel.: 02277 70 78 – fax: 02777 52 05 (art. 86.01 AREI).
- 1203 De waarde van de spreidingsweerstand van de aarding dient kleiner te zijn dan 30 Ohm (art. 86.07 AREI).
- 1205 De waarde van de spreidingsweerstand is niet aangepast aan de gevoeligheid van de geplaatste differentieel-schakelaar (niet-huishoudelijk installatie) (art. 86.05 AREI).
- 1206 Aarding is verwezenlijkt door gebruik van water- en/of gasleidingen. Een aarding verwezenlijken conform de voorschriften (art. 68 – 71 AREI).
- 1208 Een aardgeleider (verbinding tussen aardelektroden en de hoofdaardingsklem) uitvoeren met een doorsnede van minstens 16 mm² adur uit koper (art. 71 AREI) met geel/groene isolatie (art. 139 AREI).
- 1209 De aansluiting van de equipotentiaal- en/of de beschermingsgeleiders is uit te voeren d.m.v. las- of klemverbinding (art. 70.04/05 AREI).
- 1210 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) dient aangebracht te worden in de aardgeleider teneinde de meting van de spreidingsweerstand mogelijk te maken (art. 28, 70.05 AREI).
- 1211 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) moet steeds gemakkelijk toegankelijk zijn (art. 15, 86.01 AREI).

C. EQUIPOTENTIAALVERBINDINGEN

- 1301 Een hoofd-equipotentiaalverbinding is te installeren en te verbinden (art. 72, 78.05 AREI).
- 1302 De aansluitingen van de hoofd-equipotentiaalverbindingen (water-, gasleiding, vertrek- en terugvoeding van verwarming) dienen volledig te worden (art. 72.01 AREI).
- 1303 Hoofd-equipotentiaalgeleider(s) met een doorsnede van min. 6 mm² met geel/groene isolatiekleur is (zijn) te voorzien (art. 72.02 AREI).
- 1304 Bijkomende equipotentiaalverbinding(en) in de badkamer of douche is (zijn) te installeren (art. 86, 10 AREI).
- 1305 De plaatsing van bijkomende equipotentiaalverbinding(en) in de badkamer of douche is (zijn) te vervolgden (art. 86, 10 AREI).
- 1306 Bijkomende equipotentiaalverbinding(en) verwezenlijken met geel/groene geleider(s), doorsnede minstens 4 mm² (of 2,5 mm² onder buis) (art. 73.02, 189 AREI).
- 1307 De doorsnede van de hoofd-equipotentiaalverbindingen dient aangepast te worden (art. 72.02 AREI).
- 1308 De continuïteit van de equipotentiaalverbindingen dient verzekerd te worden (art. 72.03, 73.03 AREI).
- 1309 De kleurcode werd niet nageleefd. Geleider met geel/groene isolatiekleur is te voorzien voor de equipotentiaalverbindingen (art. 72.03, 73.03 en 199 AREI).
- 1310 De doorsnede van de bijkomende plaatselijke equipotentiaalverbinding(en) dient aangepast te worden (art. 73.02 AREI).

D. DIFFERENTIEEL

- 1401 Een verzegelbare algemene differentieel-schakelaar dient geplaatst te worden aan het begin van de installatie (art. 86.07 AREI).
- 1402 Een algemene differentieel-schakelaar met een nominale stroom (In) van minstens 40 A en een gevoeligheid van maximum 300 mA dient geplaatst te worden (art. 86.07, 248.02 AREI).
- 1405 De nominale stroomsterkte van de differentieel-schakelaar dient aangepast te zijn aan de overstroombeveiliging (art. 85.02, 116 AREI).
- 1406 Een afzonderlijke differentieel-schakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor de installaties van badkamer(s) (art. 86.08 AREI).
- 1407 Een afzonderlijke differentieel-schakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor wasmachine, vaatwasmachine en/of droogkast en gelijkwaardige toestellen (art. 86.08 AREI).
- 1409 De algemene differentieel-schakelaar dient aan het begin van de installatie (onmiddellijk stroomafwaarts van kWh-teller) geplaatst te worden, teneinde de bescherming tegen onrechtstreekse aantrekking te verzekeren bij gebruik van leidingen van klasse (vb.: XFVB; VFVB; EXAVB; EVAVB) (art. 68, 86.07).

(") In het geval dat tijdens dit tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke installaties. U hebt de verplichting de Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongebruikelijk of onrechtstreeks of onrechtstreeks overkomen en rechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

E. SCHEMA'S

- 1501 Eendradesschema(s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI).
- 1502 Situatieschema(s) van de installatie is(zijn) te voorzien (art. 269 AREI).
- 1503 Eendradesschema(s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 16, 268- 269 AREI).
- 1504 Situatieschema(s) aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid (art. 269 AREI).
- 1505 De vermelding van de gegevens van de installateur, van de eigenaar en het adres van de installatie ontbreken op de schema's en plannen (art. 269 AREI).

F. ELEKTRISCH BORD

- 1051 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.
- 1052 Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.
- 1414 Bijkomende differentieel-schakelaar(s) met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen (waarde van de verspreidingsweerstand van de aarding Ra > 30 Ohm). Op de bestaande differentieelbeveiliging zijn twee of meer kringen met meer dan 16 contactdozen aangesloten (art. 86.07 AREI).
- 1505 Minstens twee stroomkringen voor de verlichting te voorzien (art. 86.06 AREI).
- 1601 Het schakelbord op ongeveer 1,50 m boven de vloer plaatsen (art. 248.03 AREI).
- 1602 De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren (art. 248.03 AREI).
- 1603 Het schakelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aantrekking is onvoldoende (art. 248.01 AREI).
- 1604 Het verdeelbord is te voorzien van een actiewand (art. 248.01 AREI).
- 1605 Deur of afschermplaat van het schakelbord (tenig)plaatsen. Aantrekking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk (art. 19, 48.01 en 248 AREI).
- 1606 De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (art. 19, 48.01 AREI).
- 1607 De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden (art. 19, 49.01 en 248 AREI).

- 1608 Een algemene alpolige scheidingsschakelaar te voorzien (art. 248.02 AREI).
- 1610 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (art. 16, 252 AREI).
- 1611 De aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's (art. 16, 268 AREI).
- 1612 Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant (art. 9, 252 AREI).
- 1702 In meerderes kringen is de smeltveiligheid of éénpolige automaat in de nulgeleider te verwijderen of is de beveiliging van de betrokken kringen te vervangen door alpolige automaten (art. 133 AREI).
- 1703 De stroomkring(en) moet(en) zo uitgevoerd worden dat hij (zij) niet ongewild door andere stroombanen gevoed kan (kunnen) worden. De kringen aangesloten op meerdere stroombanen zijn te scheiden (art. 13.01 AREI).
- 1704 De smeltveiligheidshouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van kalibratie-elementen (art. 231.01 AREI).
- 1706 De overbrugde zekering(en) moet(en) vervangen worden (art. 265 AREI).
- 1707 De overbrugde automa(e)l(en) moet(en) vervangen worden (art. 265 AREI).
- 1708 De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de teelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art. 116, 117, 118 AREI).

- 1709 De leidingen waarvan de doorsnede van de geleider 1 mm² bedraagt, moeten door smeltveiligheden met een nominale stroomsterkte (In) van maximum 6A of automaten van maximum 10A beschermd worden (art. 278.05 AREI).
- 1805 De leidingen waarvan de doorsnede van de geleiders minder dan 1 mm² bedraagt, moeten verwijderd of vervangen worden of voorzien te worden van een afdoende beveiliging voor de betrokken toepassing (art. 278.05 AREI).

- 1806 De stroomkring(en) voor de contactdozen moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm², de minimale doorsnede van 1,5 mm² is enkel toegelaten voor stroombanen die geen contactdozen bevatten (vb. stroombanen enkel voor verlichting) (art. 198 AREI).

- 1807 Gemengde stroomkring(en) - verlichting en contactdo(o)s(zen) moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm² (art. 198 AREI).

- 1808 "De stroomkring (en) voor de aansluiting van elektrische fornuizen, washuizen en wasmachines moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 6 mm² voor éénpolige of 4 mm² voor drielaagse kringen. Een afwijking hierop is mogelijk mits het gebruik van een minimale doorsnede van 2,5 mm² en indien minstens wordt voldaan aan één van de drie onderstaande voorwaarden:
- ofwel de geleiders installeren in een buis met een diameter van minstens één duim (1") (25 mm);
 - ofwel een reservebuis installeren die uitkomt in de nabijheid van een voedingspunt;
 - ofwel kabel voorzien gemonteerd in opbouw (art. 198 AREI)."

G. DE BESCHERMINGSGELEIDER

- 1214 De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen (art. 70.06, 86.02, 86.04 – AREI).
- 1215 Beschermingsgeleider(s) (PE) is (zijn) te voorzien in een doorsnede van minstens 4 mm² (aansluitende geel/groen) indien niet mechanisch beschermd of met een doorsnede van minstens 2,5 mm² (aansluitende geel/groen) onder buis (art. 70.02 AREI).
- 1216 De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden (art. 70.05 AREI).
- 1218 Contactdo(o)s(zen): de aardingsspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie (art. 86.03 AREI).
- 1219 Het verbruikstoestel met geleidend omhulsel en enkel basisisolatie (klasse I) moet d.m.v. een beschermingsgeleider (PE- met geel/groene isolatiekleur) aangesloten worden op het aardingsnet (art. 30.07, 70.06 AREI).

H. DE KLEURCODE EN LEIDINGEN

- 1081 Wij raden u aan de niet gebruikte leidingen te verwijderen.
- 1083 De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden isoleren.
- 1801 Vervang de geel/groene geleider geleider gebruikt als actieve geleider (art. 199 AREI).
- 1802 Wanneer er een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de "nulgeleider" gereserveerd worden indien deze aanwezig is in de betrokken stroomkring (art. 199 AREI).
- 1809 De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (art. 143, 209 AREI).
- 1810 De niet-gepantserde kabel(s) moeten mechanisch beschermd worden waar ze aan beschadiging of schokken blootgesteld zijn (doorgang van muren, plafonds, enz.) (art. 201, 209 AREI).
- 1811 De kabels van het type XVb, VVb en/of CVGVB moeten mechanisch beschermd worden op de aan beschadiging blootgestelde plaatsen tot op minimale hoogte van 10 cm boven het vloerniveau (art. 201 AREI).
- 1813 De aanbevolen trajecten in de muren van de lokalen moeten in acht genomen worden bij het inbouwen van niet-in buis geplaatste kabels van het type XVb- of VVb (art. 214.02 AREI).
- 1815 De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizenkabelgoelen geïnstalleerd worden (art. 207, 210 AREI).
- 1818 De elektrische leidingen op voldoende afstand van alle andere niet elektrische leidingen installeren (art. 202 AREI).
- 1819 Het gebruik van contactstop(pen) (stakkers) is enkel toegelaten bij aansluiting van snoeren op de vaste installatie (art. 240 AREI).

I. TOESTELLEN

- 1091 Schakelaar, contactdoos of afkadoos herschikken en/of opnieuw bevestigen.
- 1822 De verbindingen verwezenlijken in verbindingsof -afkadozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtings toestellen (art. 207.07 AREI).
- 1902 Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider (art. 230.02 AREI).
- 1903 De schakelaar die een stopcontact met een nominale stroomsterkte groter dan 16 A bedient moet alle actieve geleiders onderbreken (art. 250 AREI).
- 1904 De schakelaars en de contactdozen die in de wanden ingebouwd zijn, moeten in aangepaste inwerkdelen of blokken geplaatst zijn (art. 249.01, 250.03 AREI).
- 1906 Contactdozen, conform NBN C61-112, met kinderbeveiliging en aardingscontact plaatsen (art. 11, 49.02, 86.03 AREI).
- 1907 Plaats de op een wand bevestigde contactdozen op een voldoende hoogte ten opzichte van het vloerniveau, met de as van uitstaping op een hoogte van minstens 25 cm in vochtige lokalen en 15 cm in droge lokalen (art. 249.01 AREI).
- 1908 Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden (art. 19 AREI).
- 1909 Gebruik materiaal met een beschermingsgraad die minstens IP4X (IPXX-D) is (art. 19, 49.01 AREI).
- 1911 De beschermingsgraad (IP) van het elektrisch materiaal dat in de badkamer geplaatst is, moet aangepast zijn aan het volume waarin dit geïnstalleerd is (art. 19 en art. 86.10 AREI).
- 1914 De toestellen zonder aardingsmogelijkheid en enkel basisisolatie zijn niet toegelaten voor gebruik in huishoudelijke en gelijkwaardige installaties (Klasse 0: art. 30.07 a, 86.04 AREI).
- 1915 De vast opgestelde elektrische verwarmings toestellen zijn niet geïnstalleerd (art. 270 AREI).
- 1916 De gegevens van het toestel of de machine zijn onbekendbaar of onvolledig; gelieve ons de nodige informatie te bezorgen teneinde veiligheidsmaatregelen te onderzoeken (art. 5 - 7 AREI).
- 1917 De trafo's is (zijn) niet van het type "veiligheidsratio": de installatie die aangesloten is aan de secundaire van de betrokken trafo(s) dient aldus uitgevoerd te worden volgens de voorschriften die van toepassing zijn voor laagspanningsinstallaties (art. 28, 32 AREI).

J. BRANDBEVEILIGING

- 1712 Een overstroombeveiliging aanbrengen in de secundaire ring van de transfo (art. 116, 127 AREI).
- 1921 De transformator(en) geplaatst in een omgevings temperatuur die de toegelaten waarde overschrijdt dient(t)en) verplaatst te worden of de afkoelingsvoorwaarden zijn te verbeteren (art. 104.03, 252 AREI).
- 1922 Het toestel in de nabijheid van brandbare materialen dient verplaatst te worden; brandgevaar (art. 104 AREI).
- 1925 Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (schakelaar, contactdoos, verlichtingstoestel,...) (art. 104, 242, 249 AREI)

Register nr: Zegel nr:
 ADRES INSTALLATIE: Reinpaadstraat 21/3
 EIGENAAR (Naam - Voornaam): 3600 Genu
 Adres: Paekebloedstraat 6 Genu
 OPDRACHTGEVER: Ede
 Adres:
 INSTALLATEUR:
 Adres:
 BTW of IK:

DNB: Infra Teller nr: 33035108 Index: 177857 EAN Code: 1

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A6622 Isolatiemeter SGS nr: A6622 Continuïteitsmeter SGS nr: A1016
 Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102
 Controledatum: 03/12/2003 (AREI art.87/86) TEC EE 211-212
 Aard van onderzoek: ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (ARAB art.262) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)
 Aard van installatie: bestaande ~~nieuwe~~ uitbreiding ~~wijziging~~ ~~voorlopig~~ ~~werf~~ /
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkzaamheid, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere:
 Bouwjaar: fundering na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór - na 1.10.81 - BA4/BAS - ja / nee
 Aansluiting: spanning: 120V V AC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: A - voorzien: A
 Voedingskabel hoofdbord: x mm², type: UBS; Algemene schakelaar: 4p40 A, type: ADSI 300mA
 Type van de aardelektrode: lus ~~barra~~ ~~pennen~~ ~~horizontale geleider~~
 Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 6; Ra = Ω ; Ri tot Ω 210 M Ω

BESCHRIJVING: ☒ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overschroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Bestaat er een ~~badkamer~~ ~~wasmachine~~ ~~wasruimte~~ ~~afwasmachine~~ ~~droogkast~~ ~~boiler~~ ~~douchekamer~~: nee
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja ~~nee~~
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja ~~nee~~
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Staat van het elektrisch materiaal: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Vast of vast opgesteld materieel: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~

INBREUKEN - OPMERKINGEN :

geen schema's aanwezig
kleine doorverbindingen voorzien in doornet i.p.v. 4mm²
afwezig keurplaat voorzien in elch. bord

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde

BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

☐ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI is - was verzegeld. De schema's, aarddraads en -circuit, zijn nagzien en door de twee - drie betrokken personen onderkend.

☒ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).

☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor

☒ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR:

Nr + naam + handtekening

Thierry Temmerman
TEB

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:

Inspecteur gezien op vermelde datum

Ede

Blad LS nr **126191**

VISUM VAN DNB:

DATUM:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SSB_BLEET10.11N-25/11/08

SGS Statutory Services Belgium VZW
 Zetel


Internationalelaan, 55/D
 Grote baan, 76/1
 SGS House, Noorderlaan, 87

1070 Brussel
 3530 Houthalen
 2030 Antwerpen

t +32 (0)2 411 60 35
 t +32 (0)11 80 61 76
 t +32 (0)3 545 48 88

f +32 (0)2 411 38 70
 f +32 (0)11 80 61 75
 f +32 (0)3 545 48 89

e sgs.brussels.sgsbn@sgs.com
 e sgs.houthalen.sgsbn@sgs.com
 e sgs.antwerp.sgsbn@sgs.com

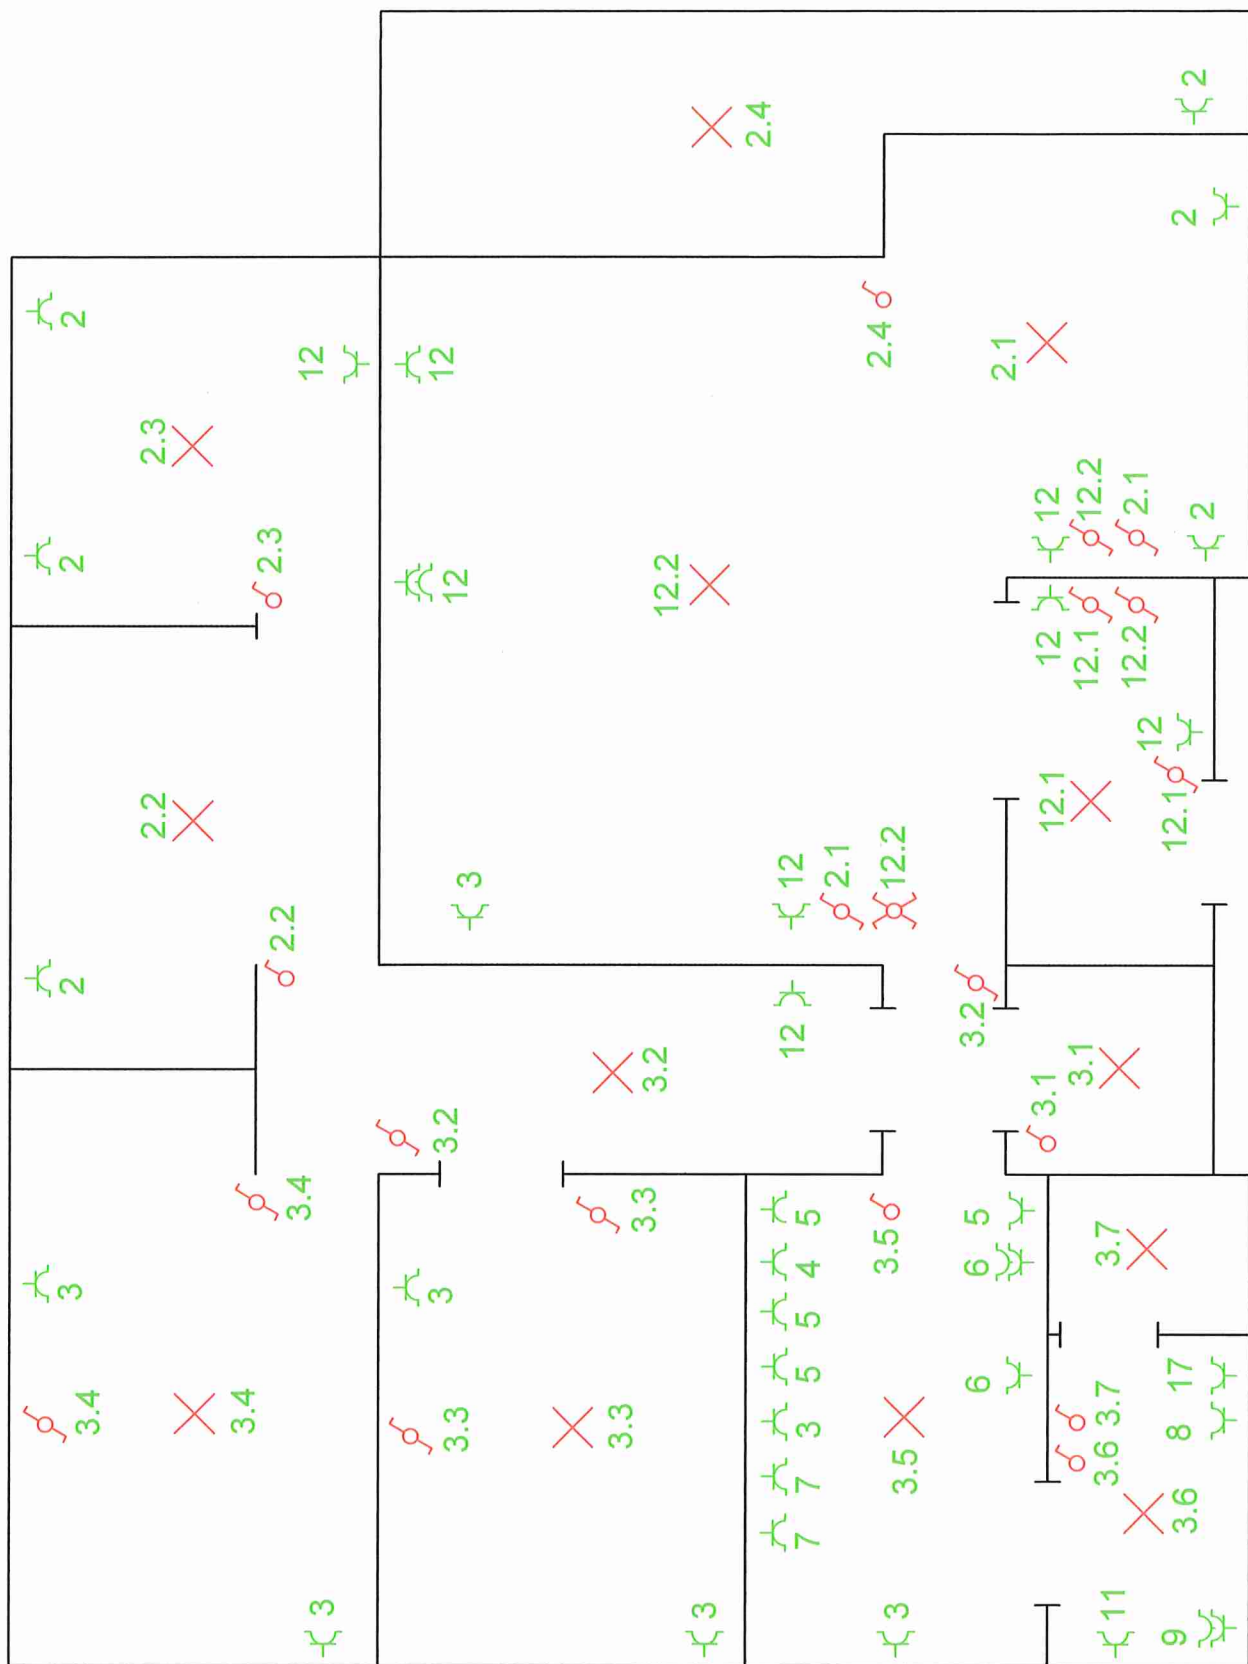

Unclear
Real Winter
2/1/2013

