

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV West-Vlaanderen, Jan Breydelstraat 98, 8530 HARELBEKE
T: 056 70 54 05, E: btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0371-170609-02 Datum van het onderzoek : 09/06/2017
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

<p>ADRES INSTALLATIE : / SPAARZAAMHEIDSTRAAT 89 8400 OOSTENDE</p> <p>EIGENAAR : / Adres : SPAARZAAMHEIDSTRAAT 89 8400 OOSTENDE</p> <p>OPDRACHTGEVER : DE OOSTENDSE HAARD Adres : NIEUWPOORTSESTEENWEG 205 8400 OOSTENDE</p> <p>INSTALLATEUR : DE OOSTENDSE HAARD Adres : NIEUWPOORTSESTEENWEG 205 8400 OOSTENDE</p> <p>BTW of IK : 0405277282</p> <p>EAN :</p>	<p>Visualisatie van de installatie</p> 
<p>Teller nr.</p>	<p>Index :</p>

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

<p>Aard installatie : Nieuwe Installatie / Wijziging /</p> <p>Begin werken fundering: Voor 01/10/81</p> <p>Aansluiting spanning : Mono 230V</p> <p>Voedingskabel hoofdbord : 2 x 10 mm²</p> <p>Type van de aardelektrode: Baren</p> <p>Aantal borden : 1</p> <p>Uitwendige invloedsfactoren :</p>	<p>Type der Lokalen : wooneenheid</p> <p>Elektrische installatie : Na 01/10/81</p> <p>AREI art. : 86</p> <p>Bescherming van de aansluiting : 40 A</p> <p>Alg. schakelaar: type : 2p 63A/300mA</p> <p>Aantal eindstroombanen : 9</p> <p>Schema : TT</p>
--	--

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270, AREI art. 271,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek en Controle bezoek

METINGEN:

RA: 6,67 Ohm RI tot >0,50 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.

Besluit De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09/06/42 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0371 ISAI BOERJAN

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)


- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstrom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

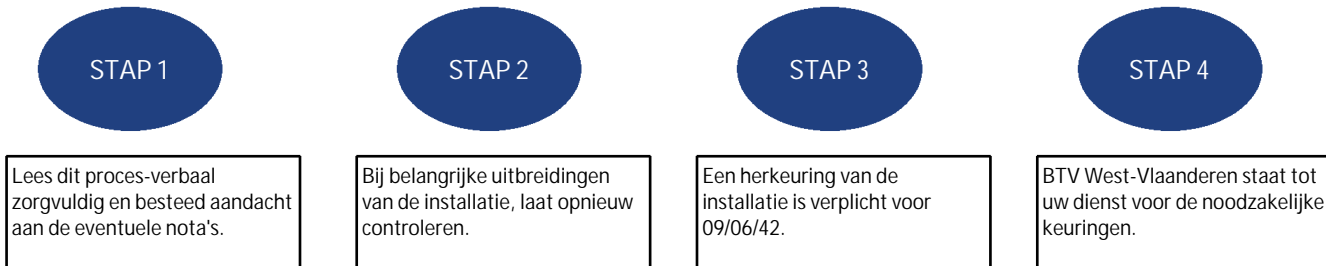

Schema's

