

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/06/2020 **Inspecteur:** Michael Schnurrer **Mentor:** **Installateur:** D&L Renovatiewerken GCV
ID-label: App. nr 53 2e verdieping **B.T.W. nr.:** BE 686 958 354 **Klantreferentie:** **IK. nr.:**

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 Serie Nr.: 18460193

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 356081

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kleidallaan
Huisnummer 53
Busnummer 3
Postcode 2620
Gemeente Hemiksem
Land België

Naam contactpersoon David Sleeckx
Telefoon 0475569212
Gsm nr. (SMS)

Type : appartement

EAN : 54

Eigenaar

Naam Remery
Straatnaam Kleidallaan
Huisnummer 53
Busnummer 3
Postcode 2620
Gemeente Hemiksem
Land België

Installateur

Naam D&L Renovatiewerken GCV
BTW nr. BE 686 958 354
Telefoonnummer 0475569212
E-mail david.sleeckx1@telenet.be

Teller Nr.: : 43'031'969

Aard onderzoek:

Herkeuring van huishoudelijke installaties van voor 1981 die bij het gelijkvormigheids- onderzoek of het controlebezoek in overtreding zijn met de voorschriften volgens AREI boek 1 hoofdstuk 9.1.3.2. en 8.2.1. en 4.2.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 2 Aantal kringen: 9 Isolatie: 13,52 M Ω

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 18,44 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

| I_{Δ} (mA) | I_n (A) | I_n - andere (A) | $I_{\Delta t}$ | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|-------------------|-----------|--------------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300 | 40 | | 22,5kA2s (3000A) | A | 9 | OK | OK |
| 30 | 40 | | 22,5kA2s (3000A) | A | 4 | OK | OK |
| 300 | 40 | | 22,5kA2s (3000A) | A | 8 | OK | OK |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm ²) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|---------------------------|
| 1 | C | 25 | | 4 | - |
| 1 | C | 20 | | 4 | - |
| 3 | C | 16 | | 2 | - |
| 4 | C | 20 | | 2 | - |

Visueel nazicht (algemeen) OK NOK **Directe aanraking** OK NOK **Indirecte aanraking** OK NOK
Aansluitingen OK NOK **Correcte schema's** OK NOK **schema in bijlage door Aceg vzw**

Equipotentiale verbindingen OK NOK niet van toepassing in afwachting

Continuïteit OK NOK **Verlichting / toestellen** OK NOK NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O28 Volgens AREI boek 1 8.1.2. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 10/6/2045

De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum: 10/6/2021

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 10

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michael Schnurrer



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie - algemene directie energie, afdeling gas - elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031


Stappenplan voor een installatie die conform is

| Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 |
|--|---|---|---|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/6/2045 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |


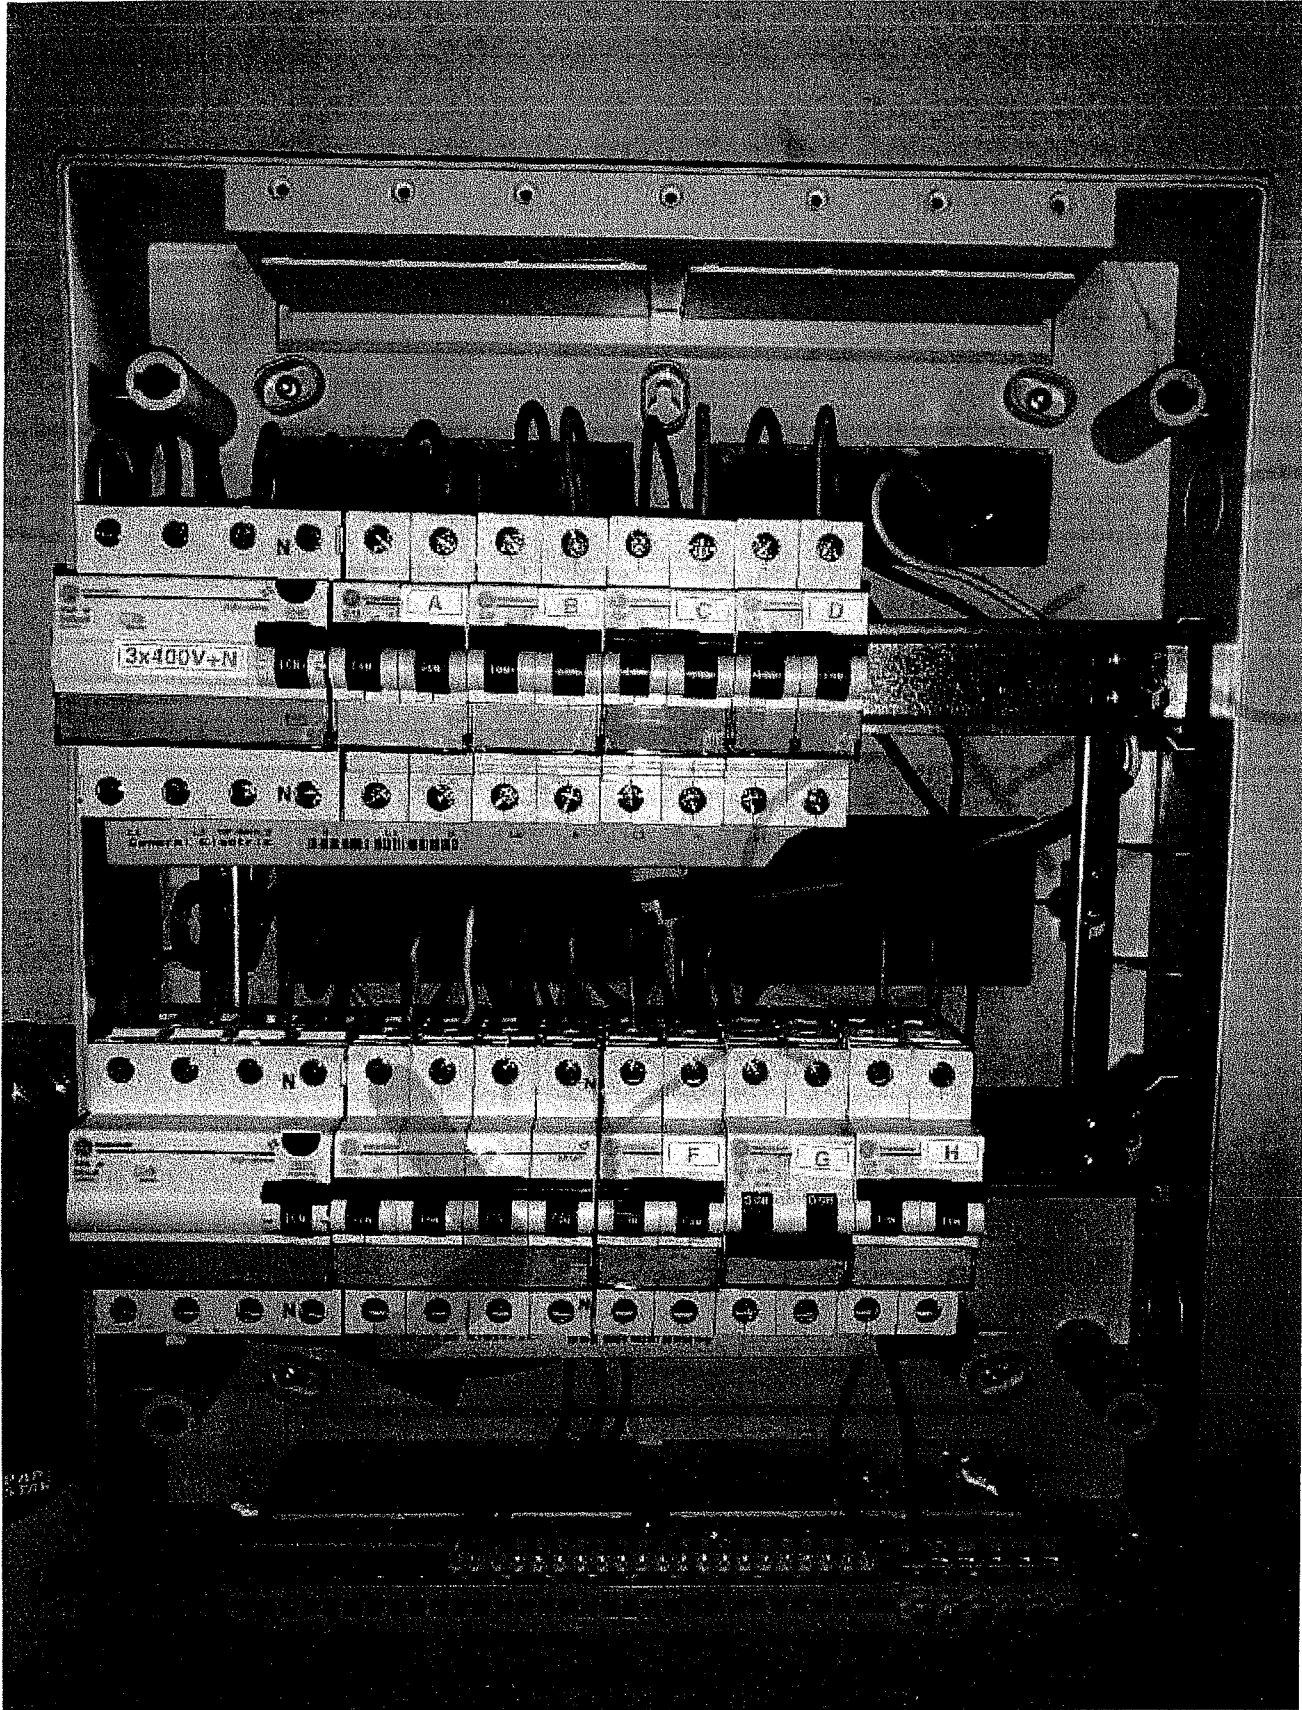


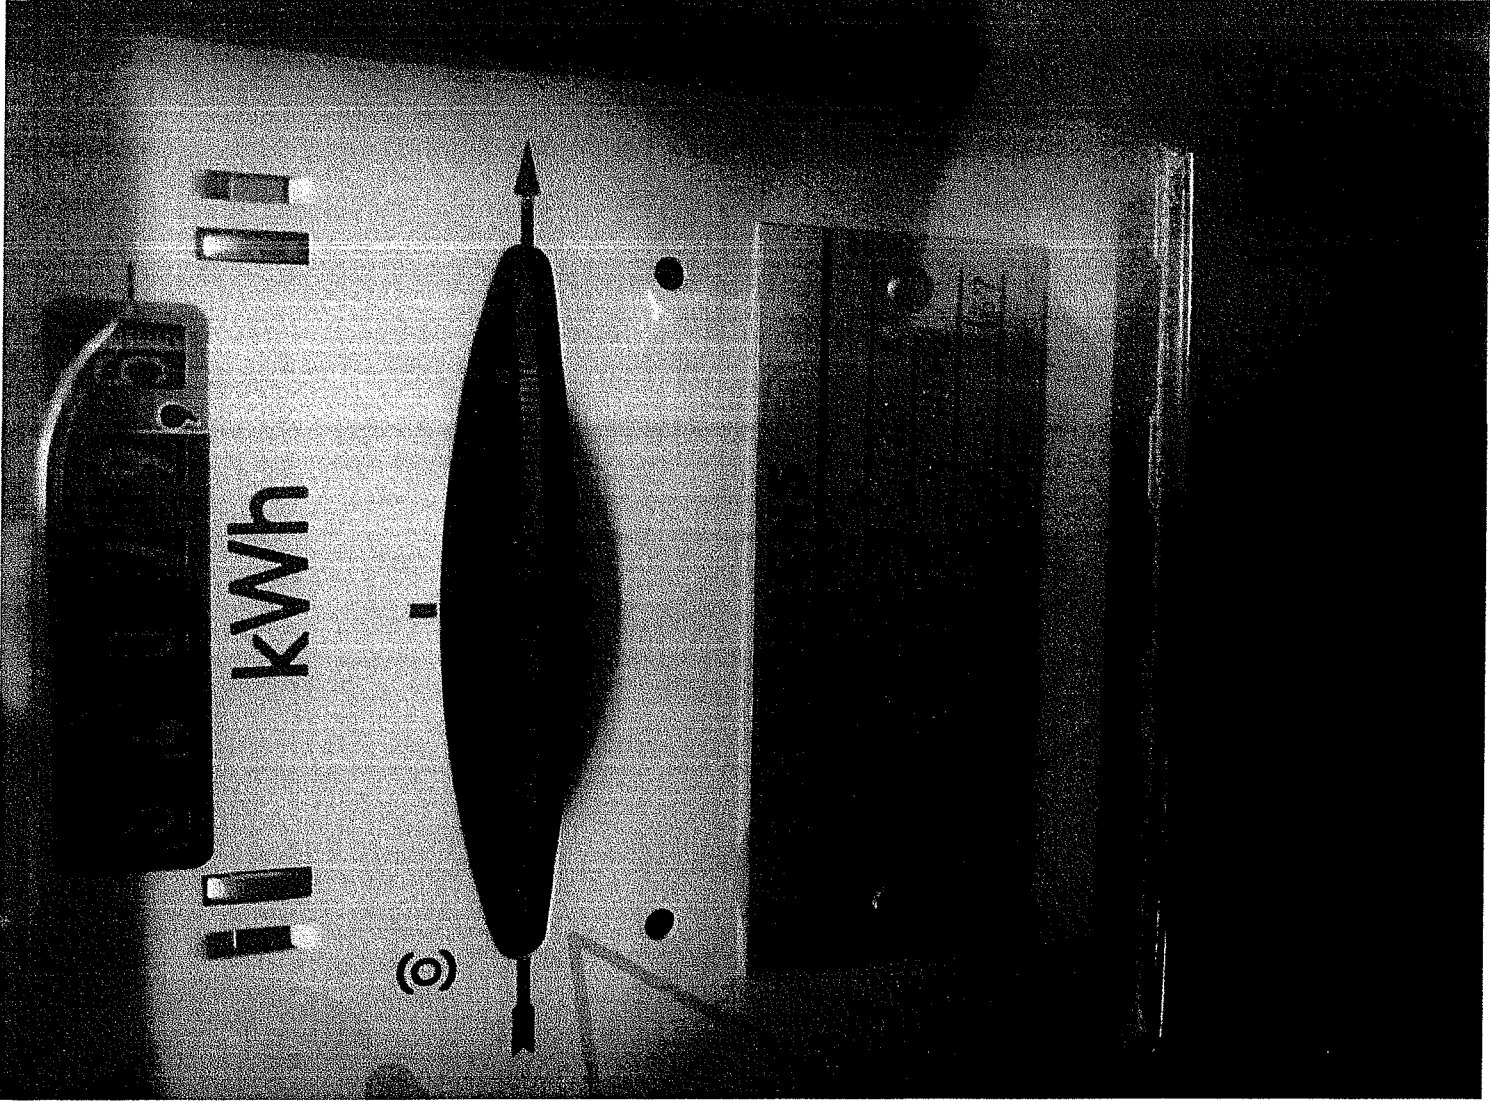

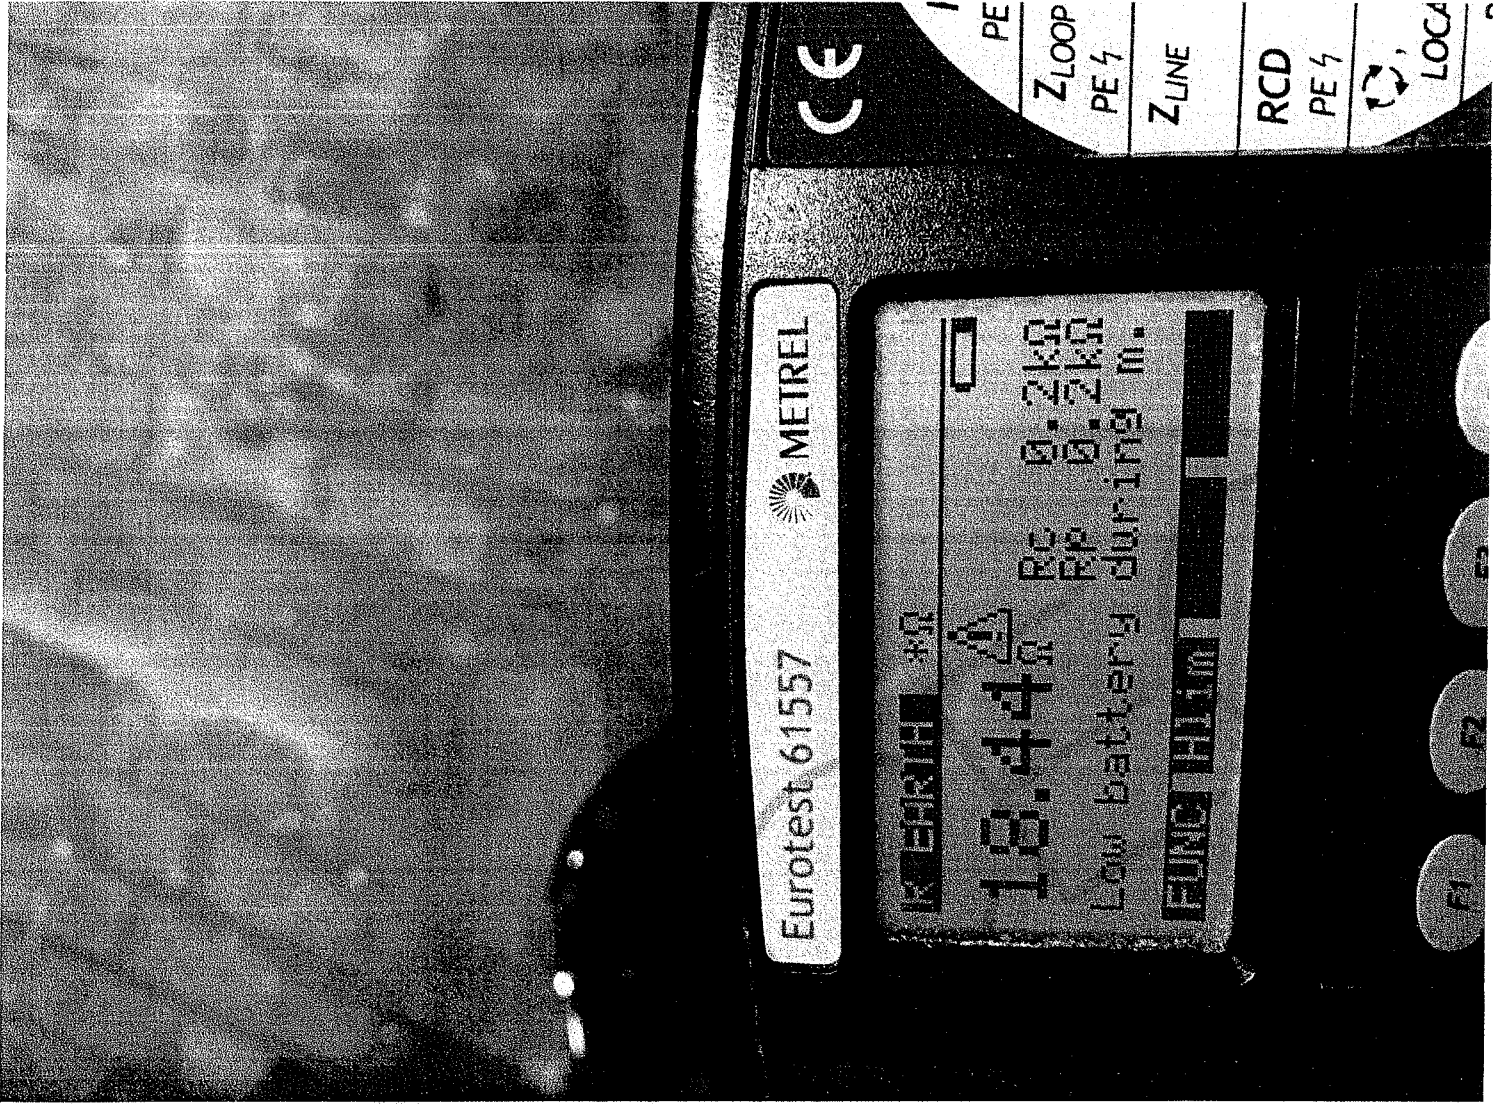

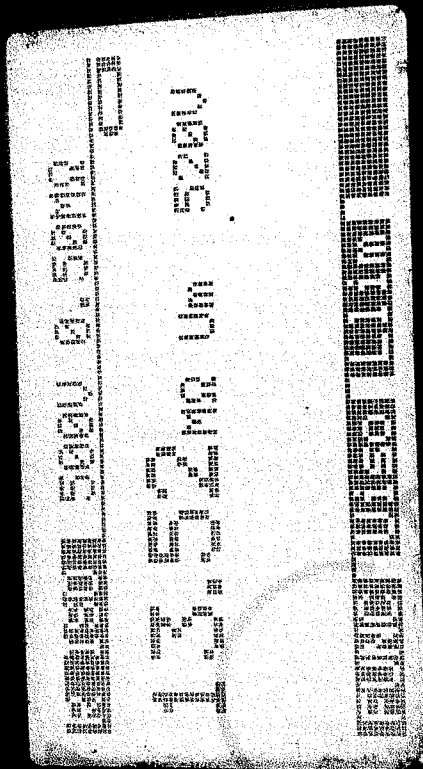



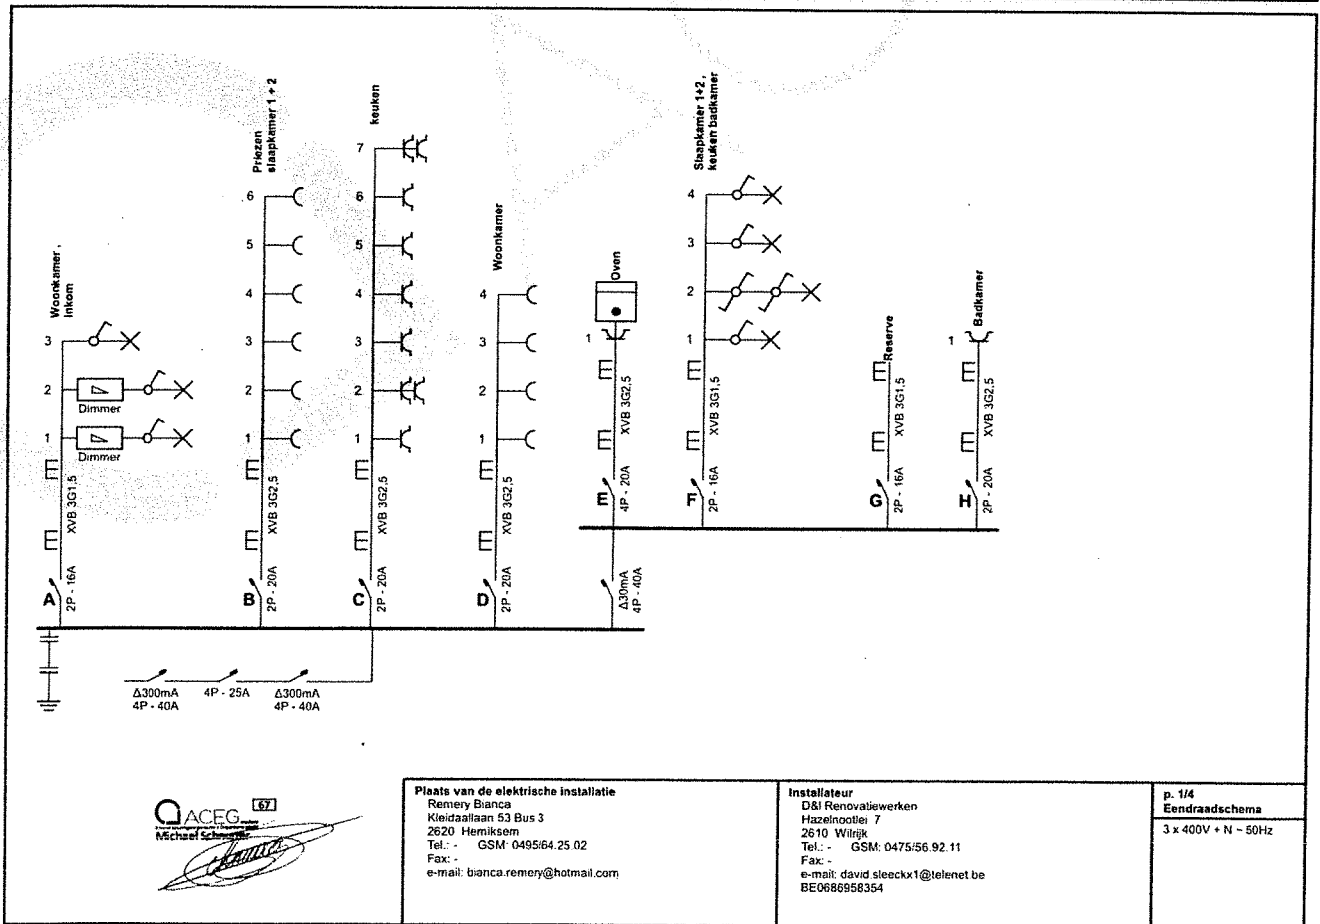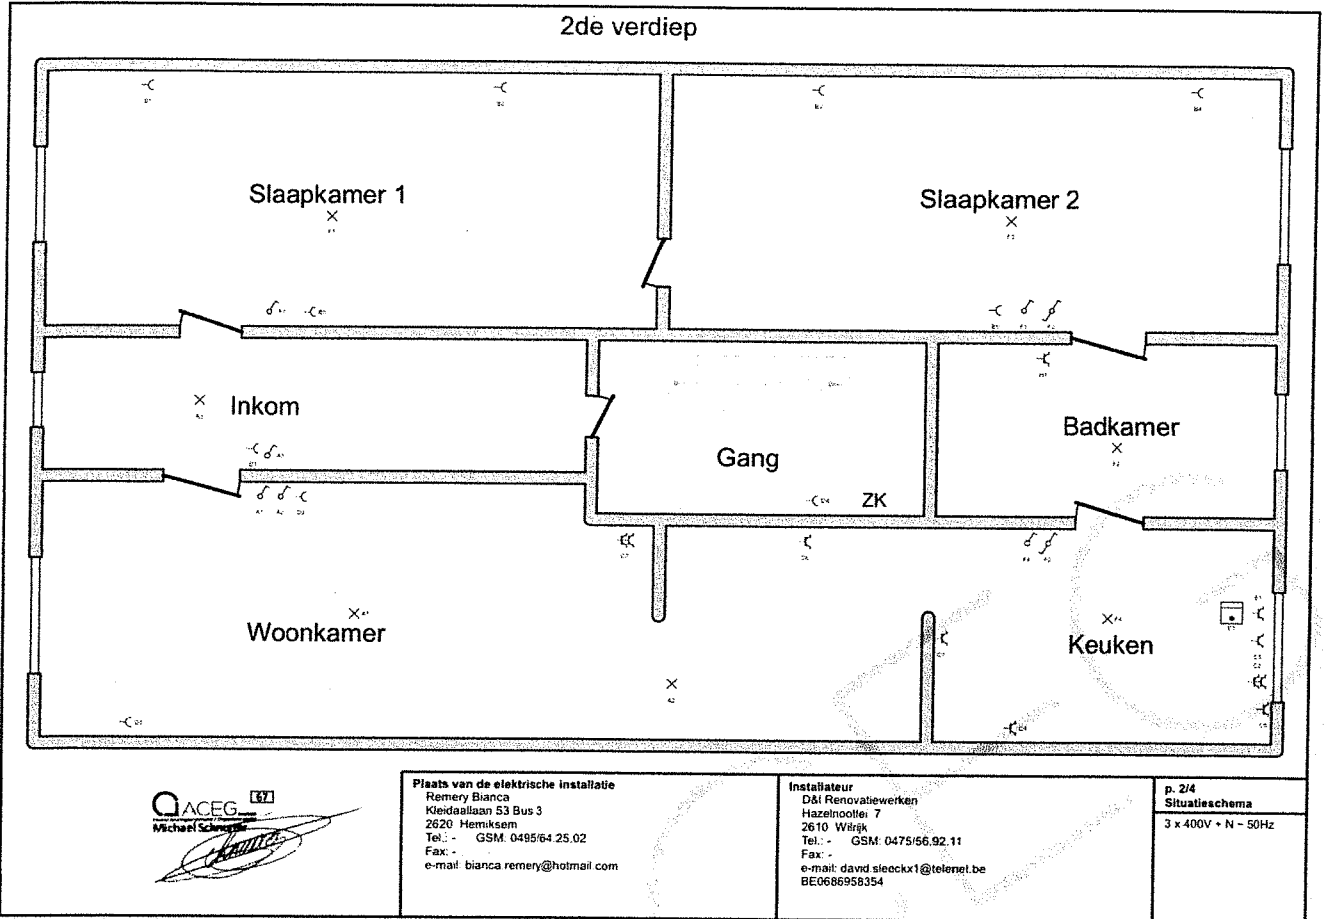



- A: Woonkamer, inkom
- B: Priezen slaapkamer 1 + 2
- C: keuken
- D: Woonkamer
- E: Oven
- F: Slaapkamer 1+2, keuken badkamer
- G: Reserve
- H: Badkamer



Plaats van de elektrische installatie
 Remery Bianca
 Kleidaallaan 53 Bus 3
 2620 Hemiksem
 Tel.: - GSM: 0495/64.25.02
 Fax: -
 e-mail: bianca.remery@hotmail.com

Installateur
 D&I Renovatiewerken
 Hazelnootlei 7
 2610 Wilrijk
 Tel.: - GSM: 0475/56.92.11
 Fax: -
 e-mail: david.sleeckx1@telenet.be
 BE0686958354

p. 4/4
 Lijst Kringen
 3 x 400V + N - 50Hz

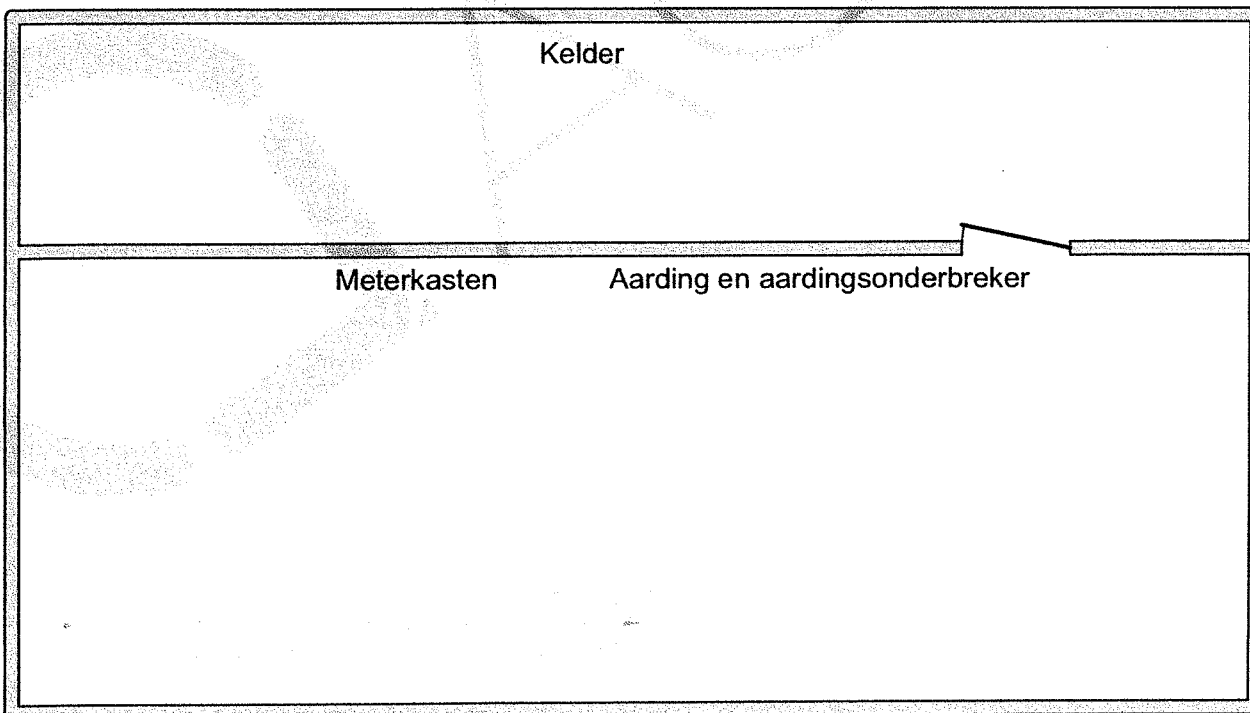

Plaats van de elektrische installatie
 Remery Bianca
 Kleidaallaan 53 Bus 3
 2620 Hemiksem
 Tel.: - GSM: 0495/64.25.02
 Fax: -
 e-mail: bianca.remery@hotmail.com

Installateur
 D&I Renovatiewerken
 Hazelnootlei 7
 2610 Wilrijk
 Tel.: - GSM: 0475/56.92.11
 Fax: -
 e-mail: david.sleeckx1@telenet.be
 BE0686958354

p. 3/4
 Situatieschema
 3 x 400V + N - 50Hz

