

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240318019001 Datum onderzoek: 18/03/2024 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS


Uw referentie: Herkeuring op : 18/03/2025
 Plaats van onderzoek: Waregemsesteenweg 124 bus 1, 9770 Kruishoutem (België)
 Eig./Uitb./Beh.:
 Uitvoerder:
 Bedrijf: Ond nr :
 Type lokalen: Wooneenheid
 Doel onderzoek: 6.5 - Controlebezoek volgens AREI Boek 1 - KB 05/03/2023
 Installatie van: voor 1981 1981 - 2020 2020 - 2023 na 6/2023

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN: 541 448 860 010 232 389
 DNB: Gaselwest
 Nominale spanning: 3 x 400V + N
 Hoofdbeveiliging: 32A
 Voedingsleiding: 4 x 10 mm² XVB
 Elektrode type: Pen/Staven
 Aantal borden: 2
 Aantal stroombanen: 10+15
 Waarde diff. inr: 30mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: OK
 Diff. testknop: OK
 Diff. foutlus: OK
 Bescherming RA/OA: niet OK
 staat vast elektrisch materieel: OK
 R isolatie: 0.64 MOhm
 R aarde: 9 Ohm
 Schema's: niet OK



TOELICHTING

Volgens afdeling 8.2.2 - Afwijkingen AREI 1981 - 1/6/2020

Enkel het woongedeelte maakt deel uit van het onderzoek. Garages, handelsgedeeltes vallen buiten het aspect van het onderzoek of maken geen deel uit van de installatie.

De PV-installatie zit niet vervat in dit onderzoek.

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1	I	Eendraad en/of situatieschema van de installatie te voorzien of te vervolledigen. Bij een volgende controle kunnen er inbreuken op dit punt worden vastgesteld.	3.1.2.1. t.e.m. 3.1.2.4 - 3.1.3.1. t.e.m. - 3.1.3.3. - 5.1.6.1. - 9.1.2
2	I	Op het eendraad en/of situatieschema ontbreken de naam en/of hoedanigheid en/of BTW nummer en/of datering + handtekening van de van de verantwoordelijke van het werk en/of plaats van de installatie. Dit moet per blad aanwezig zijn.	3.1.2.1. t.e.m. 3.1.2.4 - 3.1.3.1. t.e.m. - 3.1.3.3. - 5.1.6.1. - 9.1.2
3	I	Markering gemeenschappelijke aardingsonderbreker met adres van de betrokken installatie ontbreekt of is onvolledig.	5.4.2.1
4	I	De aanduiding van de stroomkringen, apparatuur en/of de spanningsaanduiding, enz. is afwezig, onvolledig of onjuist.	3.1.3
5	I	De kabels en/of leidingen zijn niet of niet voldoende bevestigd.	5.2.2
6	A	Hoofdequipotentiaal niet verwezenlijkt.	8.2.1
7	O	De aanwezigheid van het bijkomend equipotentiaal kon niet worden vastgesteld.	5.4.4.2 - 7.1.4.4

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240318019001 Datum onderzoek: 18/03/2024 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 05/03/2023. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor 18/03/2025. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten. Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens dit controlebezoek dient men binnen een termijn van hoogstens één jaar door hetzelfde erkend organisme een nieuw controlebezoek te doen verrichten. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Jurgen Dierick**

Datum vrijgave: 18/03/2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JD', is written over the printed name 'Jurgen Dierick'.


RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240318019001

Datum onderzoek: 18/03/2024

Agent: Jurgen Dierick

volgens procedure TP01b

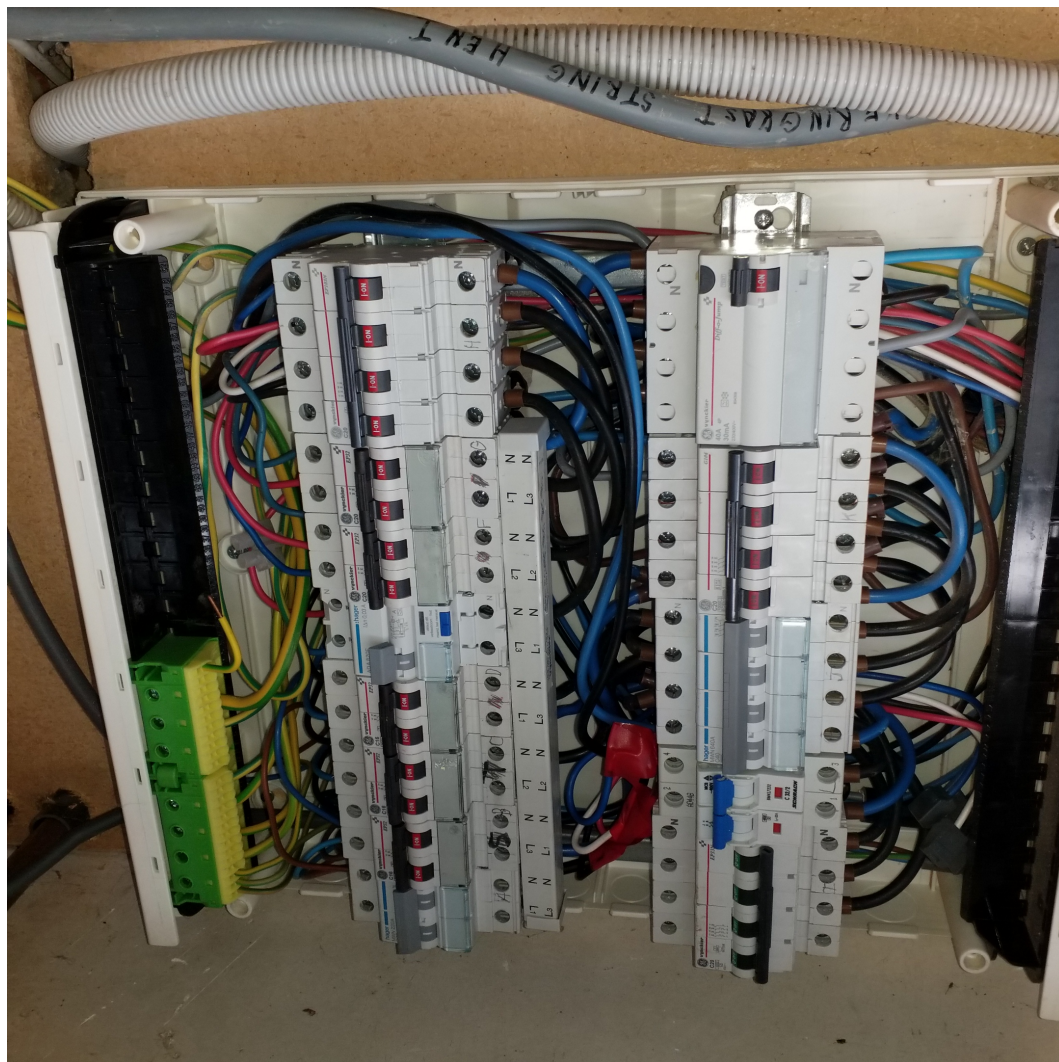

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20240318019001

Datum onderzoek: 18/03/2024

Agent: Jurgen Dierick

volgens procedure TP01b

