



L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 04/05/2022 Date d'émission du rapport: 05/05/2022
Rapport N°: 0428-220504-02

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrugghen

Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles

T: 083 21 35 27 E: btv.namur@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0428

Identification des tiers:

Client:

Adresse: E I S I

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire:

Adresse: , IL

Responsable des travaux:

Adresse: RUE

Numéro de TVA:

Identification de l'installation électrique:

Nom:

Adresse: RUE BAYARD, GON. 11 B, 5660 COUVIN

Code EAN:

Numéro compteur: A installer

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité de travail

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4)

Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

RE06_02-08_01-15 09/20

N° Rapport: 0428-220504-02



Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 400V + N

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: EXVB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Piquet de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: Max. 40A


Type de coupure générale: 4P 40A/300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 13 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

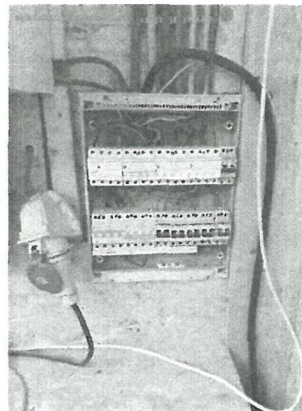

Document des influences externes: voir en annexe

Ref. des voies d'évacuation et des espaces difficiles à évacuer: pas d'application

Documents des installations de sécurité: Non communiqué

Documents des installations critiques: Non communiqué

Plan de position des prises de terre: voir sur plans

Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 20 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 50 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

- 1 Les travaux sur l'installation électrique ont commencé avant le 1 juin 2020, voir document nr. Bayard 11B datant de 04-05-2022
- 2 Le futur contenu de l'atelier est inconnu

Conclusion du contrôle:

RE06_02-08_01-15 09/20

N° Rapport: 0428-220504-02

