BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST
Erkend Controleorganisme EDTC
Organisme de Contrôle Agréé SECT

HOOFDKANTOOR VZW / SIEGE SOCIAL ASBL
Electro-Test - Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek
T +32 2 751 98 39 E info@electro-test.be
BTW/TVA BE 0434.433.603

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: / N° de rapport:	ET 328/2025/9/3/8		Datum van bezoek: / Date de visite:	3/09/2025	
Opdrachtgever: / Donneur d'ordre:				IK: / CI:	-
Distributienetbeheerder: / Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: / N° compteur: / Nr teller nachttarief: / N° compteur tarif de nuit:	1SAG3100057459 / -	EAN-nr: / N° EAN:	541 448 820 052 723 610
Plaats van het onderzoek: / Lieu du contrôle:	Bleckmeersstraat 19b - 9160 LOKEREN				
Eigenaar: / Propriétaire:					
Installateur:	E. Baert			BTW/TVA:	-
Gebruikte interne procedure: / Procédure interne utilisée:	F-ELS270 (Controle van een huishoudelijke installatie (studio/appartement/woning))				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE

Art. onderzoek: Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname nieuwe installatie (6.4) / Controle de conformité avant mise en usage nouvelle installation (6.4)
Controlebezoek (6.5) / Visite de controle (6.5)
Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison

Netspanning / Tension de reseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
3N400V	4 x 10 mm² VOB	25A

Aardelektrode / Electrode de terre: Lus/Boucle 5.08 Ohm Isolatie / Isolement: 1.28 MOhm Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 20

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
40A	300mA	A/s	6	OK	OK
40A	30mA	A/s	8	OK	OK
40A	30mA	A/s	6	OK	OK

Visueel nazicht Algemeen: / Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: / Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: / Contact indirect:	OK
Aansluitingen: / Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: / Liaisons équipotentielles:	OK	Beschermingsgeleiders: / Conducteurs de protection:	OK


Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:


Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.
N. Het gelijkvormigheidsonderzoek heeft uitsluitend betrekking op de wijziging van het laagspanningsbord. (behoudens eindstroombanen)
N. De Pv installatie behoort niet tot deze controle.
N. De zolder is nog af te werken.

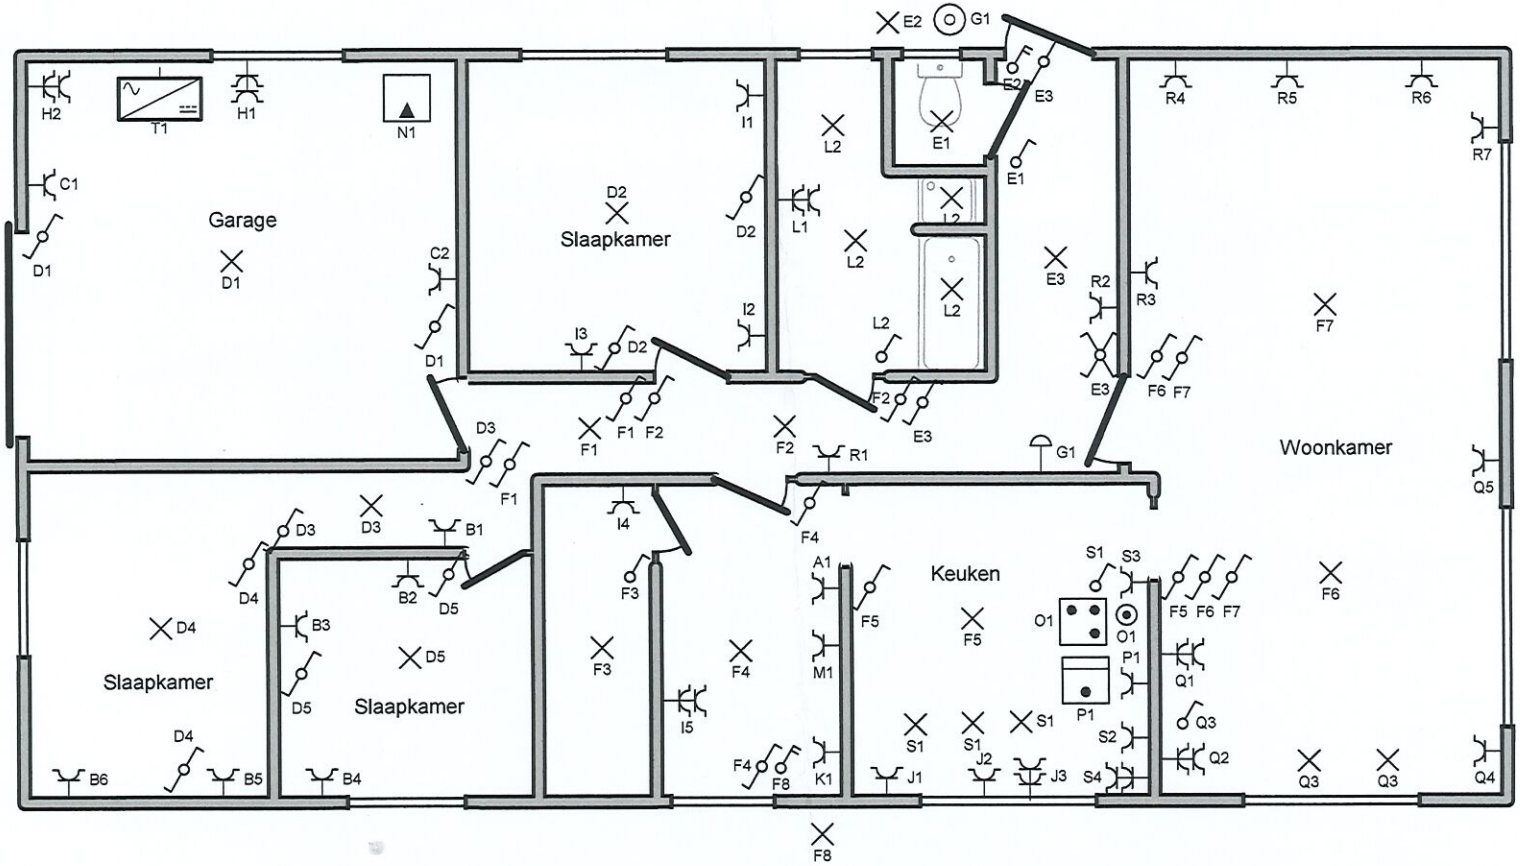


Plaats van de elektrische installatie	Installateur	p. 1/1 Situatieplan
		Datum: 17/06/2025
		3 x 400V + N ~ 50Hz




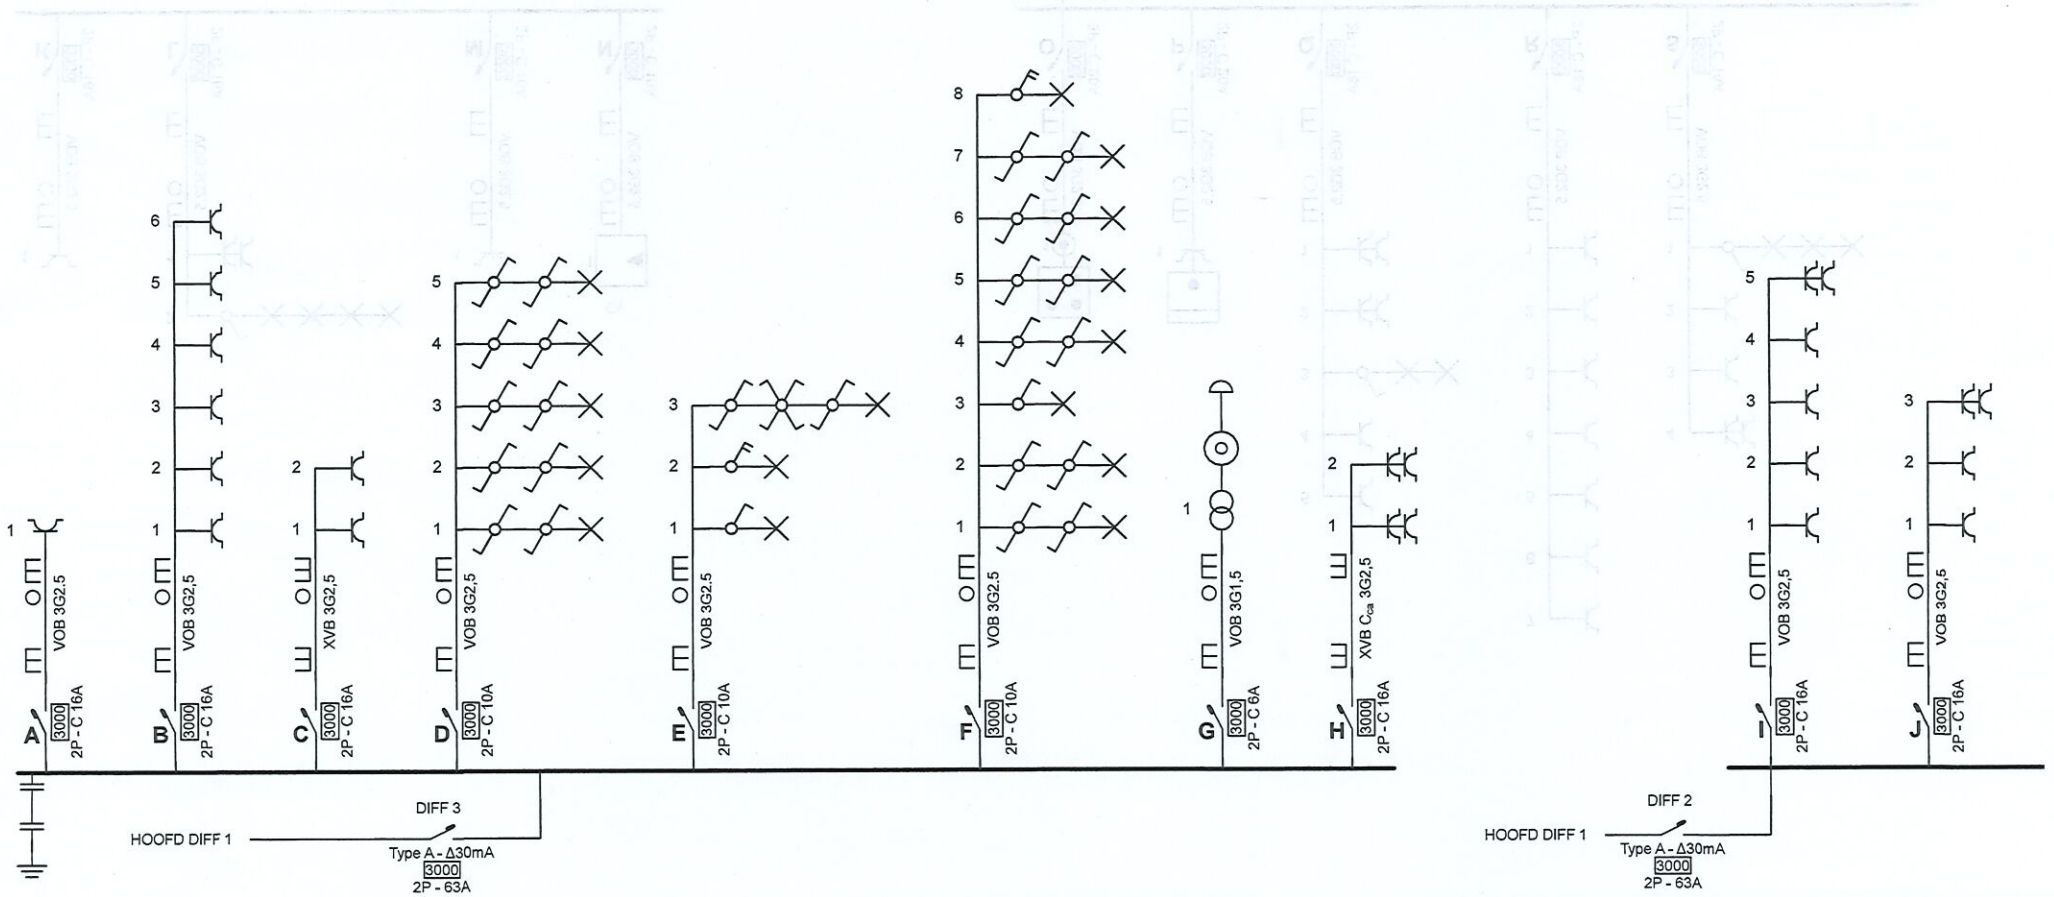

Plaats van de elektrische installatie	Installateur	p. 1/6 Eendraadschema
		Datum: 17/06/2025
		3 x 400V + N ~ 50Hz

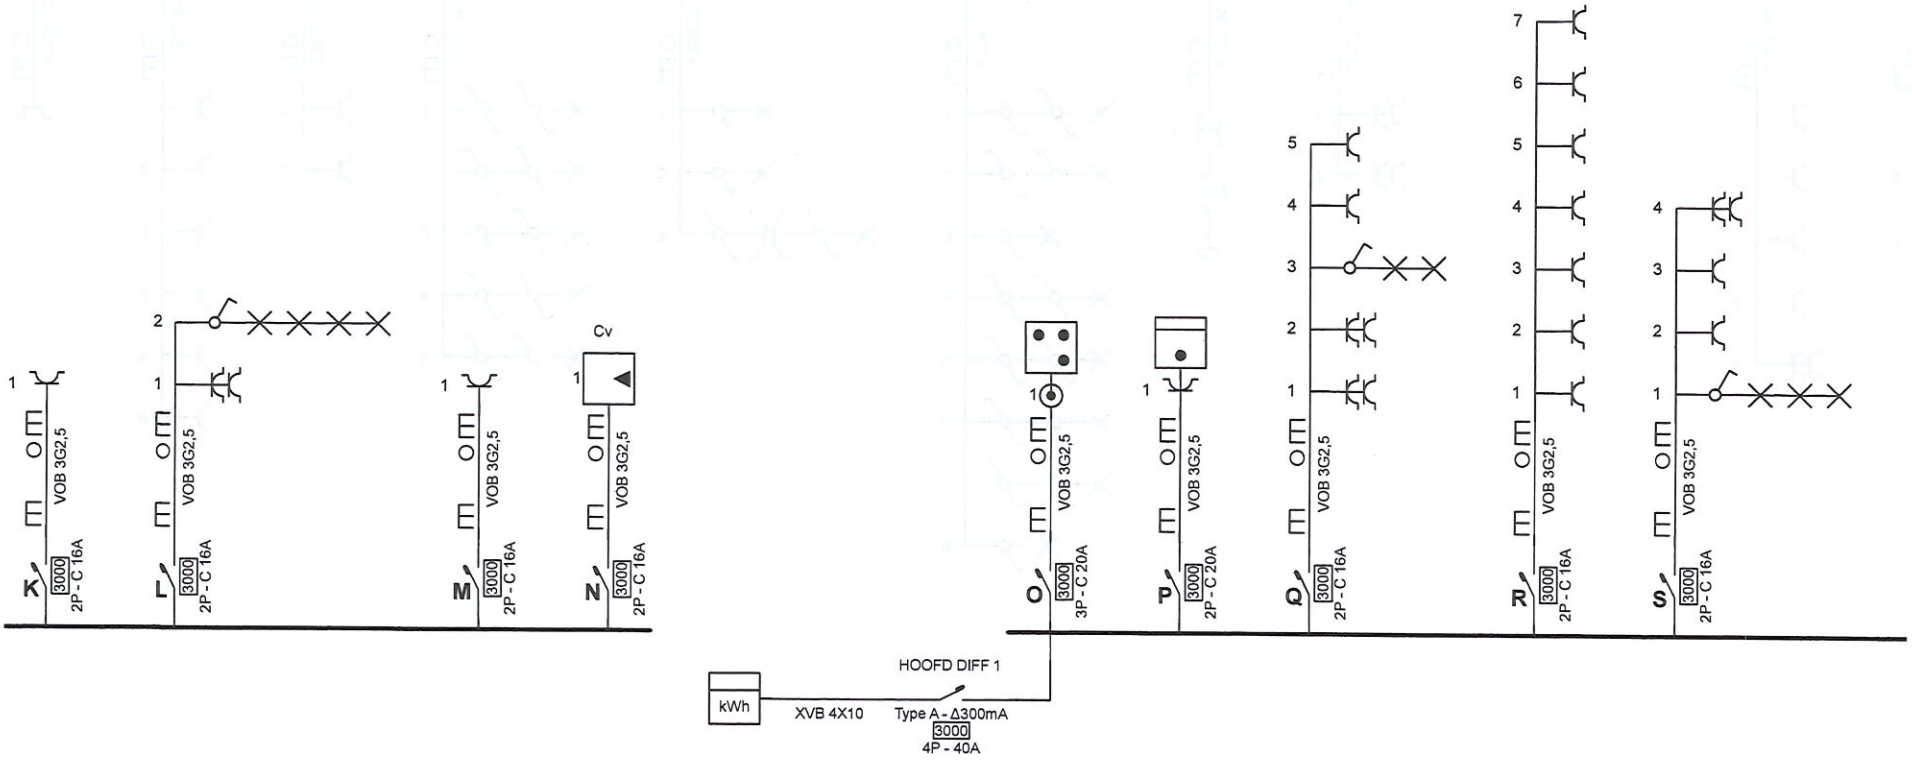

Plaats van de elektrische installatie	Installateur	p. 2/6 Eendraadschema
		Datum: 17/06/2025
		3 x 400V + N ~ 50Hz

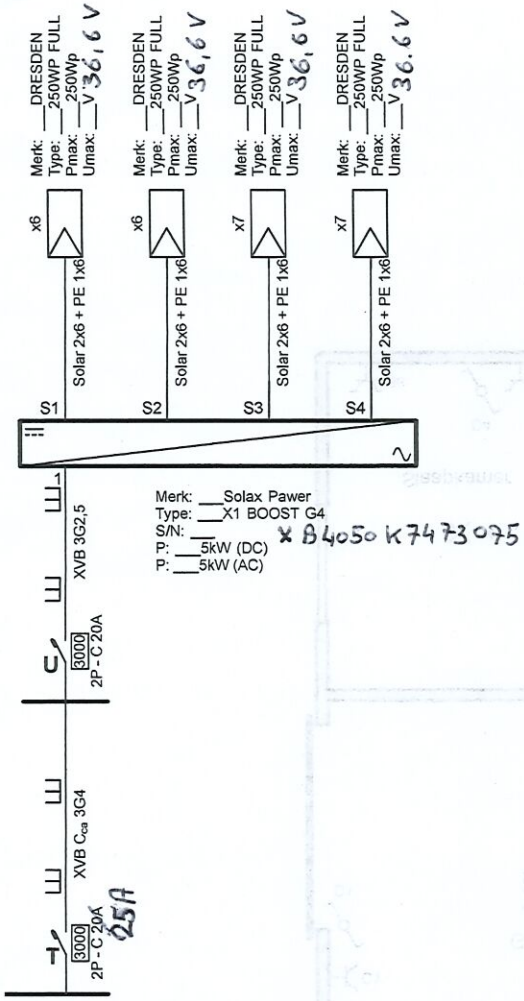

ELECTROTEST
Khalid DANOUN
Inspecteur
khalid.danoun@electro-test.be
GSM +32 490 30 57 34

Plaats van de elektrische installatie


Installateur

ELCO SOLAR
BE 0827.729.209
Neerstraat 25 1.9250 Waasmunster


p. 3/6
Eendraadschema

Datum: 17/06/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

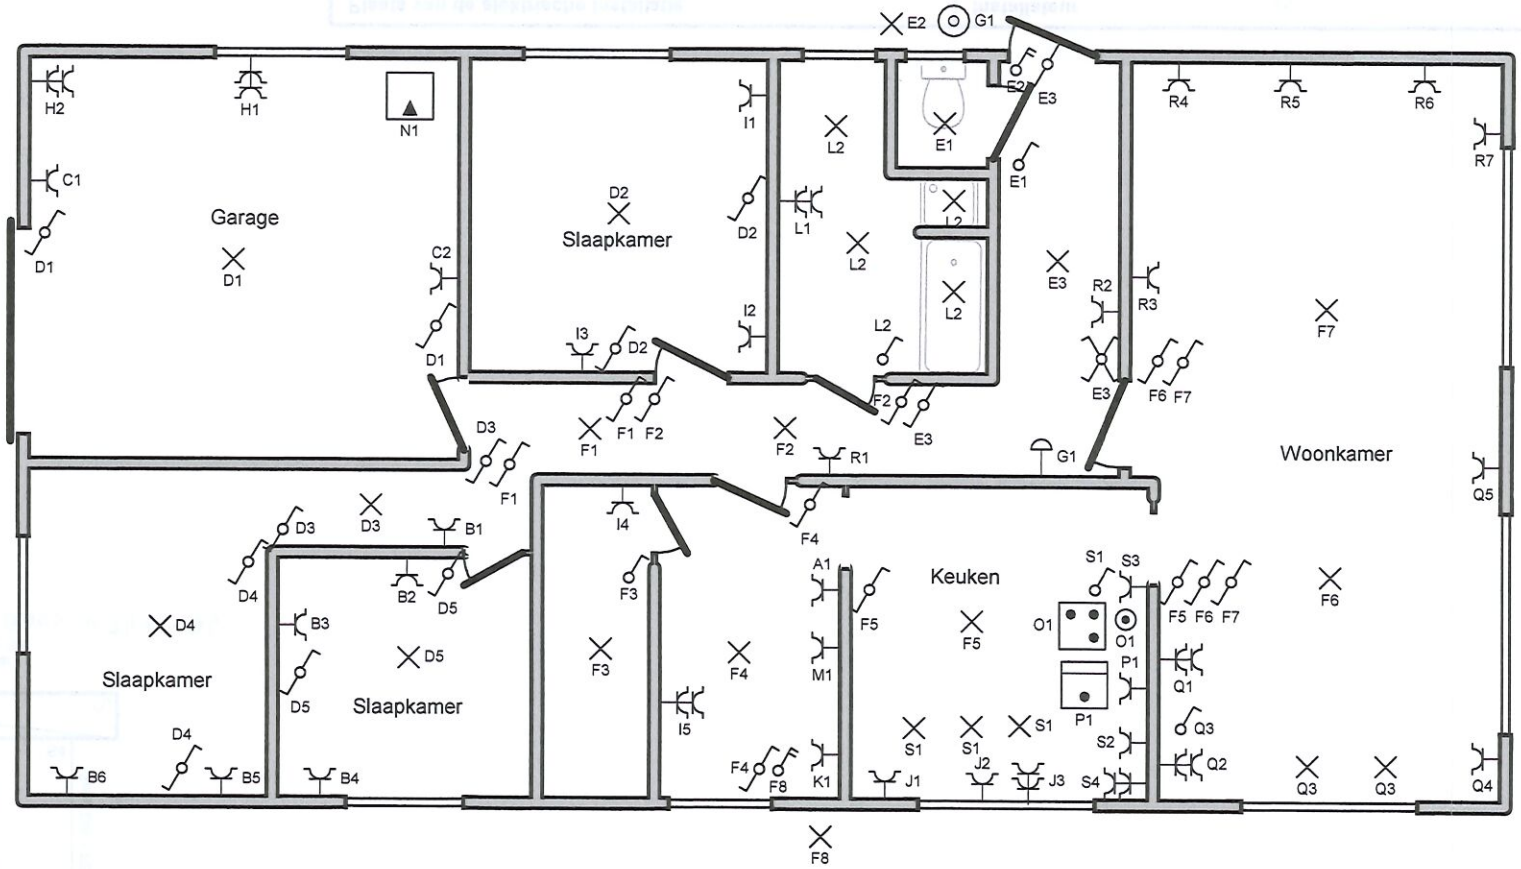

Plaats van de elektrische installatie	Installateur	p. 4/6 Situatieplan
		Datum: 17/06/2025
		3 x 400V + N ~ 50Hz

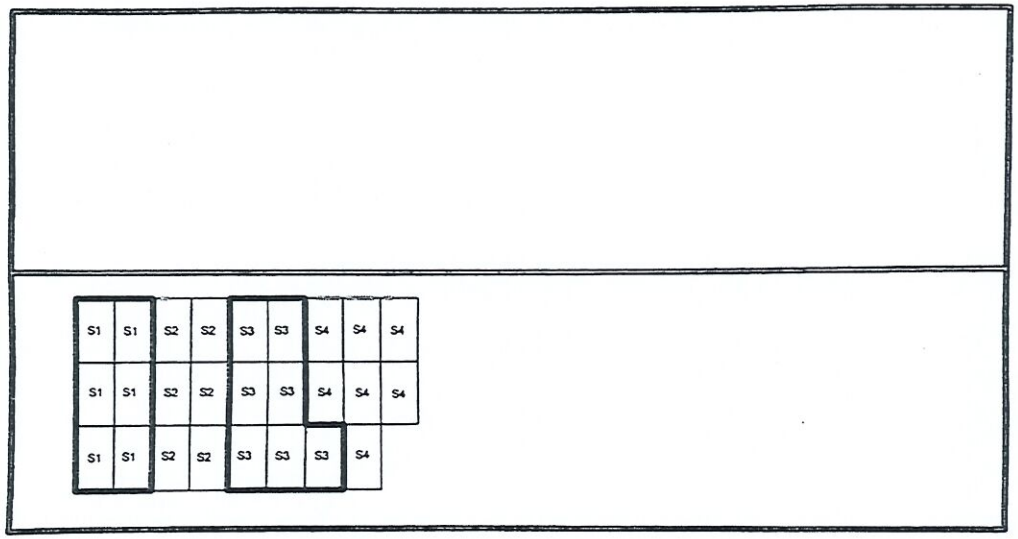

ELECTROTEST
Khalid DANOUN
Inspecteur
khalid.danoun@electro-test.be
GSM +32 490 30 57 34

Plaats van de elektrische installatie	Installateur	p. 5/6 Situatieplan
		Datum: 17/06/2025
		3 x 400V + N ~ 50Hz

Gescand met CamScanner
