ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 26/10/2026 **Inspecteur:** Bruno Delvaux **Mentor:** - **Installateur:** -
ID-label: - **Klantreferentie:** -

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 Serienummer: 19481241

Datum verslag: 26/10/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Helmkruidstraat
Huisnummer	16
Busnummer	-
Postcode	3360
Gemeente	Lovenjoel
Land	België

Eigenaar

Naam	Claessens
Straatnaam	Helmkruidstraat
Huisnummer	16
Busnummer	-
Postcode	3360
Gemeente	Lovenjoel
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	
E-mail	-

Type : woning **EAN** : 5414488200579684 74 **Teller Nr.:** : 1SAG1100911255

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

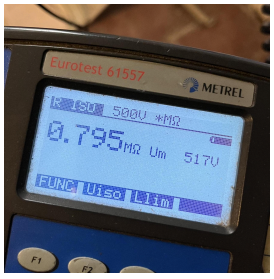


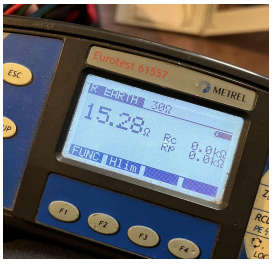
Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 2 Aantal kringen: 23
Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 0,795 MΩ RE: 15,28 Ω

OK OK





DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	23	NOK	NOK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	NOK	NOK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen		Curve		Bescherming IN (A)		(andere)		P		Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK		**Directe aanraking**	OK		**Indirecte aanraking**	NOK			
Aansluitingen	OK		**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA						
Equipotentiale verbindingen	NOK		**Doorsnede geleiders**	OK						
Continuiteit	OK		**Verlichting / toestellen**	NVT						

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I2.01 Eén of meerdere differentieelstroombeschermingsinrichtingen werken niet met testknop en/of stroominjectie. (Boek 1 Onderafdeling 6.5.7.2)

I4.01 Hoofdequipotentiale verbinding(en) niet verwezenlijkt. (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.1. en 5.1.6.2)

I5.01 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)

I5.11 Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)

I8.07 Leidingen zijn te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.2. en 5.2.9.)

N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 26/10/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:53 tot 11:42

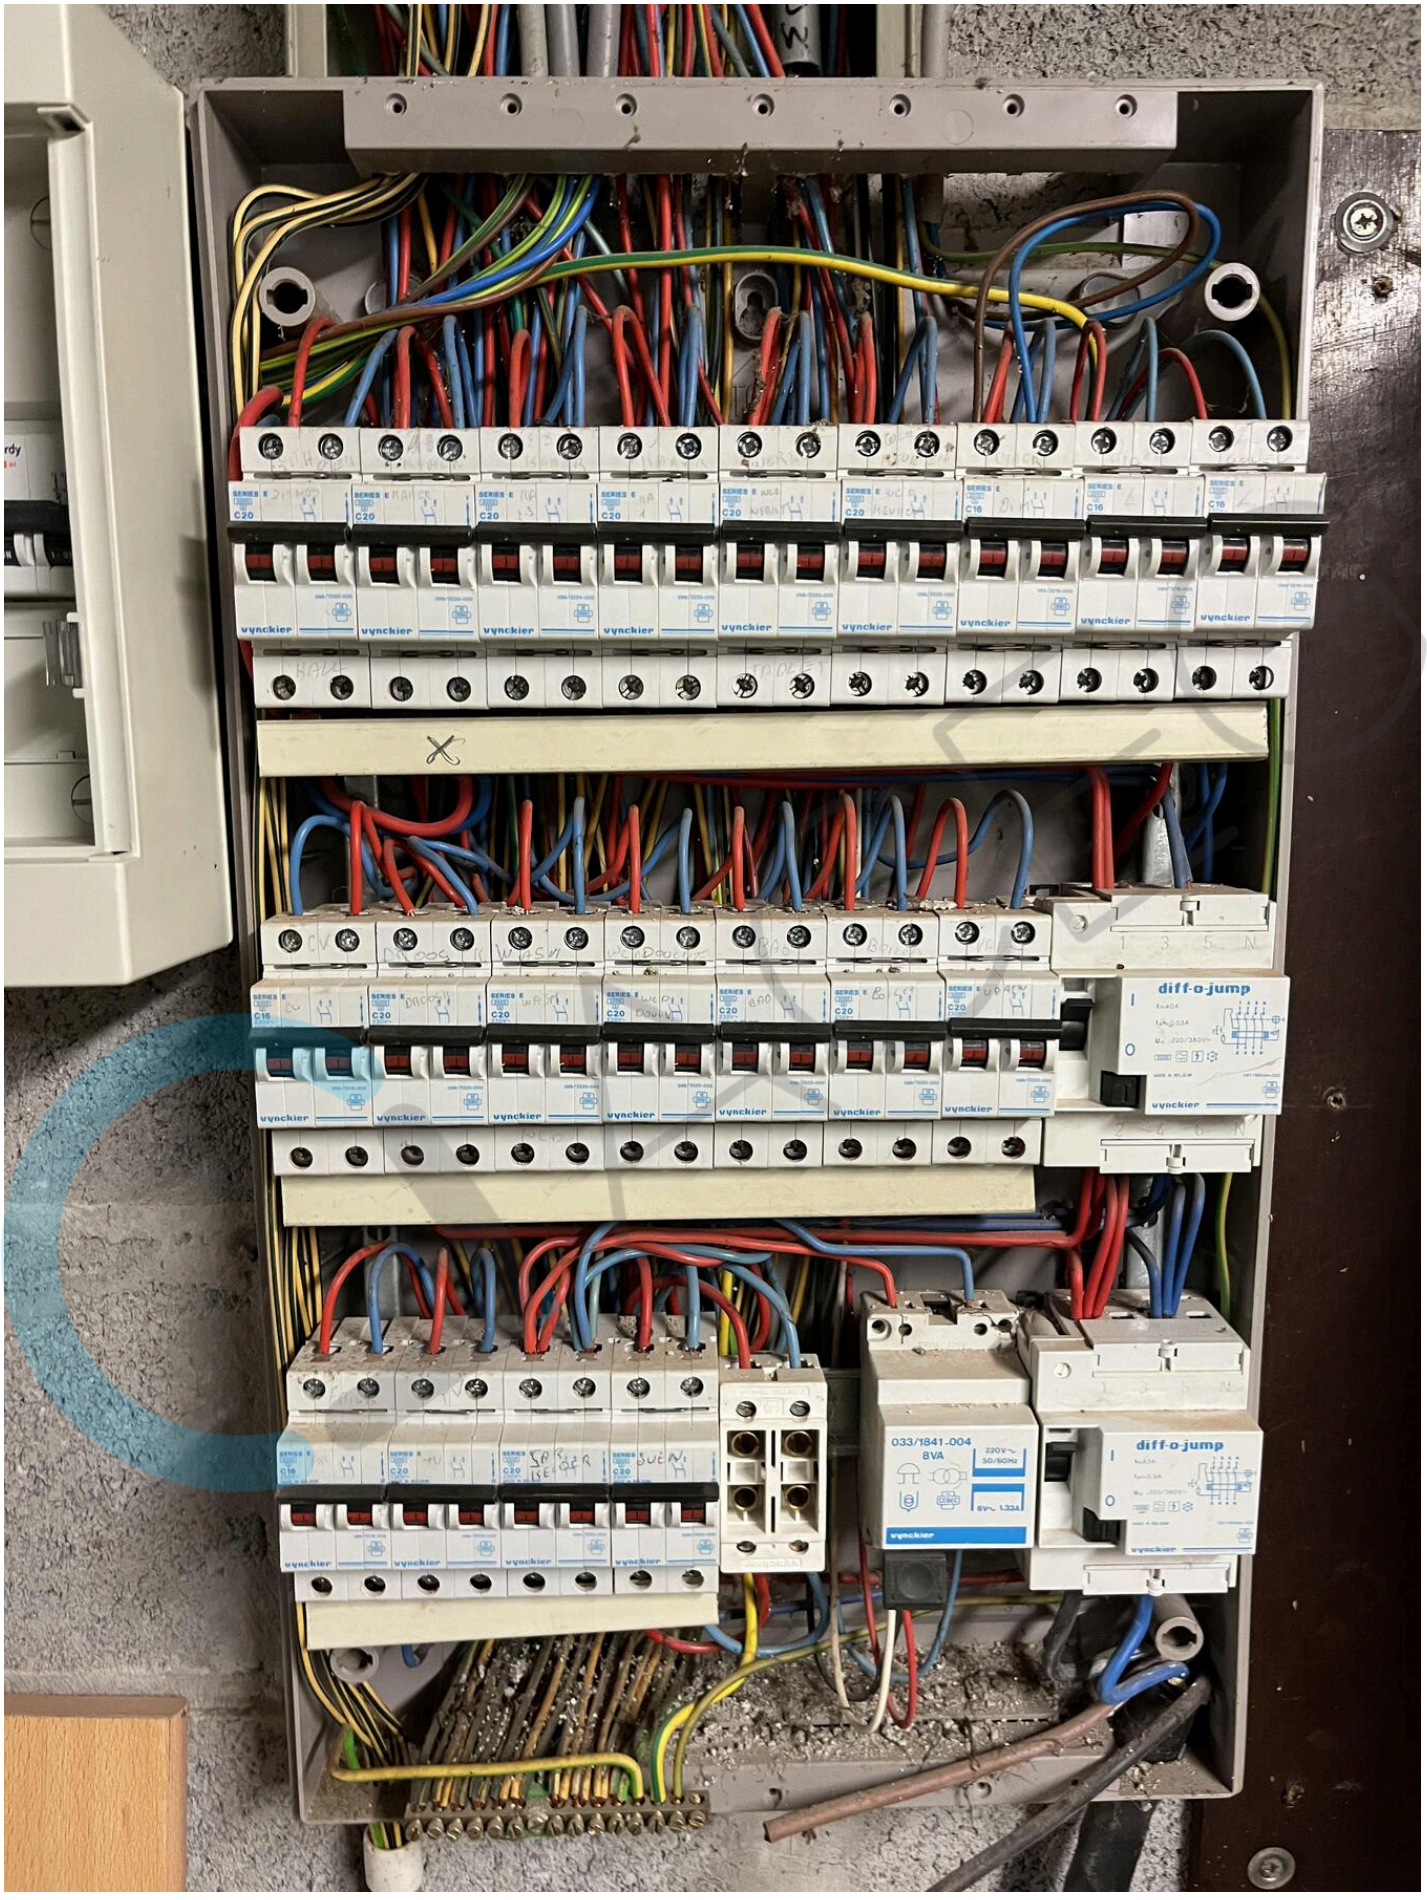
De inspecteur Bruno Delvaux



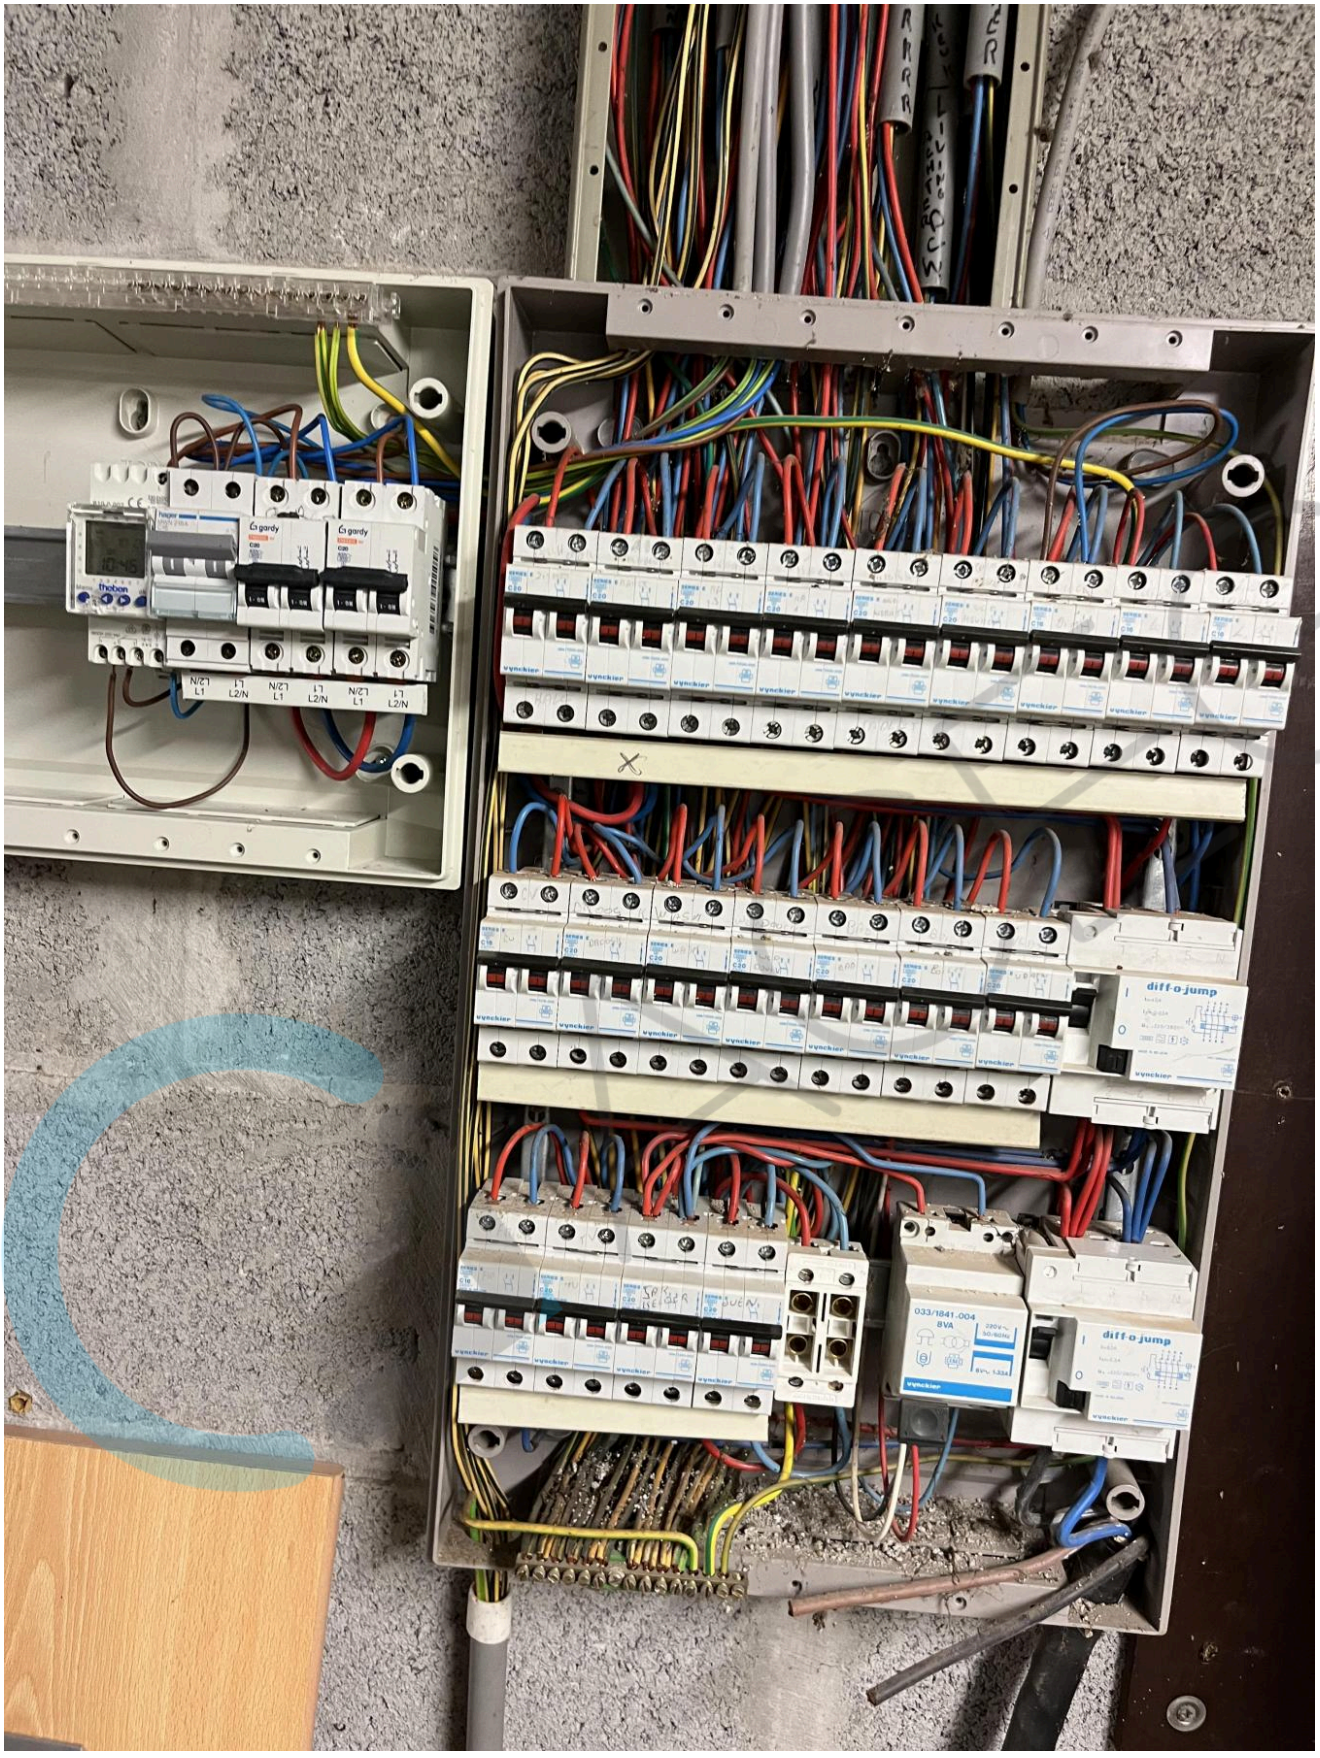
Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

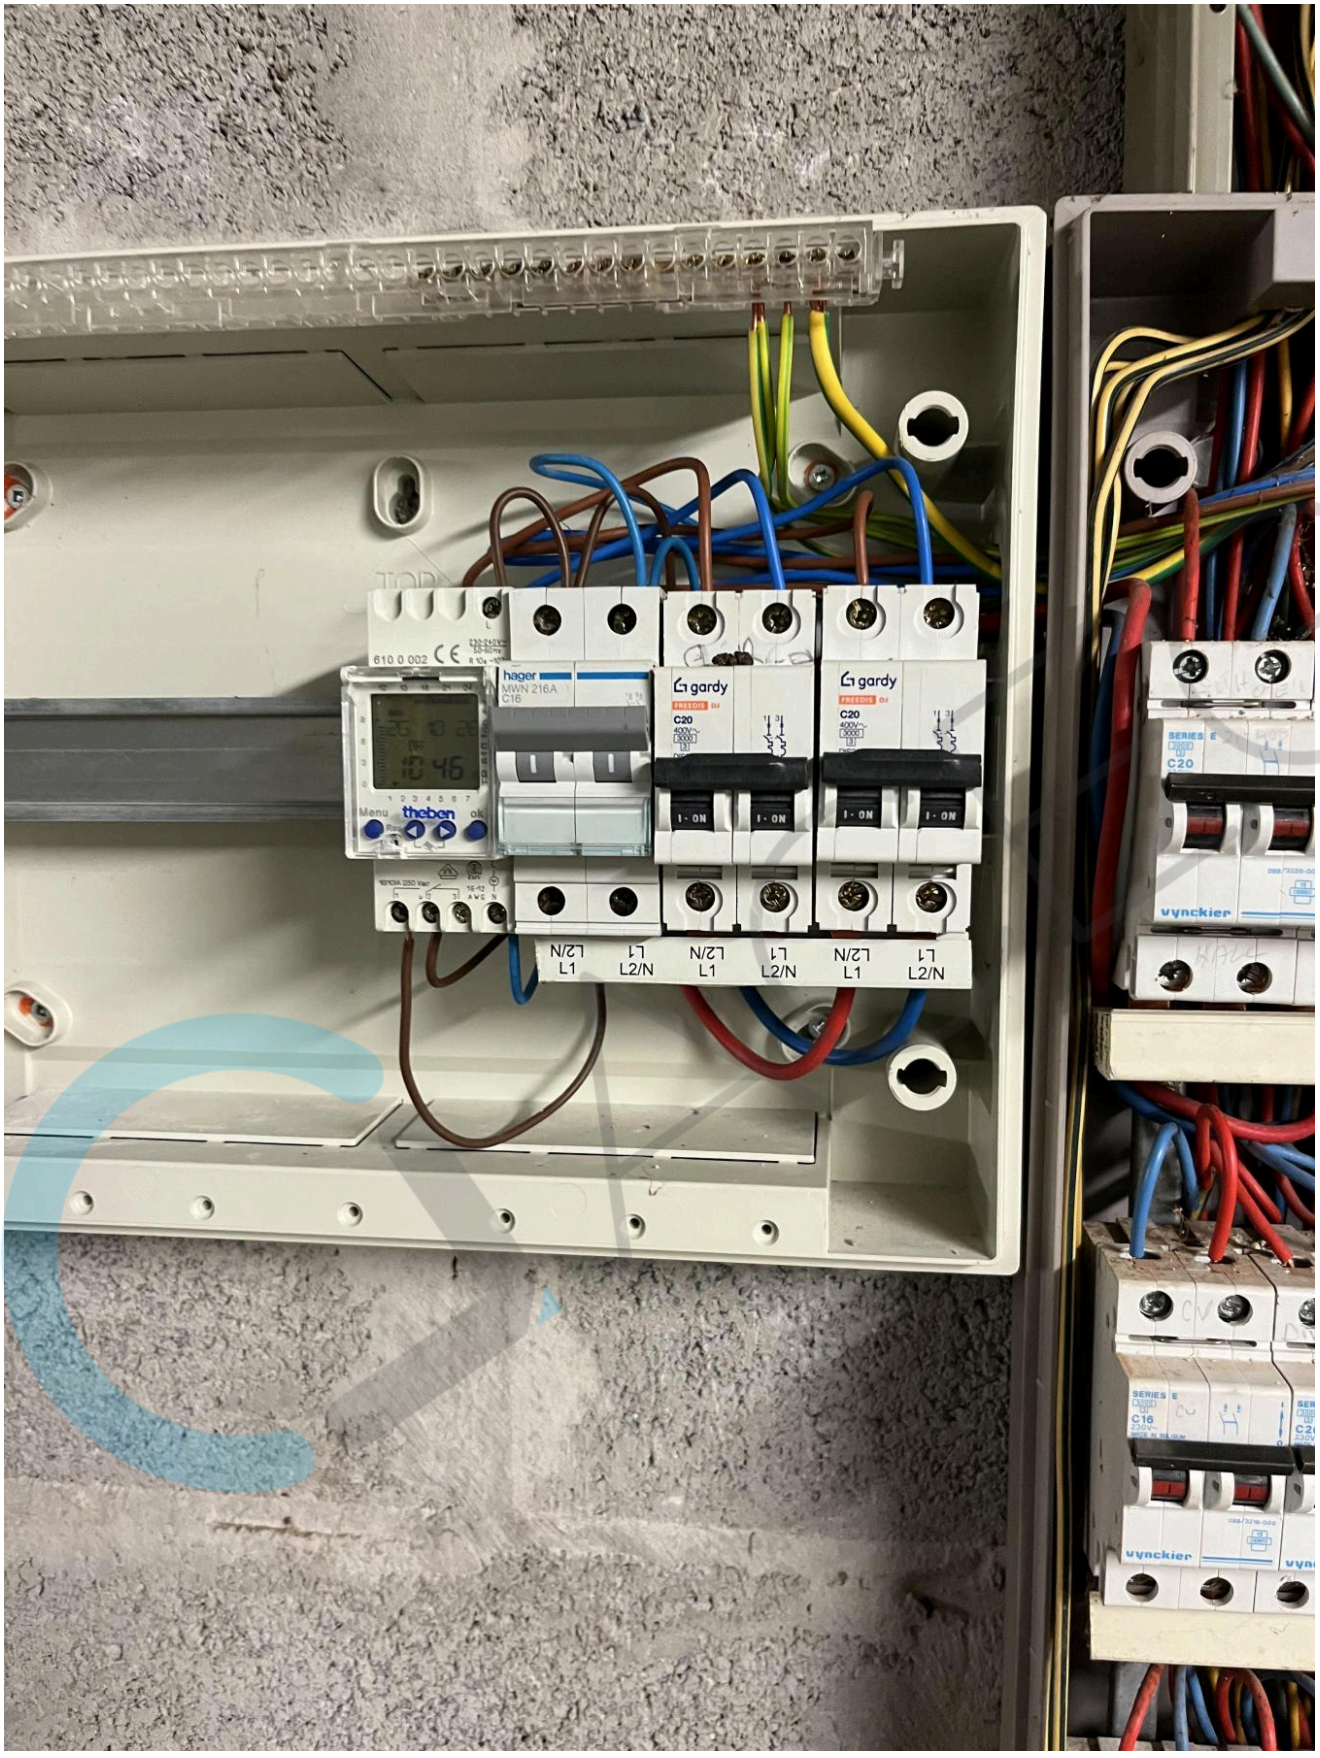
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

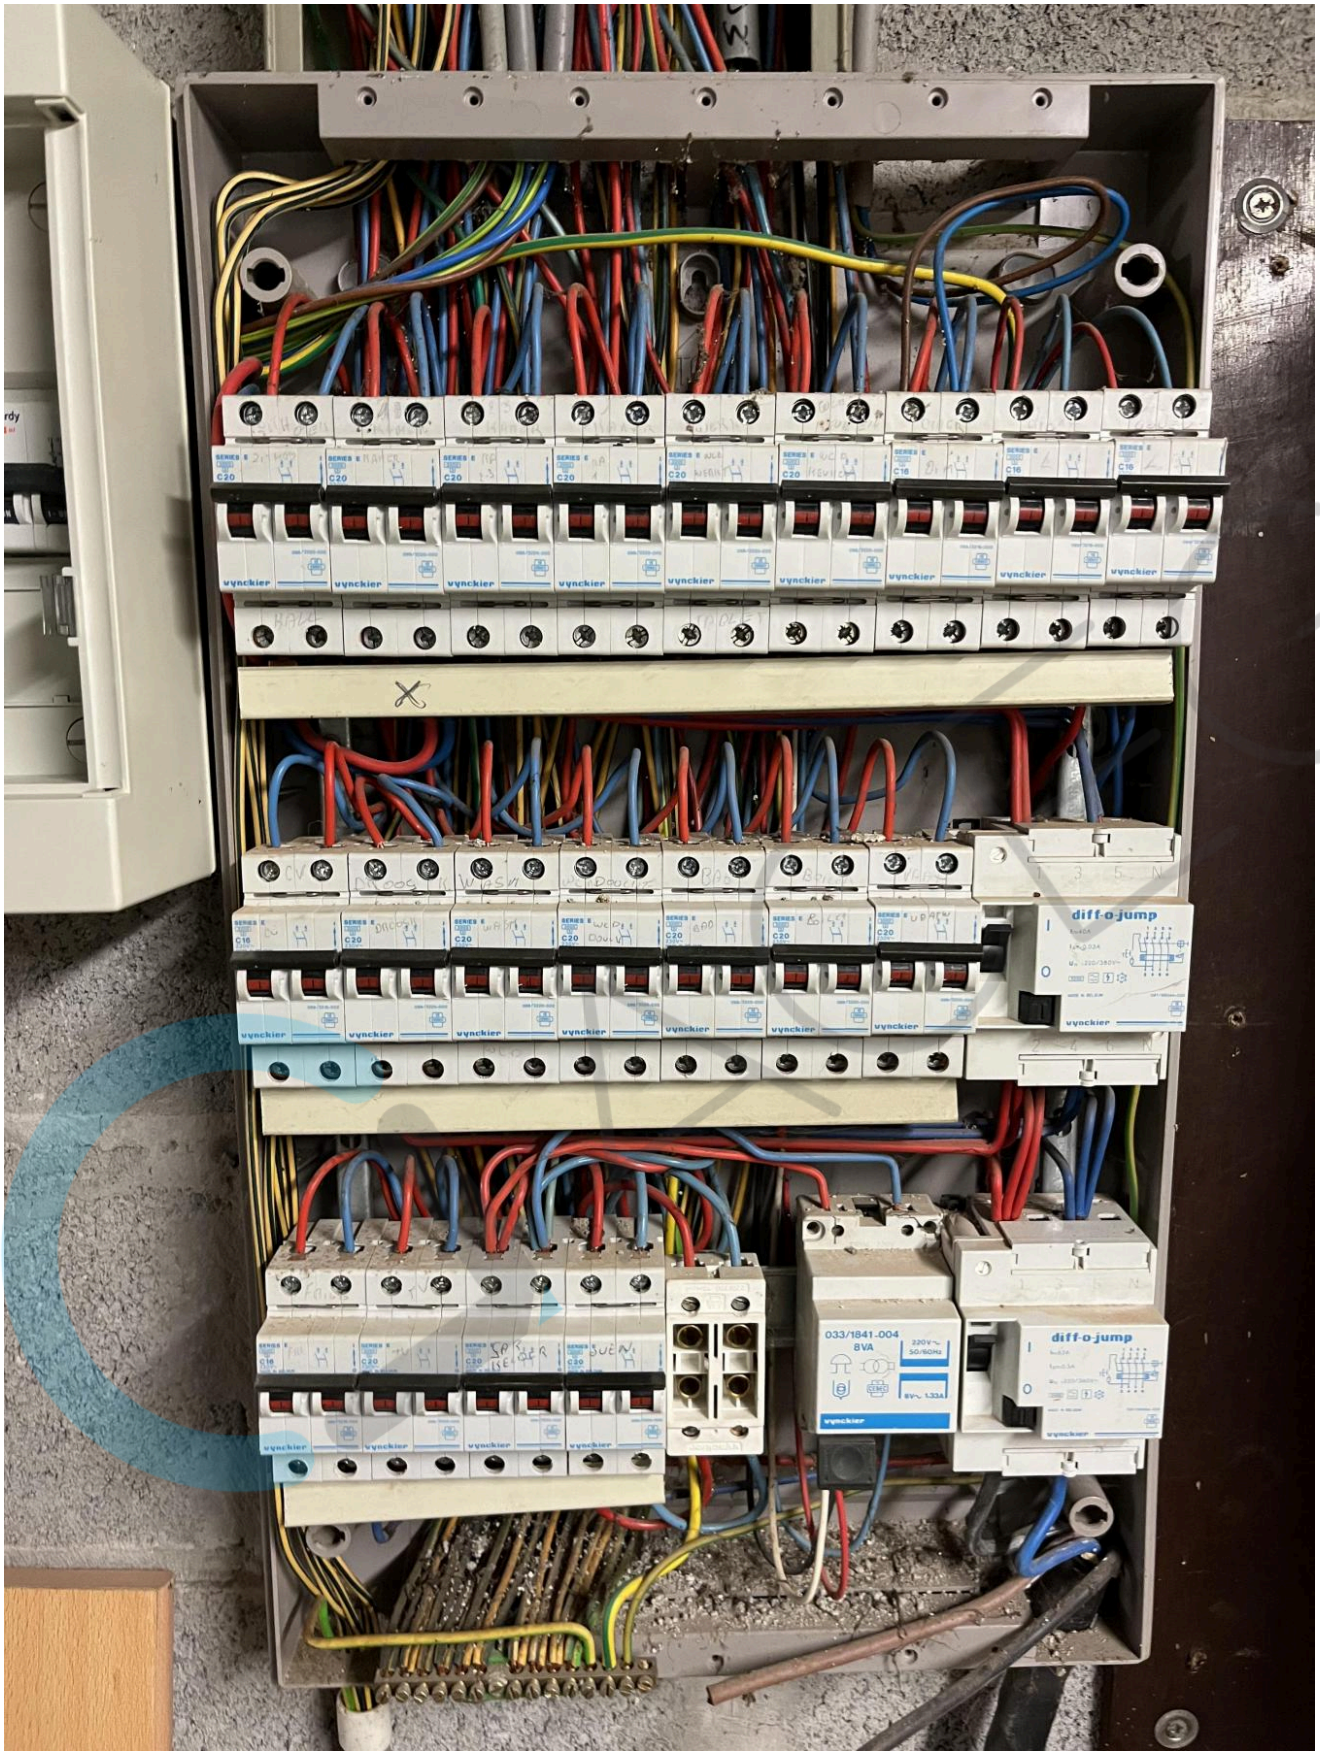
Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.


vynckier
diff-o-jump
033/1841-004
8VA
220V~ 50/60Hz
8V~ 1.33A


Bij Gasgeur


diff-o-jump
diff-o-jump
033/1841.004
8VA


610 0 002
hager
MWN 216A
C16
Menu
theben
ok
gardy
C20
I - ON
N/L2
L1
L2/N
vynckier
SERIES E
C16
C20

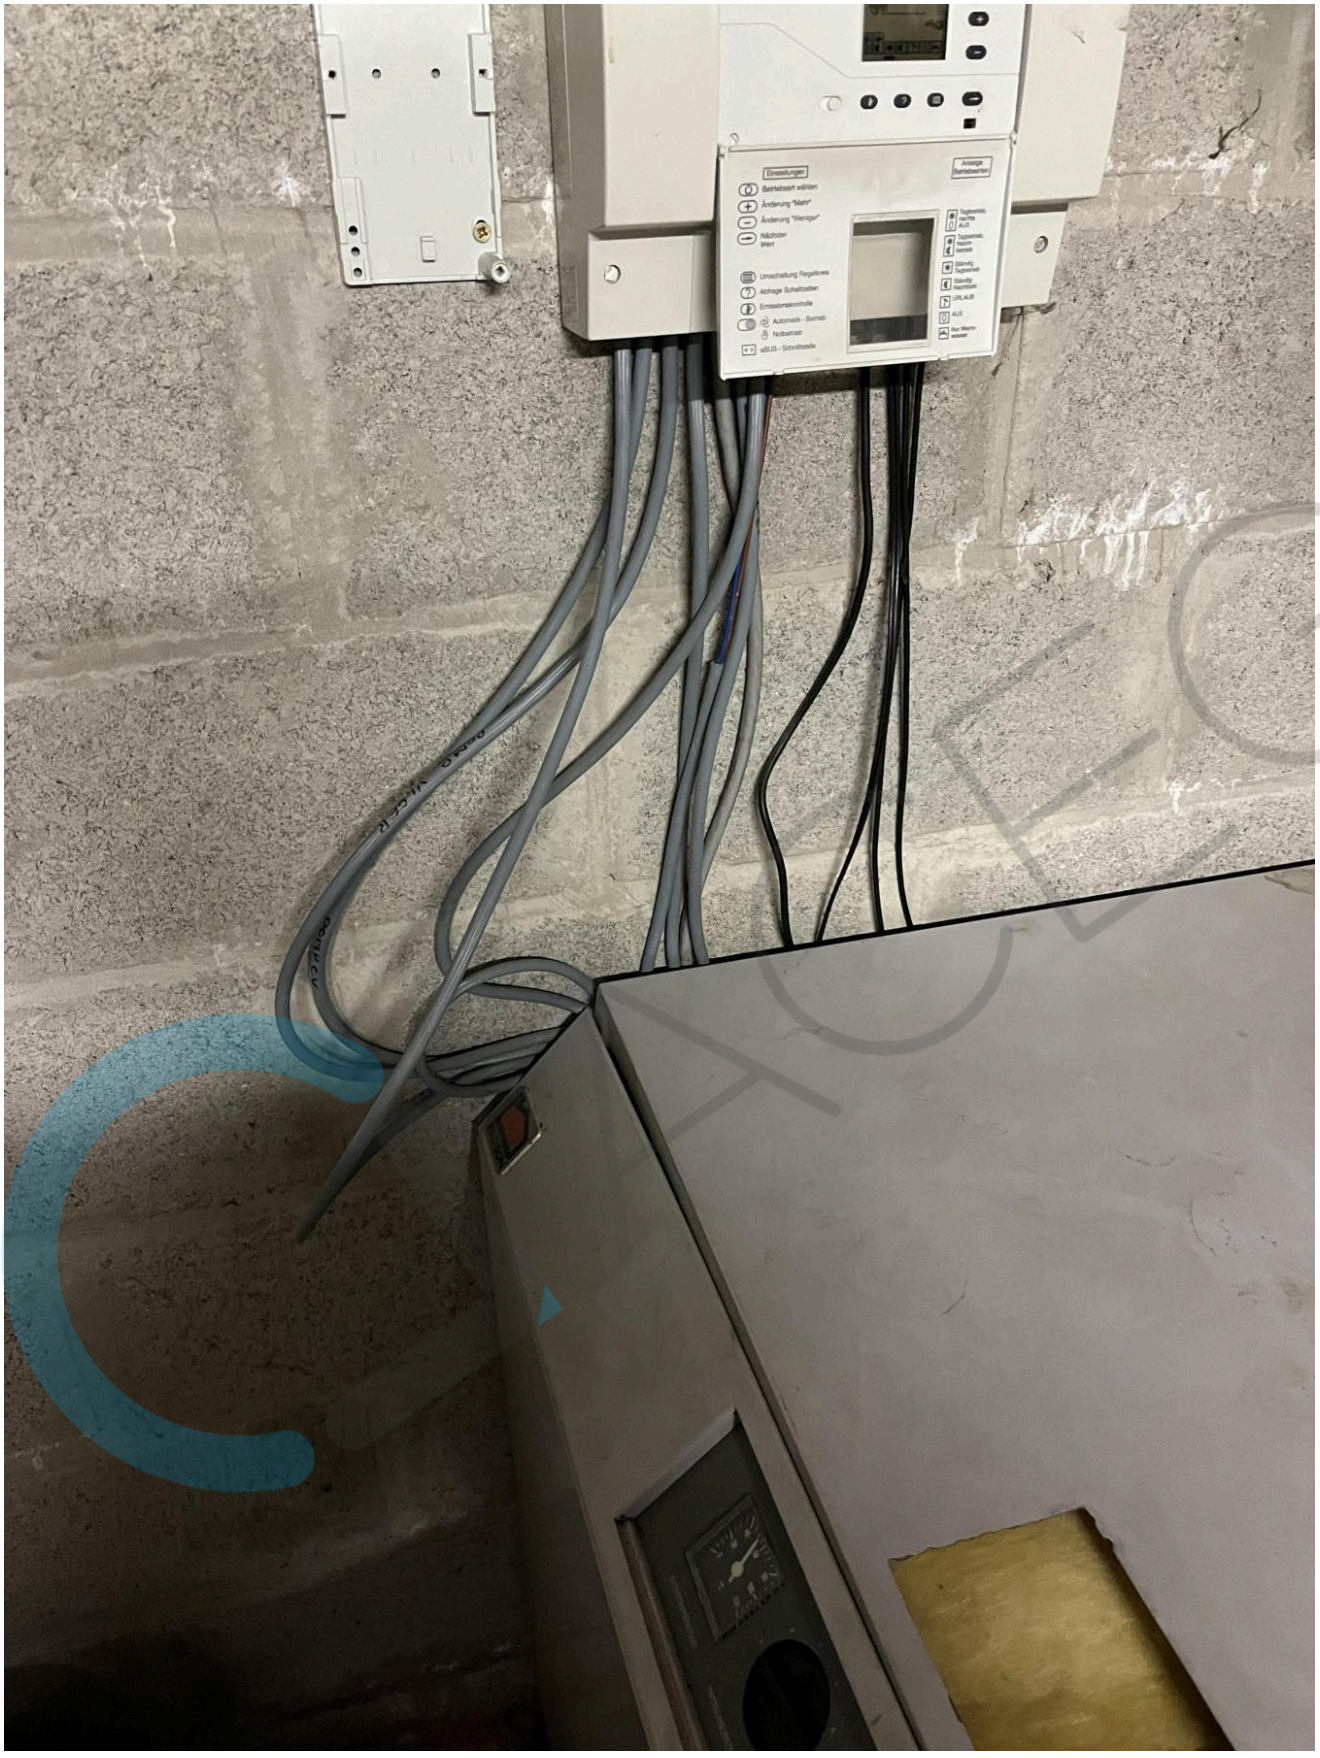

vynckier
diff-o-jump
033/1841-004
8VA

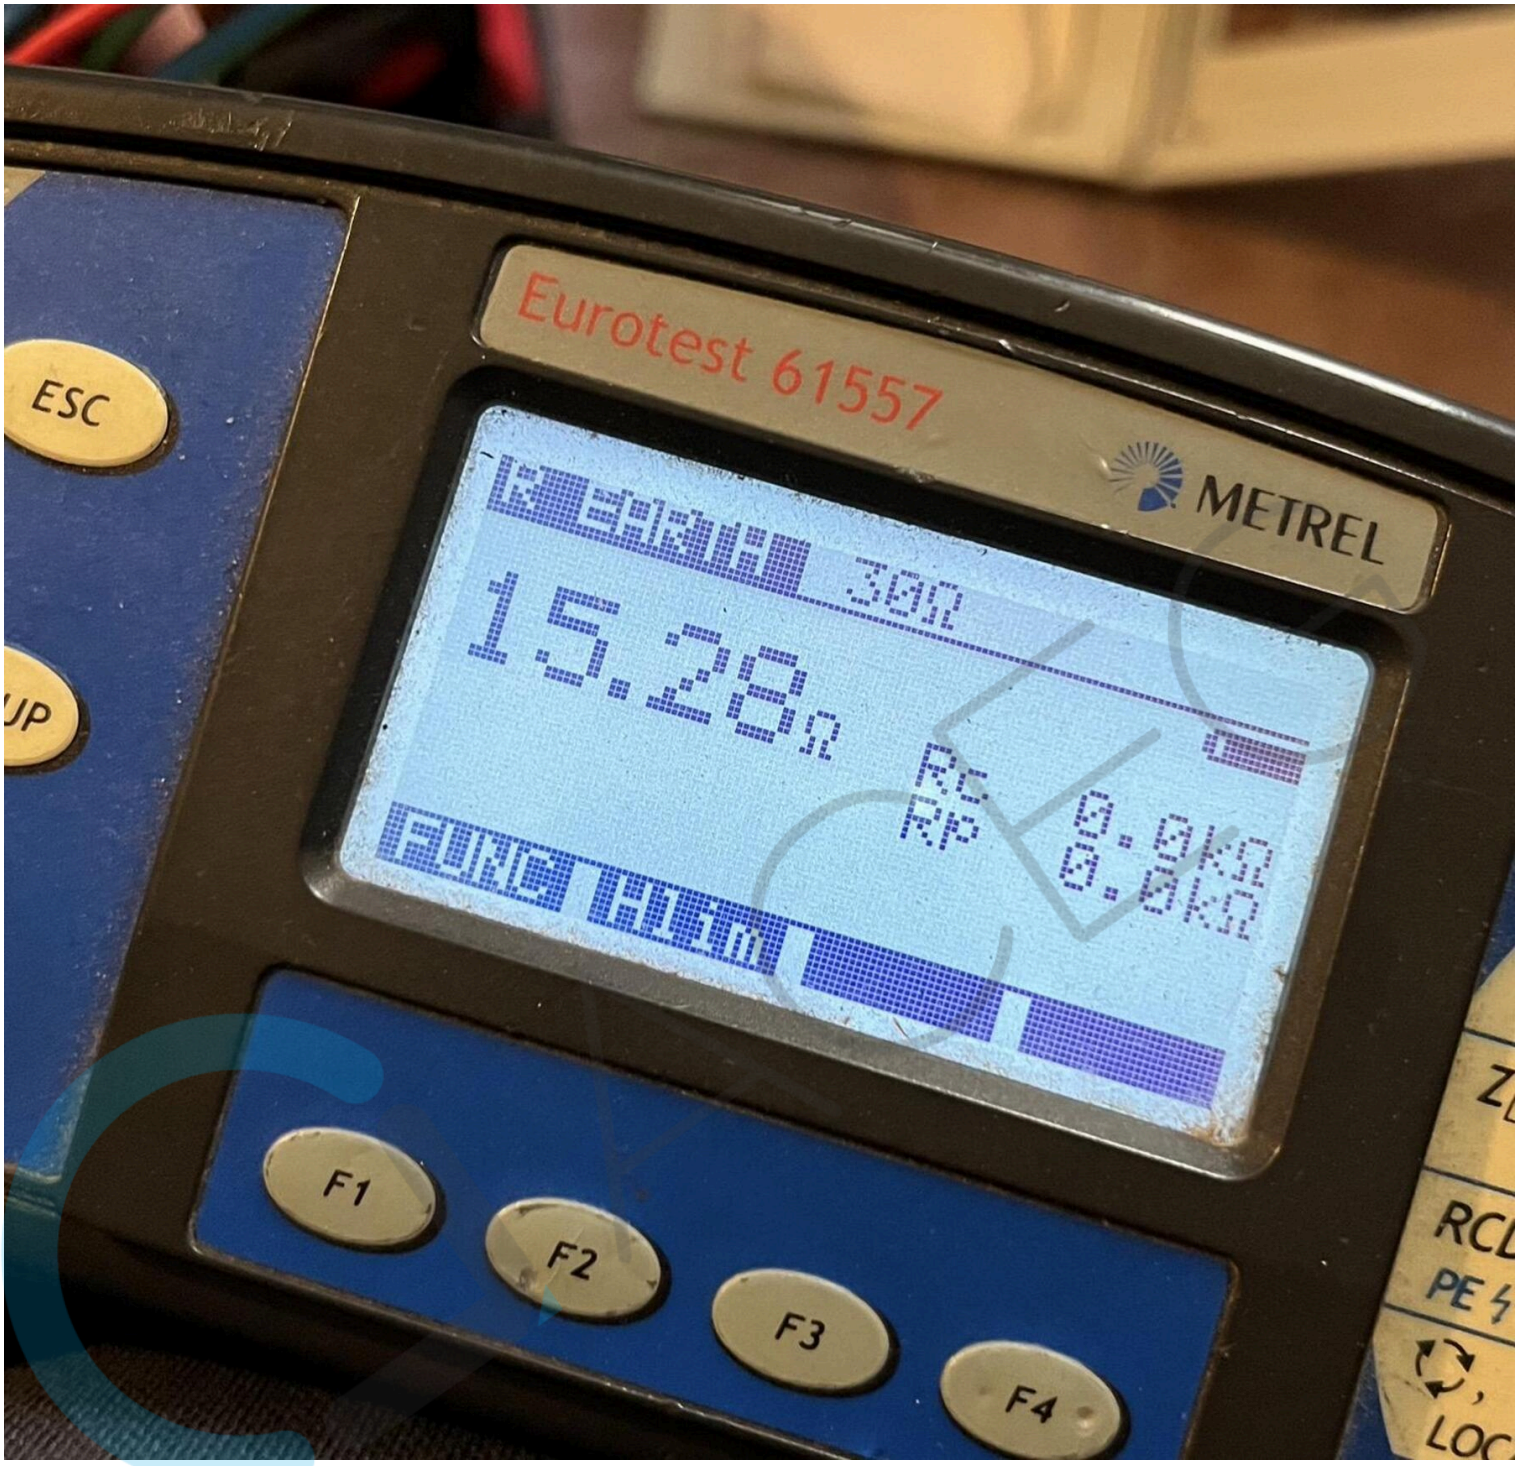

IP40 80A
EN 60439-3
AC 50Hz 415V
hager
MMN 216A
C16
gardy
C20
gardy
C20
theben
Menu
OK

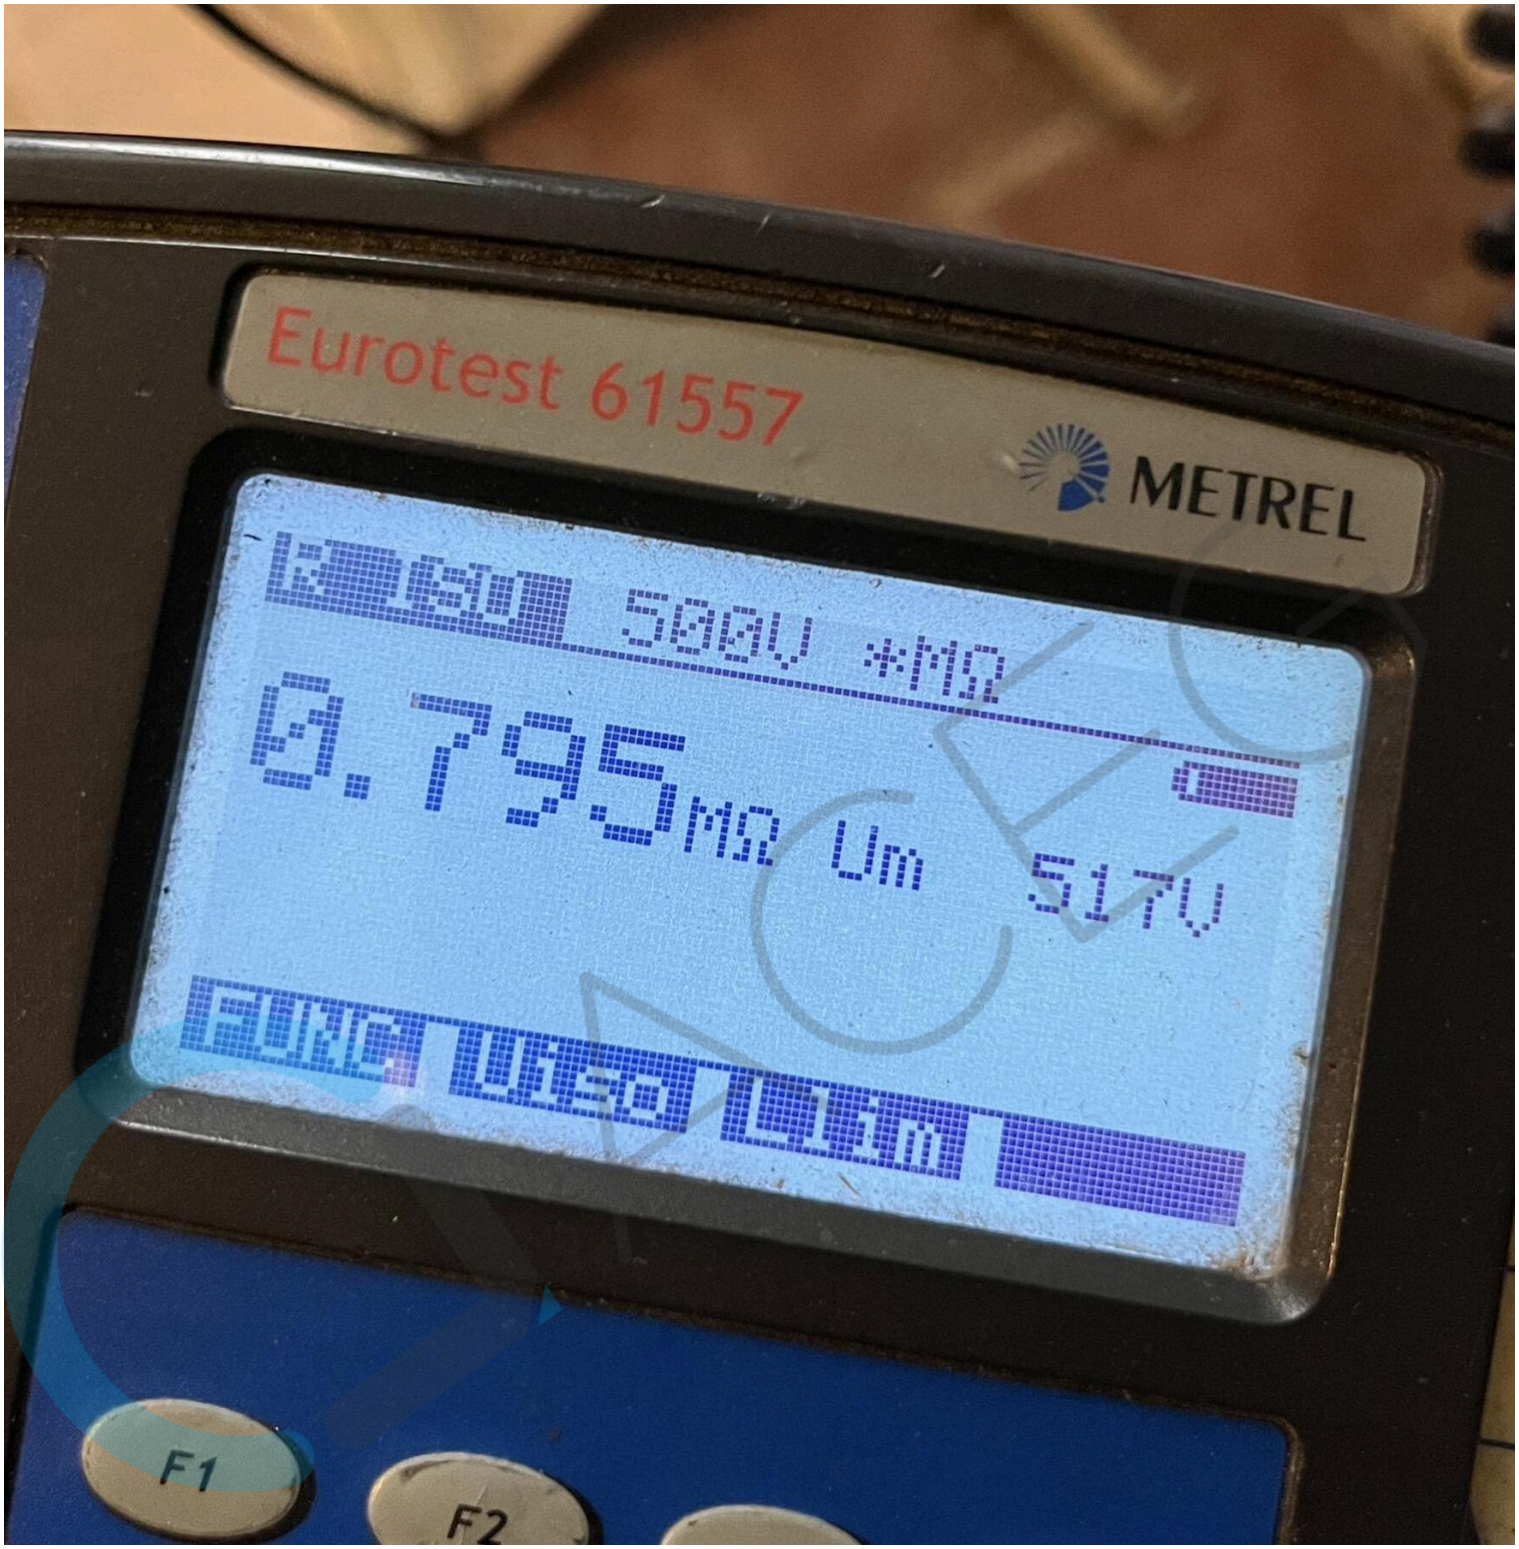

vynckier
IP40-7
FIX-O-RAIL
diff-o-jump
diff-o-jump


968 474 E
fluvius.
www.fluvius.be
Gasgeur 0800 65 0 65
Onderbreking of defect 078 35 35 00
Meer weten over je meter?
SCAN QR-CODE
teco
F40/2


S211
SICONIA
18/180380 ON
CE M 23 0071
1.8.1
003163.647 kWh
kWh
Kvarh
LTE NB1
wM-BUS
dlms
1.8.1
2.8.1
1.8.2
2.8.2
Sagemcom
CS 50001
92848 RUEIL CEDEX
FRANCE
253770234
2023
1SAG1100911255
230V ~ 50Hz
0,25 - 5 (60)A
-25°C / +55°C
IP51
UC3
EAN541 448 820 057 968 474 E


Einstellungen
Betriebsart wählen
Änderung "Mehr"
Änderung "Weniger"
Nächster Wert
Umschaltung Regelkreis
Abfrage Schaltzeiten
Emissionsreminder
Automatik - Betrieb
Notbetrieb
Anzeige Betriebsarten
Tagbetrieb, nur hier AUS
Tagbetrieb, Raum normal
Sparbetrieb
Urlaub
AUS
Nur Warmwasser


Eurotest 61557
METREL
ESC
15.28Ω
RE
RP
0.0kΩ
0.0kΩ
F1
F2
F3
F4


Eurotest 61557
METREL
500V
0.795MΩ
Um
517V
F1
F2
