Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. .
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@marisgroup.eu

OCB
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS03
Verslagnr.: 4720854-041
Voorl. verslagnr.:
Datum: 14/09/2016

Klant / Opdrachtgever:

Afdeling: ELE

DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie::** nieuwe **Type lokalen:** Appartement AW.D.006
Plaats onderzoek: HVG fase 2 AW Busweg 16 bus 03 GENK 3600
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling **Volgens AREI Art.:** 86/270
Datum onderzoek: 25/08/2016 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/08/2041 **Onderzoeker:**
Eigendom van: -Hof van Gan 2
Installateur: - MARIS TECHNICS
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XGB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 16 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 35 mm²
Aardelektrode: **type:** lus **sectie:** 35 mm² **spreidingswaarde:** 7,06 Ohm
Diff. schak.: **algemene:** 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
Werking testknop: nvt **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** > 50 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ■ **keuken** ■ **badkamer** ■ **C.V.** ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ■ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 14

VASTSTELLINGEN

- Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen inbreuken.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI.
De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker


controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

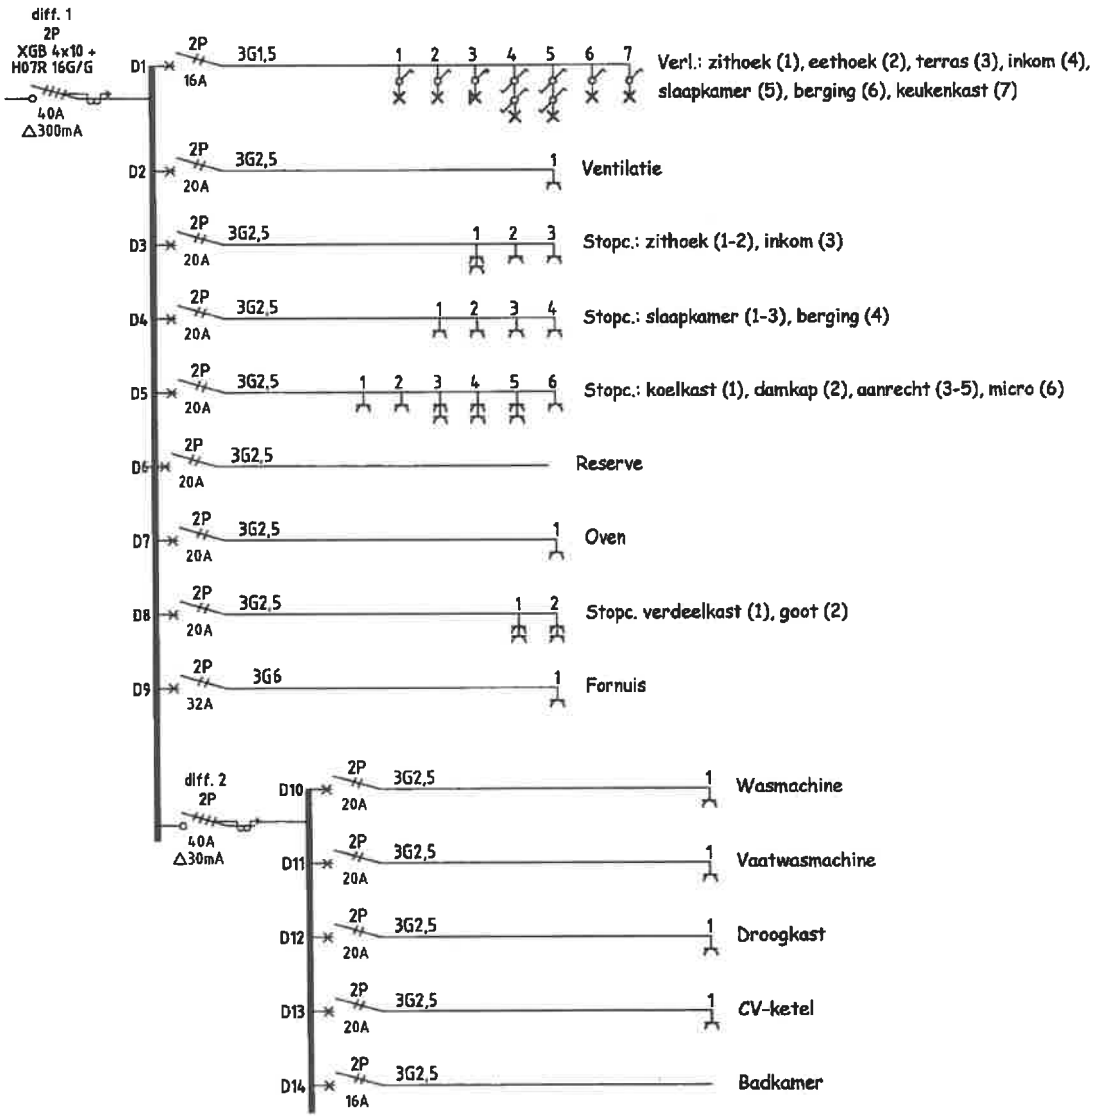

					Nr. folio : 1 / 2
					FrK
				Getekend door :	
Nr van project :	20151098				
Nr. Plan :					
Datum:	26/09/2016				

Hof Van Gan 2
Eendraadschema AW D0.06

MARIS
we've got the power !
